

# TORRE CATHARINA · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Setembro/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: Prevision · R\$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL

R\$ 184,0 mi

orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE

R\$ 47,5 mi

25,8% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027

R\$ 68,3 mi

realizado + previsto

SALDO A REALIZAR

R\$ 136,5 mi

após a data de corte

CONFERÊNCIA


✓ Tudo OK

detalhes abaixo


| REALIZADO (ATUAL) |                    |                    |         |             | COMPOSIÇÃO DO ANO |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|-------------------|--------------------|
| Outubro/2026      |                    |                    |         |             |                   |                    |
| Ano               | Anual R\$          | Acumulado R\$      | Anual % | Acumulado % | Realizado R\$     | A realizar R\$     |
| 2024              | R\$ 3.987.357,38   | R\$ 3.987.357,38   | 2,17%   | 2,17%       | R\$ 3.987.357,38  | -                  |
| 2025              | R\$ 21.526.348,38  | R\$ 25.513.705,76  | 11,70%  | 13,87%      | R\$ 21.526.348,38 | -                  |
| 2026              | R\$ 35.494.053,44  | R\$ 61.007.759,20  | 19,29%  | 33,16%      | R\$ 21.958.774,84 | R\$ 13.535.278,60  |
| 2027              | R\$ 68.278.232,51  | R\$ 129.285.991,71 | 37,12%  | 70,28%      | -                 | R\$ 68.278.232,51  |
| 2028              | R\$ 44.454.848,78  | R\$ 173.740.840,49 | 24,17%  | 94,45%      | -                 | R\$ 44.454.848,78  |
| 2029              | R\$ 5.749.382,51   | R\$ 179.490.223,00 | 3,13%   | 97,57%      | -                 | R\$ 5.749.382,51   |
| 2030              | R\$ 4.468.025,39   | R\$ 183.958.248,39 | 2,43%   | 100,00%     | -                 | R\$ 4.468.025,39   |
| TOTAL             | R\$ 183.958.248,39 |                    | 100,00% |             | R\$ 47.472.480,60 | R\$ 136.485.767,79 |

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

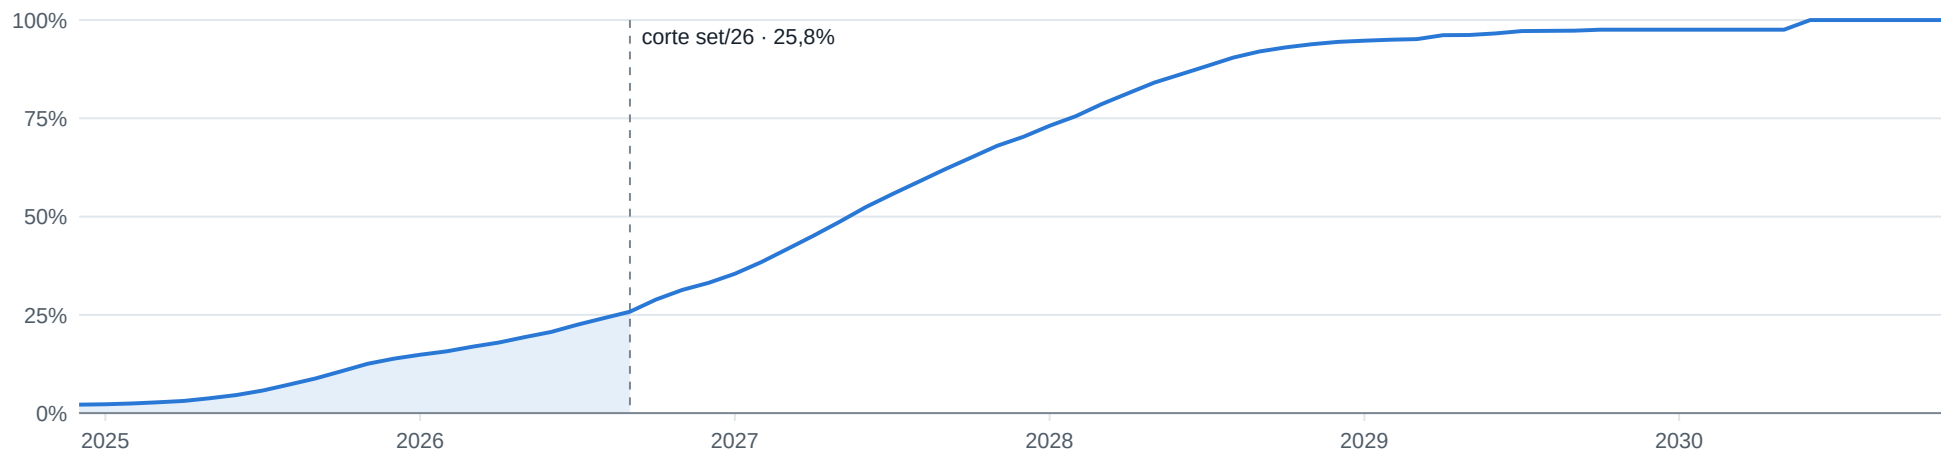

DESEMBOLSO ANUAL (R\$ MILHÕES)

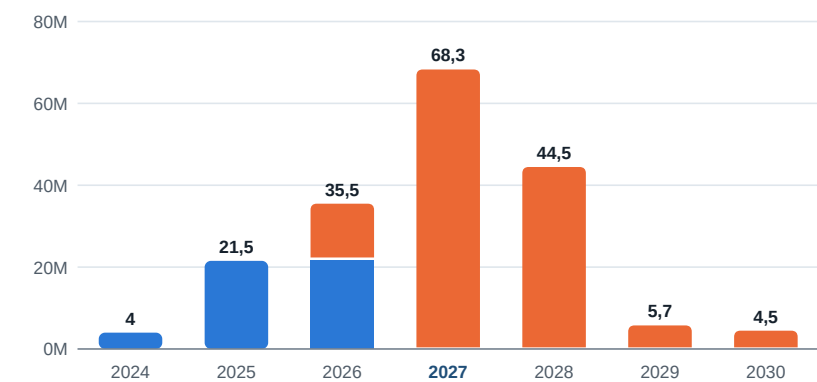

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

| Grupo                                        | R\$               | % do ano | Avanço financeiro |
|----------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Indiretos (01 a 11)                          | R\$ 8.973.264,12  | 13,1%    | 67,0%             |
| Infraestrutura (12 a 16)                     | R\$ 245.422,16    | 0,4%     | 99,9%             |
| Estrutura (17)                               | R\$ 7.268.859,66  | 10,6%    | 99,2%             |
| Vedações, instalações e elevadores (18 a 24) | R\$ 26.743.305,91 | 39,2%    | 78,6%             |
| Acabamentos (25 a 37)                        | R\$ 19.817.538,80 | 29,0%    | 48,0%             |
| Taxa de administração                        | R\$ 5.229.841,86  | 7,7%     |                   |
| TOTAL                                        | R\$ 68.278.232,51 | 100,0%   |                   |

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.

# TORRE CATHARINA · RETRATO DE 2027

Execução física (Prevision), desembolso do ano (fluxo financeiro) e situação da obra em 31/12/2027 · Corte: set/2026 · Cenário: Prevision

|                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DESEMBOLSO NO ANO (R\$ NOMINAL)</div> <div>R\$ 68,3 mi</div> <div>com taxa de administração</div> | <div>DESEMBOLSO NO ANO (INCC)</div> <div>52.532 pts</div> <div>pontos de índice</div> | <div>EM R\$ DO INCC SELECIONADO</div> <div>R\$ 68,3 mi</div> <div>INCC × índice do mês escolhido</div> | <div>EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO</div> <div>74,6%</div> <div>itens diretos, ponderado pela projeção</div> <div><div></div></div> | <div>AVANÇO FINANCEIRO</div> <div>73,4%</div> <div>acumulado no fim do ano</div> | <div>MAIOR DESEMBOLSO DO ANO</div> <div>ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</div> <div>R\$ 7.3 mi no ano</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLS EM 2027 — EXECUÇÃO FÍSICA, DESEMBOLSO E SITUAÇÃO EM 31/12/2027

| Cód.    | PL / serviço                                            | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | PROJETOS                                                | —                             |                    | R\$ 4.131                 | 3                  | R\$ 4.131                  | 0,0%     | 99,9%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02      | SEGUROS                                                 | —                             |                    | R\$ 27.946                | 22                 | R\$ 27.946                 | 0,0%     | 83,2%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 03      | TAXAS DIVERSAS                                          | —                             |                    | R\$ 3.115                 | 2                  | R\$ 3.115                  | 0,0%     | 7,3%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 04      | BARRACAO DE OBRA                                        | —                             |                    | R\$ 122.474               | 94                 | R\$ 122.474                | 0,2%     | 97,5%                | Concluído (todas as 18 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05      | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA, TELEFONIA, ESGOTO   | —                             |                    | R\$ 16.961                | 13                 | R\$ 16.961                 | 0,0%     | 80,3%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 06      | CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.                          | —                             |                    | R\$ 212.485               | 163                | R\$ 212.485                | 0,3%     | 63,8%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 07      | DIVERSOS                                                | —                             |                    | R\$ 65.670                | 51                 | R\$ 65.670                 | 0,1%     | 68,8%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08      | TRANSPORTES                                             | —                             |                    | R\$ 375.810               | 289                | R\$ 375.810                | 0,6%     | 65,2%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 09      | CONSULTORIAS (OBRAS)                                    | —                             |                    | R\$ 214.762               | 165                | R\$ 214.762                | 0,3%     | 70,4%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10      | MÃO DE OBRA PRÓPRIA                                     | —                             |                    | R\$ 5.789.842             | 4.455              | R\$ 5.789.842              | 8,5%     | 61,3%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11      | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                              | —                             |                    | R\$ 2.140.068             | 1.647              | R\$ 2.140.068              | 3,1%     | 63,2%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 01 a 11 | INDIRETOS                                               | —                             |                    | R\$ 8.973.264             | 6.904              | R\$ 8.973.264              | 13,1%    | 67,0%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12      | SERVIÇOS INICIAIS                                       | 100,0%                        | 100,0%             | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | 0,0%     | 100,0%               | Concluído (todas as 4 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13      | CONTENÇÃO                                               | 100,0%                        | 100,0%             | R\$ 29.293                | 23                 | R\$ 29.293                 | 0,0%     | 99,9%                | Concluído (todas as 257 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14      | TERRAPLENAGEM                                           | 100,0%                        | 100,0%             | R\$ 3.625                 | 3                  | R\$ 3.625                  | 0,0%     | 100,0%               | Concluído (todas as 4 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15      | FUNDAÇÃO PROFUNDA                                       | 100,0%                        | 100,0%             | R\$ 12.016                | 9                  | R\$ 12.016                 | 0,0%     | 100,0%               | Concluído (todas as 178 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16      | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL                                    | 100,0%                        | 98,9%              | R\$ 200.489               | 154                | R\$ 200.489                | 0,3%     | 99,7%                | Concluído (todas as 133 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 a 16 | SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES | 100,0%                        | 99,8%              | R\$ 245.422               | 189                | R\$ 245.422                | 0,4%     | 99,9%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17      | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO                            | 100,0%                        | 53,4%              | R\$ 7.268.860             | 5.593              | R\$ 7.268.860              | 10,6%    | 99,2%                | Concluído (todas as 1192 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18      | ALVENARIA                                               | 97,0%                         | 6,3%               | R\$ 4.709.912             | 3.624              | R\$ 4.709.912              | 6,9%     | 96,8%                | Alvenaria: concluído / Encunhamento: concluído / Montantes do drywall: até 29º pav. (restam serviços no 2º pav.) / Drywall 1ª face: concluído / Drywall 2ª face: concluído / Drywall: até 3º pav. (restam serviços no 2º pav.)                                                                                         |
| 19      | IMPERMEABILIZAÇÃO                                       | 80,0%                         | 0,0%               | R\$ 2.509.241             | 1.931              | R\$ 2.509.241              | 3,7%     | 80,0%                | Impermeabilização: até 29º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                   | 66,5%                         | 0,0%               | R\$ 6.901.804             | 5.310              | R\$ 6.901.804              | 10,1%    | 68,2%                | Inst. elétricas: até 3º pav. (restam serviços no 1º pav.) / Prumada elétrica (infra): até 29º pav. / Inst. embutidas na alvenaria: concluído / Distribuição elétrica / quadro: concluído / Acabamentos elétricos: até 2º pav. (restam serviços no 3º subsolo) / Fiação elétrica e iluminação: até 26º pav., executando |

| Cód. | PL / serviço                      | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                   |                               |                    |                           |                    |                            |          |                      | 27º pav. / Prumada elétrica (cabos): até 26º pav., executando 27º pav. / Fiação elétrica: até 2º pav. (restam serviços no 5º subsolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21   | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS       | 91,3%                         | 0,4%               | R\$ 6.447.903             | 4.961              | R\$ 6.447.903              | 9,4%     | 91,7%                | Inst. hidráulicas: até 1º subsolo, executando 1º pav. / Prumada hidrossanitária: concluído / Gás piso: concluído / Distribuição hidrossanitária: concluído / Gás parede: concluído / Rede hidrossanitária: concluído                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22   | INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO      | 70,6%                         | 0,0%               | R\$ 495.537               | 381                | R\$ 495.537                | 0,7%     | 71,2%                | Prumada de incêndio: concluído / Inst. incêndio: até 2º pav. (restam serviços no 2º pav.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23   | INSTALAÇÕES ESPECIAIS             | 74,4%                         | 0,0%               | R\$ 2.733.507             | 2.103              | R\$ 2.733.507              | 4,0%     | 74,1%                | Inst. especiais: concluído / Infra de ar condicionado: até 29º pav. (restam serviços no 2º pav.) / Comunicação e alarme: até 1º pav. (restam serviços no 1º subsolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24   | ELEVADORES                        | 45,0%                         | 0,0%               | R\$ 2.945.401             | 2.266              | R\$ 2.945.401              | 4,3%     | 65,2%                | Elevadores social - 01: concluído / Elevadores social - 02: concluído                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25   | ESQUADRIAS                        | 17,9%                         | 0,0%               | R\$ 4.382.232             | 3.372              | R\$ 4.382.232              | 6,4%     | 37,7%                | Contramarco: até 29º pav. (restam serviços no 3º pav.) / Esquadria de alumínio: até 2º pav. (restam serviços no 2º pav.) / Esquadrias de alumínio: até 4º pav., executando 5º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26   | SERRALHERIA                       | 13,5%                         | 0,0%               | R\$ 87.087                | 67                 | R\$ 87.087                 | 0,1%     | 13,5%                | PCF (marco): concluído / PCF (folhas): até 1º subsolo / Pontos de ancoragem inox: concluído / Guarda- corpo: até 2º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27   | MARCNARIA                         | 22,8%                         | 0,0%               | R\$ 453.214               | 349                | R\$ 453.214                | 0,7%     | 22,8%                | Marcenaria: até 1º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28   | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS   | 95,3%                         | 0,2%               | R\$ 1.025.117             | 789                | R\$ 1.025.117              | 1,5%     | 95,2%                | Contrapiso: até 29º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29   | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES | 99,3%                         | 5,8%               | R\$ 2.033.451             | 1.565              | R\$ 2.033.451              | 3,0%     | 99,2%                | Reboco interno: até 29º pav. (restam serviços no 3º pav.) / Taliscamento: concluído                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30   | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO       | 65,9%                         | 0,0%               | R\$ 5.878.295             | 4.523              | R\$ 5.878.295              | 8,6%     | 66,1%                | Revestimentos porcelanato piso: até 28º pav., executando 29º pav. / Revestimento porcelanato parede: até 29º pav. / Bancadas: até 27º pav., executando 28º pav. / Piso vinílico / laminado: em execução (4º pav.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31   | PAVIMENTAÇÃO                      | 100,0%                        | 0,0%               | R\$ 338.263               | 260                | R\$ 338.263                | 0,5%     | 100,0%               | Passeios: concluído / Pintura de demarcação de vagas: até 1º subsolo (restam serviços no 2º subsolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 32   | REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA   | 49,4%                         | 3,0%               | R\$ 2.892.073             | 2.225              | R\$ 2.892.073              | 4,2%     | 46,9%                | Reboco externo (fachada lateral chopp da fábrica): concluído / Reboco externo (fachada fundo chopp da fábrica): concluído / Reboco plano de ação fachada concordia: concluído / Plano de ação reboco fachada acácia: concluído / Plano de ação reboco fachada olympus: concluído / Textura: até 1º subsolo / Reboco de fachada - fase 1: 18 de 20 concluídas / Pintura espala fechada - fase 1: 3 de 4 concluídas / Reboco de fachada - fase 2: 6 de 20 concluídas / Pintura espala fechada - fase 2: 2 de 4 concluídas / Granito fachada: 1 de 4 concluídas / Pintura/textura da fachada: em execução / Reboco externo: em execução |
| 33   | FORRO                             | 70,3%                         | 0,0%               | R\$ 1.232.248             | 948                | R\$ 1.232.248              | 1,8%     | 70,3%                | Forro: até 25º pav., executando 26º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34   | LOUÇAS SANITÁRIAS                 | 1,3%                          | 0,0%               | R\$ 382.160               | 294                | R\$ 382.160                | 0,6%     | 18,1%                | Louças: até 2º subsolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Cód.                                          | PL / serviço          | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano                      | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35                                            | PINTURA               | <div><div></div></div> 44,4%  | 11,0%              | R\$ 924.469               | 711                | R\$ 924.469                | <div><div></div></div> 1,4%   | 35,4%                | Pintura: até 1º subsolo (restam serviços no 4º subsolo) / Massa corrida: até 24º pav., executando 25º pav. / Pintura 1ª demão: até 23º pav., executando 24º pav. / Pintura 2ª demão: até 2º pav. / Pintura 3ª demão: até 2º pav. |
| 36                                            | PAISAGISMO            | <div><div></div></div> 7,5%   | 0,0%               | R\$ 72.494                | 56                 | R\$ 72.494                 | <div><div></div></div> 0,1%   | 7,5%                 | Paisagismo: em execução (3º pav.)                                                                                                                                                                                                |
| 37                                            | LIMPEZA FINAL DE OBRA | <div><div></div></div> 12,2%  | 0,0%               | R\$ 116.437               | 90                 | R\$ 116.437                | <div><div></div></div> 0,2%   | 12,2%                | Limpeza fina: até 2º pav. / Limpeza grossa: até 2º pav. (restam serviços no 4º subsolo)                                                                                                                                          |
| DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração) |                       |                               |                    | R\$ 63.048.391            | 48.508             | R\$ 63.048.391             | <div><div></div></div> 92,3%  |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38                                            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | —                             |                    | R\$ 5.229.842             | 4.024              | R\$ 5.229.842              | <div><div></div></div> 7,7%   |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   |                       |                               |                    | R\$ 68.278.233            | 52.532             | R\$ 68.278.233             | <div><div></div></div> 100,0% |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |

Execução física = % "Previsto" acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision em dezembro; no corte = % "Realizado". Situação em 31/12 = atividades do cronograma de atividades concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.

# Torre Catharina · Gantt do cronograma

4.059 atividades do Prevision (situação em 28/09/26) · PL → pacote de trabalho → pavimento/tarefa · clique na seta para abrir



| PL / pacote / pavimento                        | Início   | Término  | Real. | 2025        |             |             | 2026        |             |     | 2027 |     |     |     | 2028 |     |     |     | 2029 |     |     |
|------------------------------------------------|----------|----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|                                                |          |          |       | abr         | jul         | out         | jan         | abr         | jul | out  | jan | abr | jul | out  | jan | abr | jul |      | out | jan |
| ▶ PRIMEIRA PRAÇA DE TRABALHO - TUBUL... ⓘ      | 15/04/25 | 11/06/25 | 100%  | <div></div> |             |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ FUNDAÇÕES PROFUNDAS - GERAL                  | 24/04/25 | 12/09/25 | 100%  | <div></div> |             |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ FUNDAÇÕES ACESSO FRONTAL                     | 28/04/25 | 09/05/25 | 100%  | <div></div> |             |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ FUNDAÇÕES PRIMEIRA PRAÇA DE TRABALHO         | 12/05/25 | 21/05/25 | 100%  | <div></div> |             |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ FUNDAÇÕES SEGUNDA PRAÇA DE TRABALHO          | 27/05/25 | 02/07/25 | 100%  | <div></div> |             |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ FUNDAÇÕES CHOPP DA FÁBRICA                   | 09/06/25 | 17/06/25 | 100%  | <div></div> |             |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ FUNDAÇÕES 1125 PRÉDIO                        | 18/07/25 | 05/09/25 | 100%  |             | <div></div> |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ÚLTIMA FASE DE FUNDAÇÕES - PRÉDIO            | 21/08/25 | 12/09/25 | 100%  |             | <div></div> |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▼ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL                         | 12/05/25 | 03/08/26 | 100%  | <div></div> |             |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ BLOCOS E CINTAS - PERIFERIA ALAMEDA          | 12/05/25 | 02/09/25 | 100%  | <div></div> |             |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ BLOCOS E CINTAS - MEDIÇÃO                    | 16/05/25 | 12/05/26 | 100%  | <div></div> |             |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ BLOCOS E CINTAS - TORRE                      | 30/07/25 | 14/11/25 | 100%  |             | <div></div> |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ BLOCOS E CINTAS - LOOKAHEAD                  | 11/03/26 | 03/08/26 | 100%  |             |             |             |             | <div></div> |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▼ SERVIÇOS INICIAIS                            | 12/05/25 | 30/05/25 | 100%  | <div></div> |             |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ SERVIÇOS INICIAIS - ADEQUAÇÃO PARA INÍCI...  | 12/05/25 | 30/05/25 | 100%  | <div></div> |             |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▼ ESTRUTURA EM CONCRETO ARMA... ⓘ 16 inferidos | 04/06/25 | 13/07/27 | 79%   | <div></div> |             |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA - AFASTAMENTO FRONTAL - MED...     | 04/06/25 | 14/07/25 | 100%  | <div></div> |             |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA - PROJEÇÃO ALAMEDA - MEDIÇÃO       | 04/08/25 | 19/10/26 | 84%   |             | <div></div> |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA - PROJEÇÃO ALAMEDA (2º ETAP...     | 17/09/25 | 13/11/25 | 100%  |             | <div></div> |             |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA - PROJEÇÃO CONCORDIA - MEDI...     | 21/10/25 | 30/09/26 | 93%   |             |             | <div></div> |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA TORRE - MEDIÇÃO                    | 10/11/25 | 13/07/27 | 52%   |             |             |             | <div></div> |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA ALAMEDA - LOOKAHEAD                | 19/11/25 | 09/10/26 | 69%   |             |             |             | <div></div> |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA - PROJEÇÃO OLYMPUS - MEDIÇÃO       | 24/11/25 | 11/12/26 | 77%   |             |             |             | <div></div> |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA TORRE - LOOKAHEAD                  | 26/11/25 | 18/09/26 | 100%  |             |             |             | <div></div> |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ OBRA CIVIL CÂMARA ⓘ                          | 10/12/25 | 05/01/26 | 100%  |             |             | <div></div> |             |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA OLYMPUS - LOOKAHEAD                | 05/01/26 | 16/12/26 | 65%   |             |             |             | <div></div> |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA TORRE - ESCADA                     | 07/01/26 | 15/07/26 | 100%  |             |             |             | <div></div> |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA - TRIPINHA - LOOKAHEAD             | 07/01/26 | 01/07/26 | 100%  |             |             |             | <div></div> |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA CONCORDIA - LOOKAHEAD              | 19/01/26 | 19/08/26 | 100%  |             |             |             | <div></div> |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ RESERVATÓRIO - LOOKAHEAD ⓘ                   | 02/02/26 | 02/03/26 | 100%  |             |             |             | <div></div> |             |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |

| PL / pacote / pavimento                       | Início   | Término  | Real. | 2025 |     |     | 2026 |     |     | 2027 |     |     |     | 2028 |     |     |     | 2029 |     |     |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|                                               |          |          |       | abr  | jul | out | jan  | abr | jul | out  | jan | abr | jul | out  | jan | abr | jul |      | out | jan |
| ▶ ESTRUTURA - ESCADA DA TORRE                 | 03/03/26 | 23/06/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA LOOKAHEAD TAMPAS RESERVAT...      | 03/03/26 | 06/03/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA RAMPA 6° AO 5° SUBSOLO            | 30/03/26 | 16/04/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ RAMPA PROJEÇÃO DA TORRE LOOKAHEAD ⓘ         | 10/04/26 | 22/04/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO CONCOR... ⓘ       | 16/04/26 | 01/06/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA PROJEÇÃO RAMPA OLIMPUS            | 20/04/26 | 14/10/26 | 68%   |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA TORRE LOOKAHEAD                   | 04/05/26 | 27/05/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO TORRE L... ⓘ      | 11/05/26 | 03/07/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ VIGA DE FECHAMENTO LATERAL CHOPP ... ⓘ      | 18/05/26 | 22/05/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA - OLIMPUS LOOKAHEAD               | 21/05/26 | 15/06/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA - CONCORDIA LOOKAHEAD             | 25/05/26 | 30/09/26 | 68%   |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ VIGA DE TRAVAMENTO VM1/VM2 LOOKAH... ⓘ      | 28/05/26 | 08/06/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS... ⓘ      | 02/06/26 | 21/08/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ PISO EM CONCRETO E INSTALAÇÕES CHO... ⓘ     | 02/06/26 | 03/07/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA TORRE INTERMEDIÁRIO 3 LOOK...     | 02/06/26 | 10/06/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ VIGAS DA LAJE DE SOLIDARIZAÇÃO DO 1° PA...  | 08/06/26 | 18/06/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS... ⓘ      | 09/06/26 | 15/07/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ LAJE CONTRAPISO - PISO ARMADO ⓘ             | 10/06/26 | 30/09/26 | 95%   |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ TRIPÃO 2° ETAPA ESTRUTURA LOOKAHEAD ⓘ       | 30/06/26 | 15/07/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ RAMPA DE VEÍCULOS - 5° AO 6° SS. (TERR... ⓘ | 14/09/26 | 04/11/26 | 3%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ ESTRUTURA DA RAMPA ALAMEDA LOOKAHEAD        | 13/10/26 | 13/11/26 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ RESERVATÓRIO OLYMPUS INTER 4 LOOKA... ⓘ     | 23/10/26 | 06/11/26 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ LAJE DE COBERTURA DO PILOTIS (CONC... ⓘ     | 17/12/26 | 20/01/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ LAJE COBERTURA PILOTIS (OLYMPUS) ⓘ          | 17/12/26 | 20/01/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▼ TERRAPLENAGEM                               | 07/07/25 | 13/08/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ TERRAPLENAGEM - LIBERAÇÃO DOS TIRANTES      | 07/07/25 | 11/07/25 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ TERRAPLENAGEM GERAL                         | 16/07/25 | 13/08/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ TERRAPLENAGEM - PÓS TIRANTE                 | 12/09/25 | 18/09/25 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ RETIRADA/ESCAVAÇÃO DO TALUDE DA CONT...     | 08/04/26 | 10/04/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▼ PINTURA ⓘ inferido                          | 24/04/26 | 06/12/28 | 9%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |

| PL / pacote / pavimento                     | Início   | Término  | Real. | 2025 |     |     | 2026 |     |     | 2027 |     |     | 2028 |     |     | 2029 |     |     |     |
|---------------------------------------------|----------|----------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|                                             |          |          |       | abr  | jul | out | jan  | abr | jul | out  | jan | abr | jul  | out | jan | abr  | jul | out | jan |
| ▶ TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE           | 24/04/26 | 28/09/27 | 55%   |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ PINTURA                                   | 24/02/27 | 07/11/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ MASSA CORRIDA ⓘ                           | 23/03/27 | 23/08/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ PINTURA 1º DEMÃO                          | 03/05/27 | 01/09/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ PINTURA 2º DEMÃO                          | 09/07/27 | 14/11/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ PINTURA 3º DEMÃO                          | 19/08/27 | 06/12/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▼ ALVENARIA ⓘ 4 inferidos                   | 27/04/26 | 13/12/28 | 6%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ ALVENARIA                                 | 27/04/26 | 25/11/27 | 19%   |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ ALVENARIA FACHADA LATERAL CHOPP DA FÁ...  | 14/08/26 | 11/09/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ ALVENARIA FACHADA FUNDOS CHOPP DA FÁ...   | 04/09/26 | 02/10/26 | 80%   |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ PLANO DE AÇÃO ALVENARIA FACHADA ACÁCIA    | 01/10/26 | 13/11/26 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ ENCUNHAMENTO                              | 09/10/26 | 23/08/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ ALVENARIA PLANO DE AÇÃO FACHADA CONC...   | 22/10/26 | 12/11/26 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ PLANO DE AÇÃO ALVENARIA FACHADA OLYM...   | 26/10/26 | 24/11/26 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ MONTANTES DO DRYWALL ⓘ                    | 15/12/26 | 13/01/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ DRYWALL 1º FACE ⓘ                         | 06/01/27 | 11/11/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ DRYWALL 2º FACE ⓘ                         | 28/01/27 | 13/12/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ DRYWALL ⓘ                                 | 26/02/27 | 20/04/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE MURO             | 01/08/28 | 13/12/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▼ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ⓘ 3 inferidos       | 26/05/26 | 27/11/28 | 4%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS(INFR... | 26/05/26 | 30/10/26 | 92%   |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     | 03/09/26 | 18/09/28 | 5%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ PRUMADA ELÉTRICA (INFRA)                  | 07/10/26 | 24/01/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ INSTALAÇÕES EMBUTIDAS NA ALVENARIA ⓘ      | 20/10/26 | 14/09/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO            | 18/01/27 | 26/11/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ ACABAMENTOS ELÉTRICOS                     | 03/03/27 | 27/11/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ FIAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO              | 30/03/27 | 31/07/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ PRUMADA ELÉTRICA (CABOS)                  | 30/03/27 | 01/08/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ INFRA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS            | 14/04/27 | 20/03/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
| ▶ FIAÇÃO ELÉTRICA                           | 20/05/27 | 26/05/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |

| PL / pacote / pavimento                      | Início   | Término  | Real. | 2025 |     |     | 2026 |     |     | 2027 |          |     | 2028 |     |     |          | 2029 |     |     |  |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|----------|-----|------|-----|-----|----------|------|-----|-----|--|
|                                              |          |          |       | abr  | jul | out | jan  | abr | jul | out  | jan      | abr | jul  | out | jan | abr      | jul  | out | jan |  |
| ▶ GERADOR                                    | 31/08/27 | 14/09/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      | 28/09/26 |     |      |     |     | 31/12/27 |      |     |     |  |
| ▶ OBRA CIVIL SUBESTAÇÃO/TRANSFORMA... ⓘ      | 22/12/27 | 10/04/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ DISJUNTORES / MIOLOS ⓘ                     | 27/01/28 | 24/10/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ ENTRADA DE ENERGIA                         | 04/02/28 | 10/04/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ SUBESTAÇÃO                                 | 11/04/28 | 23/05/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▼ INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (7 inferidos) | 08/06/26 | 24/10/28 | 6%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ INFRA DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS           | 08/06/26 | 20/03/28 | 9%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ INFRA HIDROSSANITÁRIA - CHOPP DA FÁBRICA   | 06/07/26 | 17/07/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ INFRA HIDRÁULICA PAREDES                   | 10/08/26 | 30/10/26 | 87%   |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                    | 12/08/26 | 22/08/28 | 14%   |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ EXECUÇÃO DA ESCADA HIDRÁULICA LAT... ⓘ     | 14/09/26 | 02/10/26 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ DRENAGEM PLUVIAL TALUDES ⓘ                 | 28/09/26 | 01/12/26 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ PRUMADA HIDROSSANITÁRIA                    | 07/10/26 | 22/11/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ GÁS PISO ⓘ                                 | 24/11/26 | 06/10/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA               | 18/01/27 | 30/11/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ GÁS PAREDE ⓘ                               | 18/01/27 | 24/11/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ REDE HIDROSSANITÁRIA                       | 18/01/27 | 24/11/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ GÁS ⓘ                                      | 01/03/27 | 26/11/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ SHAFT INTERNO INST. HIDRÁULICAS ⓘ          | 17/03/27 | 13/12/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ AQUECIMENTO SOLAR ⓘ                        | 04/08/28 | 24/10/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ RESERVATÓRIOS / BOILERS                    | 07/08/28 | 04/09/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▼ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES          | 06/07/26 | 16/03/28 | 2%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ REBOCO INTERNO                             | 06/07/26 | 16/03/28 | 3%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ TALISCAMENTO                               | 20/10/26 | 30/08/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▼ BARRACAO DE OBRA (1 inferido)              | 08/07/26 | 04/09/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ EXECUÇÃO DO CANTEIRO (ENGENHARIA)          | 08/07/26 | 31/08/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ MUDANÇA DO ALMOXARIFADO ⓘ                  | 22/07/26 | 05/08/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ EXECUÇÃO DO CANTEIRO (REFEITÓRIO)          | 06/08/26 | 04/09/26 | 100%  |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▼ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS            | 16/07/26 | 10/04/28 | 2%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |
| ▶ CONTRAPISO                                 | 16/07/26 | 10/04/28 | 2%    |      |     |     |      |     |     |      |          |     |      |     |     |          |      |     |     |  |

| PL / pacote / pavimento                    | Início   | Término  | Real. | 2025 |     |     | 2026 |     |     | 2027 |     |     | 2028 |     |     |     | 2029 |     |     |
|--------------------------------------------|----------|----------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|                                            |          |          |       | abr  | jul | out | jan  | abr | jul | out  | jan | abr | jul  | out | jan | abr |      | jul | out |
| ▼ IMPERMEABILIZAÇÃO                        | 21/08/26 | 14/06/28 | 2%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ IMPERMEABILIZAÇÃO CORTINA 1 E 2 LOOKA... | 21/08/26 | 11/09/26 | 87%   |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO PL...  | 28/09/26 | 14/10/26 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA                  | 26/10/26 | 14/06/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ IMPERMEABILIZAÇÃO                        | 09/02/27 | 08/05/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▼ REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO              | 01/09/26 | 27/11/28 | 1%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO LOOKAH...  | 01/09/26 | 19/10/26 | 39%   |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO           | 20/01/27 | 11/07/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE          | 27/01/27 | 30/06/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ BANCADAS                                 | 17/03/27 | 20/07/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ REVESTIMENTO ACABAMENTO                  | 02/07/27 | 03/08/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ POLIMENTO DE PISO                        | 06/07/27 | 03/02/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ PISO ELEVADO                             | 02/09/27 | 15/09/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ DECK                                     | 05/10/27 | 04/01/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ PISO VINÍLICO / LAMINADO                 | 20/12/27 | 22/09/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ RODAPÉ MADEIRA / PVC                     | 18/01/28 | 13/10/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ PISO EMBORRACHADO                        | 10/11/28 | 27/11/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▼ INSTALAÇÕES ESPECIAIS                    | 02/09/26 | 24/10/28 | 3%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ INSTALAÇÕES ESPECIAIS                    | 02/09/26 | 27/10/27 | 11%   |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ INFRA DE AR CONDICIONADO                 | 18/01/27 | 20/03/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ INFRA DE SISTEMAS - CFTV                 | 14/04/27 | 20/03/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ COMUNICAÇÃO E ALARME                     | 18/06/27 | 24/10/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ PISCINA                                  | 26/01/28 | 29/03/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ EQUIPAMENTOS                             | 13/07/28 | 19/07/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▼ SERRALHERIA <span>1 inferido</span>      | 08/09/26 | 14/09/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ INSTALAÇÃO DE PCF (MARCO)                | 08/09/26 | 17/09/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ INSTALAÇÃO DE PCF (FOLHAS)               | 26/08/27 | 09/08/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ PONTOS DE ANCORAGEM INOX <span>i</span>  | 14/09/27 | 04/10/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ GUARDA- CORPO                            | 04/10/27 | 14/09/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |
| ▶ SERRALHERIA                              | 31/07/28 | 21/08/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |

| PL / pacote / pavimento                                    | Início   | Término  | Real. | 2025 |     |     | 2026 |     |     | 2027 |     |     |     | 2028 |     |     |     | 2029 |     |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|
|                                                            |          |          |       | abr  | jul | out | jan  | abr | jul | out  | jan | abr | jul | out  | jan | abr | jul | out  | jan |
| ▼ SEM PL (gestão / entrega) <span>11 inferidos</span>      | 14/09/26 | 19/01/29 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PLANO DE AÇÃO ENTREGA DO MEZANINO... <span>i</span>      | 14/09/26 | 19/10/26 | 8%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ APARTAMENTO PROTÓTIPO 01 ( 52,54 m² ) ... <span>i</span> | 01/10/26 | 18/01/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ APARTAMENTO PROTÓTIPO 06 ( 54,39 m² ) <span>i</span>     | 01/10/26 | 15/01/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ APARTAMENTO PROTÓTIPO 05 ( 85,07 m² ) <span>i</span>     | 01/10/26 | 18/01/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ CHECKLIST <span>i</span>                                 | 13/08/27 | 10/01/29 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ VISTORIA APTOS <span>i</span>                            | 07/04/28 | 19/01/29 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ENXOVAL <span>i</span>                                     | 09/08/28 | 19/12/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| MANUAL DE USO E OPERAÇÃO <span>i</span>                    | 11/08/28 | 09/10/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| AVCB <span>i</span>                                        | 14/08/28 | 10/10/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| HABITE-SE <span>i</span>                                   | 11/10/28 | 18/12/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ENTREGA SÍNDICO <span>i</span>                             | 05/12/28 | 18/01/29 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▼ REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA                          | 28/09/26 | 03/10/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ REBOCO EXTERNO (FACHADA LATERAL CHO...                   | 28/09/26 | 29/10/26 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ REBOCO EXTERNO (FACHADA FUNDO CHOPP...                   | 05/10/26 | 09/11/26 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ REBOCO PLANO DE AÇÃO FACHADA CONCO...                    | 05/10/26 | 26/10/26 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PLANO DE AÇÃO REBOCO FACHADA ACÁCIA                      | 19/10/26 | 01/12/26 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PLANO DE AÇÃO REBOCO FACHADA OLYMPUS                     | 03/11/26 | 01/12/26 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ TEXTURA                                                  | 17/02/27 | 13/06/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ REBOCO DE FACHADA - FASE 1                               | 05/03/27 | 03/01/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PINTURA ESPALA FECHADA - FASE 1                          | 10/05/27 | 13/01/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ REBOCO DE FACHADA - FASE 2                               | 21/06/27 | 20/07/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PINTURA ESPALA FECHADA - FASE 2                          | 29/07/27 | 26/04/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ GRANITO FACHADA                                          | 25/08/27 | 20/07/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PINTURA/TEXTURA DA FACHADA                               | 13/12/27 | 03/10/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ REBOCO EXTERNO                                           | 14/12/27 | 19/01/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▼ INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO                             | 01/10/26 | 20/03/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PRUMADA DE INCÊNDIO                                      | 01/10/26 | 16/11/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ INSTALAÇÕES INCÊNDIO                                     | 22/10/26 | 20/03/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▼ ESQUADRIAS                                               | 29/10/26 | 06/10/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |

| PL / pacote / pavimento                         | Início   | Término  | Real. | 2025 |     |     | 2026 |     |     | 2027 |     |          |     | 2028 |     |          |     | 2029 |     |
|-------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|----------|-----|------|-----|----------|-----|------|-----|
|                                                 |          |          |       | abr  | jul | out | jan  | abr | jul | out  | jan | abr      | jul | out  | jan | abr      | jul | out  | jan |
| ▶ CONTRAMARCO                                   | 29/10/26 | 12/01/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     | 28/09/26 |     |      |     | 31/12/27 |     |      |     |
| ▶ ESQUADRIA DE ALUMINIO                         | 10/02/27 | 07/08/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO                        | 28/09/27 | 06/10/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ ESQUADRIA MADEIRA                             | 07/01/28 | 03/10/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▼ FORRO                                         | 03/02/27 | 10/08/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ FORRO                                         | 03/02/27 | 10/08/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▼ LOUÇAS SANITÁRIAS <span>1 inferido</span>     | 03/03/27 | 27/11/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ LOUÇAS                                        | 03/03/27 | 24/10/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ METAIS <span>i</span>                         | 09/02/28 | 27/11/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▼ LIMPEZA FINAL DE OBRA                         | 12/03/27 | 18/12/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ LIMPEZA FINA                                  | 12/03/27 | 18/12/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ LIMPEZA GROSSA                                | 18/06/27 | 03/11/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▼ PAVIMENTAÇÃO <span>2 inferidos</span>         | 29/04/27 | 09/11/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ PASSEIOS                                      | 29/04/27 | 22/12/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS <span>i</span> | 18/10/27 | 22/05/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ QUADRA <span>i</span>                         | 04/08/28 | 09/11/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▼ MARCENARIA                                    | 16/07/27 | 23/08/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ MARCENARIA                                    | 16/07/27 | 23/08/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▼ ELEVADORES                                    | 15/09/27 | 17/11/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ ELEVADORES SOCIAL - 01                        | 15/09/27 | 15/10/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ ELEVADORES SOCIAL - 02                        | 15/09/27 | 15/10/27 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ ELEVADOR COMERCIAL - 01                       | 25/05/28 | 26/06/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ ELEVADOR COMERCIAL - 02                       | 25/05/28 | 26/06/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ ELEVADOR DE SERVIÇO                           | 17/10/28 | 17/11/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ ELEVADORES SOCIAL - 03                        | 17/10/28 | 17/11/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▼ PAISAGISMO                                    | 14/12/27 | 23/10/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |
| ▶ PAISAGISMO                                    | 14/12/27 | 23/10/28 | 0%    |      |     |     |      |     |     |      |     |          |     |      |     |          |     |      |     |

# PACOTES NÃO DESCRITOS DE FORMA EXPRESSA NA CURVA DO PREVISION (48)

| PL                           | Pacote                                               | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNDAÇÃO PROFUNDA            | PRIMEIRA PRAÇA DE TRABALHO - TUBULÕES                | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: tubulões). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO; 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 26 – SERRALHERIA.                                         |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | OBRA CIVIL CÂMARA                                    | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: civil, câmara). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL.                           |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | RESERVATÓRIO - LOOKAHEAD                             | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: reservatório). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA.  |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | RAMPA PROJEÇÃO DA TORRE LOOKAHEAD                    | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: rampa, projecao, torre). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 31 – PAVIMENTAÇÃO. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO CONCÓRDIA LOOKAHEAD        | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.           |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO TORRE LOOKAHEAD            | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.           |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | VIGA DE FECHAMENTO LATERAL CHOPP DA FÁBRICA          | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: viga, fechamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO.                                                                    |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | VIGA DE TRAVAMENTO VM1/VM2 LOOKAHEAD                 | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: viga, travamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO.                                                                    |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS 2º ETAPA LOOKAHEAD | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.           |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | PISO EM CONCRETO E INSTALAÇÕES CHOPP DA FÁBRICA      | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.           |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS 1º ETAPA LOOKAHEAD | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.           |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | LAJE CONTRAPISO - PISO ARMADO                        | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: laje, contrapiso, piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 35 – PINTURA.         |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | TRIPÃO 2º ETAPA ESTRUTURA LOOKAHEAD                  | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: tripao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                                           |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | RAMPA DE VEÍCULOS - 5º AO 6º SS. (TERRENO) LOOKAHEAD | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: veículos, terreno). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.                                                           |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | RESERVATÓRIO OLYMPUS INTER 4 LOOKAHEAD               | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: reservatório). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA.  |

| PL                           | Pacote                                                        | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | <b>LAJE DE COBERTURA DO PILOTIS (CONCÓRDIA)</b>               | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: laje). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 35 – PINTURA.            |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | <b>LAJE COBERTURA PILOTIS (OLYMPUS)</b>                       | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: laje). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 35 – PINTURA.            |
| PINTURA                      | <b>MASSA CORRIDA</b>                                          | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURA (termo sem correspondência: massa, corrida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 28 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS.                                                      |
| ALVENARIA                    | <b>MONTANTES DO DRYWALL</b>                                   | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: montantes, drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                                   |
| ALVENARIA                    | <b>DRYWALL 1º FACE</b>                                        | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 35 – PINTURA.                                                 |
| ALVENARIA                    | <b>DRYWALL 2º FACE</b>                                        | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 35 – PINTURA.                                                 |
| ALVENARIA                    | <b>DRYWALL</b>                                                | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 35 – PINTURA.                                                 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | <b>INSTALAÇÕES EMBUTIDAS NA ALVENARIA</b>                     | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: embutidas, alvenaria). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 27 – MARCENARIA; 34 – LOUÇAS SANITÁRIAS.                               |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | <b>OBRA CIVIL SUBESTAÇÃO/TRANSFORMADORES</b>                  | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: civil, transformadores). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL.          |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | <b>DISJUNTORES / MIOLOS</b>                                   | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: disjuntores, miolos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                      |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  | <b>EXECUÇÃO DA ESCADA HIDRÁULICA LATERAL CHOPP DA FÁBRICA</b> | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: escada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 25 – ESQUADRIAS; 26 – SERRALHERIA.            |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  | <b>DRENAGEM PLUVIAL TALUDES</b>                               | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: drenagem, taludes). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  | <b>GÁS PISO</b>                                               | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: gás, piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.              |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  | <b>GÁS PAREDE</b>                                             | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: gás). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.                    |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  | <b>GÁS</b>                                                    | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: gás). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.                    |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  | <b>SHAFT INTERNO INST. HIDRÁULICAS</b>                        | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: shaft). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                              |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  | <b>AQUECIMENTO SOLAR</b>                                      | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: aquecimento, solar). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 25 – ESQUADRIAS.                       |

| PL                        | Pacote                                                | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARRACAO DE OBRA          | MUDANÇA DO ALMOXARIFADO                               | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 04 – BARRACAO DE OBRA (termo sem correspondência: mudança). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                                                     |
| SERRALHERIA               | PONTOS DE ANCORAGEM INOX                              | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 26 – SERRALHERIA (termo sem correspondência: pontos, ancoragem, inox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.                                     |
| SEM PL (gestão / entrega) | PLANO DE AÇÃO ENTREGA DO MEZANINO PARA ESTACIONAMENTO | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                           |
| SEM PL (gestão / entrega) | APARTAMENTO PROTÓTIPO 01 ( 52,54 m² )<br>LOOKAREAD    | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                           |
| SEM PL (gestão / entrega) | APARTAMENTO PROTÓTIPO 06 ( 54,39 m² )                 | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                           |
| SEM PL (gestão / entrega) | APARTAMENTO PROTÓTIPO 05 ( 85,07 m² )                 | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                           |
| SEM PL (gestão / entrega) | CHECKLIST                                             | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                           |
| SEM PL (gestão / entrega) | VISTORIA APTOS                                        | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                           |
| SEM PL (gestão / entrega) | ENXOVAL                                               | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                           |
| SEM PL (gestão / entrega) | MANUAL DE USO E OPERAÇÃO                              | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                           |
| SEM PL (gestão / entrega) | AVCB                                                  | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                           |
| SEM PL (gestão / entrega) | HABITE-SE                                             | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                           |
| SEM PL (gestão / entrega) | ENTREGA SÍNDICO                                       | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                           |
| LOUÇAS SANITÁRIAS         | METAIS                                                | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 34 – LOUÇAS SANITÁRIAS (termo sem correspondência: metais). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                                                     |
| PAVIMENTAÇÃO              | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS                        | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTAÇÃO (termo sem correspondência: pintura, demarcacao, vagas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS. |
| PAVIMENTAÇÃO              | QUADRA                                                | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTAÇÃO (termo sem correspondência: quadra). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.                        |

Fonte: aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (export do Prevision). Datas de início e término e % realizado vêm do Prevision; nos níveis PL e pacote o % é a média dos itens ponderada pela duração. O cronograma é o mesmo nos três cenários (os cenários mudam as curvas financeiras, não as datas das atividades).
