

ED JARDIM · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Agosto/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: Prevision ajustado · R\$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL

R\$ 154,5 mi

orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE

R\$ 42,6 mi

27,6% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027

R\$ 51,8 mi

realizado + previsto

SALDO A REALIZAR

R\$ 111,9 mi

após a data de corte

CONFERÊNCIA


✓ Tudo OK

detalhes abaixo


REALIZADO (ATUAL)					COMPOSIÇÃO DO ANO	
Setembro/2026						
Ano	Anual R\$	Acumulado R\$	Anual %	Acumulado %	Realizado R\$	A realizar R\$
2024	R\$ 5.778.713,93	R\$ 5.778.713,93	3,74%	3,74%	R\$ 5.778.713,93	-
2025	R\$ 18.489.705,84	R\$ 24.268.419,77	11,97%	15,71%	R\$ 18.489.705,84	-
2026	R\$ 34.039.717,25	R\$ 58.308.137,02	22,04%	37,75%	R\$ 18.317.684,91	R\$ 15.722.032,34
2027	R\$ 51.830.359,19	R\$ 110.138.496,21	33,56%	71,31%	-	R\$ 51.830.359,19
2028	R\$ 35.456.676,50	R\$ 145.595.172,71	22,96%	94,26%	-	R\$ 35.456.676,50
2029	R\$ 6.143.234,81	R\$ 151.738.407,52	3,98%	98,24%	-	R\$ 6.143.234,81
2030	R\$ 2.721.144,95	R\$ 154.459.552,47	1,76%	100,00%	-	R\$ 2.721.144,95
TOTAL	R\$ 154.459.552,47		100,00%		R\$ 42.586.104,68	R\$ 111.873.447,79

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

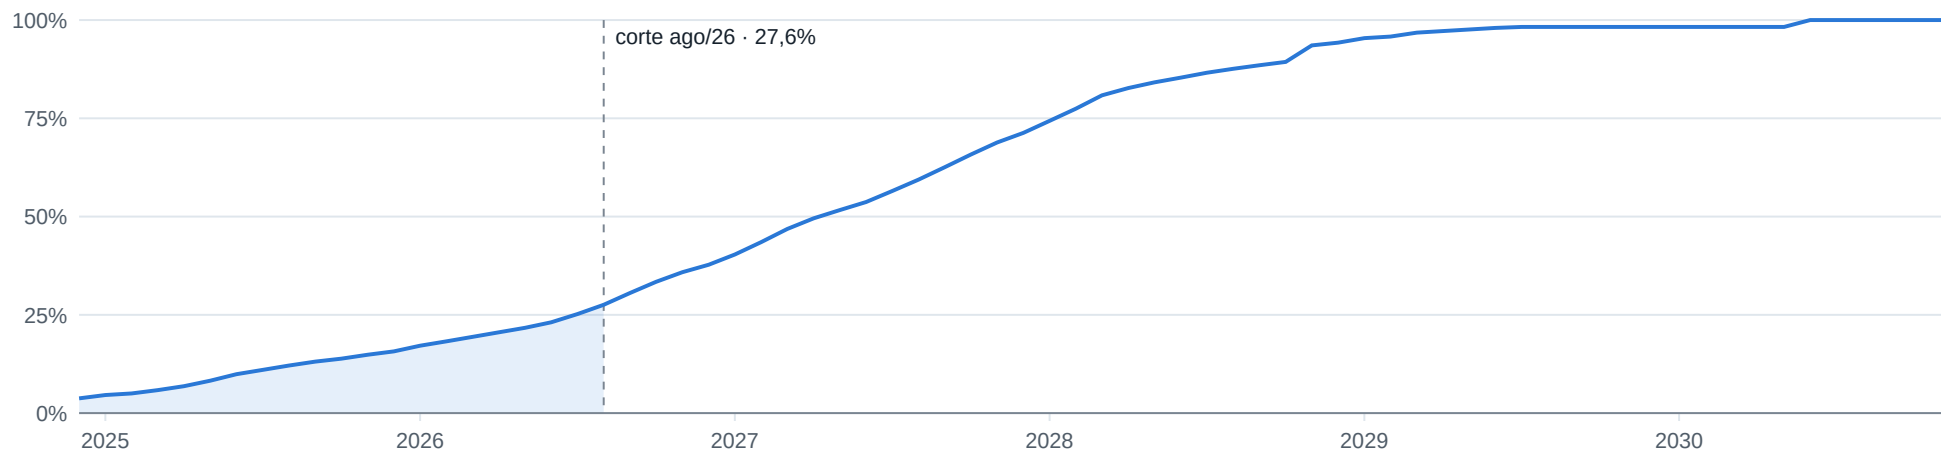

DESEMBOLSO ANUAL (R\$ MILHÕES)

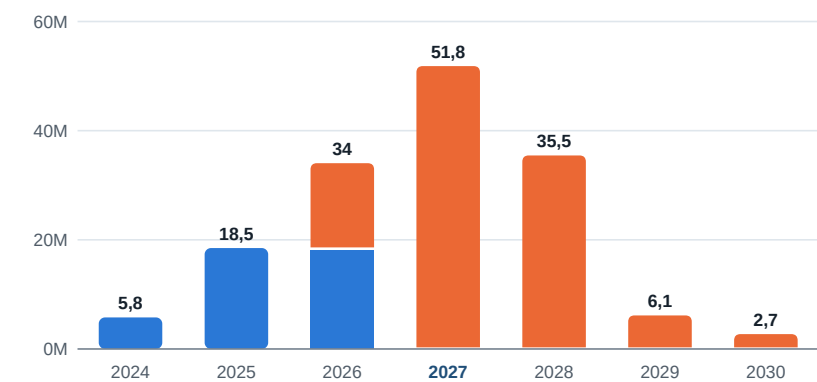

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

Grupo	R\$	% do ano	Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)	R\$ 7.383.357,54	14,2%	83,9%
Infraestrutura (12 a 16)	R\$ 245.339,23	0,5%	99,8%
Estrutura (17)	R\$ 3.899.748,13	7,5%	98,2%
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)	R\$ 14.764.752,18	28,5%	69,7%
Acabamentos (25 a 37)	R\$ 25.537.162,10	49,3%	52,1%
Taxa de administração	R\$ 0,00	0,0%	
TOTAL	R\$ 51.830.359,19	100,0%	

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.

ED JARDIM · RETRATO DE 2027

Execução física (Prevision), desembolso do ano (fluxo financeiro) e situação da obra em 31/12/2027 · Corte: ago/2026 · Cenário: Prevision ajustado

DESEMBOLSO NO ANO (R\$ NOMINAL) R\$ 51,8 mi com taxa de administração	DESEMBOLSO NO ANO (INCC) 39.965 pts pontos de índice	EM R\$ DO INCC SELECIONADO R\$ 51,8 mi INCC × índice do mês escolhido	EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO 73,4% itens diretos, ponderado pela projeção	AVANÇO FINANCEIRO 75,6% acumulado no fim do ano	MAIOR DESEMBOLSO DO ANO REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO R\$ 7.2 mi no ano
--	---	--	--	--	--

PLS EM 2027 — EXECUÇÃO FÍSICA, DESEMBOLSO E SITUAÇÃO EM 31/12/2027

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R\$ nominal	Desembolso INCC	R\$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
01	PROJETOS	—		R\$ 282.888	218	R\$ 282.888	0,5%	98,6%	
02	SEGUROS	—		R\$ 8.358	6	R\$ 8.358	0,0%	92,0%	
03	TAXAS DIVERSAS	—		R\$ 106.330	82	R\$ 106.330	0,2%	97,3%	
04	BARRACAO DE OBRA	—		R\$ 115.032	89	R\$ 115.032	0,2%	96,8%	
05	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA, TELEFONIA, ESGOTO	—		R\$ 10.837	8	R\$ 10.837	0,0%	78,4%	
06	CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.	—		R\$ 172.088	133	R\$ 172.088	0,3%	91,9%	
07	DIVERSOS	—		R\$ 37.563	29	R\$ 37.563	0,1%	87,1%	
08	TRANSPORTES	—		R\$ 455.539	351	R\$ 455.539	0,9%	88,1%	
09	CONSULTORIAS (OBRAS)	—		R\$ 327.390	252	R\$ 327.390	0,6%	85,0%	
10	MÃO DE OBRA PRÓPRIA	—		R\$ 4.771.050	3.679	R\$ 4.771.050	9,2%	81,2%	
11	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	—		R\$ 1.096.281	845	R\$ 1.096.281	2,1%	79,6%	
01 a 11	INDIRETOS	—		R\$ 7.383.358	5.693	R\$ 7.383.358	14,2%	83,9%	
12	SERVIÇOS INICIAIS	100,0%	90,0%	R\$ 24.317	19	R\$ 24.317	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 2 atividades)
13	CONTENÇÃO	100,0%	100,0%	R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 14 atividades)
14	TERRAPLENAGEM	100,0%	89,0%	R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 6 atividades)
15	FUNDAÇÃO PROFUNDA	100,0%	100,0%	R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 12 atividades)
16	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	100,0%	88,2%	R\$ 221.023	170	R\$ 221.023	0,4%	99,4%	Concluído (todas as 81 atividades)
12 a 16	SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES	100,0%	94,0%	R\$ 245.339	189	R\$ 245.339	0,5%	99,8%	
17	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	100,0%	67,0%	R\$ 3.899.748	3.007	R\$ 3.899.748	7,5%	98,2%	Concluído (todas as 466 atividades)
18	ALVENARIA	95,7%	31,0%	R\$ 1.483.768	1.144	R\$ 1.483.768	2,9%	94,5%	Alvenaria: até 27º pav. / Alvenaria externa: concluído / Encunhamento: concluído / Tratamento acústico: até 24º pav.
19	IMPERMEABILIZAÇÃO	93,9%	0,0%	R\$ 2.599.161	2.004	R\$ 2.599.161	5,0%	91,1%	Impermeabilização: concluído / Impermeabilização interna: até 24º pav., executando 25º pav. / Impermeabilização varanda e jardineiras: até 24º pav. / Dreno + aterro jardineiras: até 23º pav., executando 24º pav.
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57,4%	8,0%	R\$ 3.785.433	2.919	R\$ 3.785.433	7,3%	57,6%	Infraestrutura enterrada - 1º quadrante: concluído / Infraestrutura elétrica - teto: concluído / Infraestrutura elétrica - paredes: até 23º pav. / Distribuição elétrica / quadro - setor b: concluído / Prumada elétrica infra: concluído / Fiação elétrica: até 20º pav.

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R\$ nominal	Desembolso INCC	R\$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
									(restam serviços no 15º pav.) / Disjuntores / miolos: até 11º pav. (restam serviços no 5º pav.) / Acabamentos elétricos: até 7º pav.
21	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	57,4%	0,0%	R\$ 2.282.980	1.760	R\$ 2.282.980	4,4%	57,7%	Prumada hidrossanitária: concluído / Distribuição hidrossanitária: concluído / Gás: concluído / Shaft interno inst. hidráulicas: até 25º pav., executando 26º pav.
22	INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	76,8%	0,0%	R\$ 426.199	329	R\$ 426.199	0,8%	75,5%	Prumada de incêndio: concluído / Acabamentos incêndio: até 7º pav.
23	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	85,8%	0,0%	R\$ 3.444.268	2.656	R\$ 3.444.268	6,6%	62,6%	Infraestrutura - ar condicionado: até 22º pav., executando 23º pav. / Ventilação / exaustão: até 20º pav. / Cftv: até 11º pav. (restam serviços no 5º pav.)
24	ELEVADORES	97,1%	0,0%	R\$ 742.944	573	R\$ 742.944	1,4%	92,4%	Preparação poço elevador: concluído / Elevador 1: concluído / Elevador 2: concluído / Elevador 3: em execução
25	ESQUADRIAS	57,6%	0,0%	R\$ 6.863.727	5.292	R\$ 6.863.727	13,2%	60,5%	Contramarco: concluído / Espala esquadria de aluminio: concluído / Esquadria: até 14º pav., executando 15º pav. / Esquadria madeira: até 11º pav.
26	SERRALHERIA	5,0%	0,0%	R\$ 23.167	18	R\$ 23.167	0,0%	6,0%	Serralheria: até 7º pav.
27	MARCENARIA	36,5%	0,0%	R\$ 661.742	510	R\$ 661.742	1,3%	35,1%	
28	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	88,5%	0,5%	R\$ 948.147	731	R\$ 948.147	1,8%	85,3%	Contrapiso: até 23º pav., executando 24º pav.
29	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	87,9%	15,1%	R\$ 1.510.216	1.164	R\$ 1.510.216	2,9%	86,9%	Reboco interno: até 26º pav., executando 27º pav. / Revestimento de massa: concluído / Taliscamento: concluído
30	REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	38,4%	0,0%	R\$ 7.242.374	5.584	R\$ 7.242.374	14,0%	37,7%	Pavimentos executados em 2027: Pilotis (parcial), 700, 900, 1000, 1200 e 1800 (liberados para finalizar); 1600, 1700, 1900, 2000 e 2500 (em negociação). O restante a partir de 2028.
31	ESTRUTURA METÁLICA	0,0%	0,0%	R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	0,0%	Não iniciado - início previsto em abr/2028
32	REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA	70,9%	0,0%	R\$ 4.669.976	3.601	R\$ 4.669.976	9,0%	70,2%	Fachada posterior - F1 (a): concluído / Fachada jairo - F1 (b): concluído / Fachada frontal - F1 (c): concluído / Fachada baltazar - F1 (d): concluído / Fachada posterior - F2 (a): concluído / Fachada jairo - F2 (b): concluído / Fachada frontal - F2 (c): em execução / Fachada baltazar - F2 (d): concluído / Textura: até 2º pav. (restam serviços no térreo) / Fachada cremalheira: em execução
33	FORRO	41,8%	0,0%	R\$ 888.628	685	R\$ 888.628	1,7%	40,2%	Forro: até 20º pav. (restam serviços no 14º pav.) / Forro de madeira: até 11º pav. (restam serviços no 8º pav.)
34	LOUÇAS SANITÁRIAS	11,6%	0,0%	R\$ 359.409	277	R\$ 359.409	0,7%	29,1%	Louças: até 7º pav. / Metais: até 7º pav. (restam serviços no térreo)
35	PINTURA	53,3%	5,9%	R\$ 1.099.093	847	R\$ 1.099.093	2,1%	51,3%	Massa corrida: até 20º pav. / Pintura 1ª demão: até 20º pav. (restam serviços no 12º pav.) / Pintura 2ª demão: até 7º pav. (restam serviços no 3º pav.) / Pintura 3ª demão: até 7º pav.
36	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	67,8%	11,4%	R\$ 1.199.858	925	R\$ 1.199.858	2,3%	63,6%	Paisagismo: até 10º pav., executando 11º pav.

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R\$ nominal	Desembolso INCC	R\$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
37	LIMPEZA FINAL DE OBRA	9,3%	0,0%	R\$ 70.823	55	R\$ 70.823	0,1%	8,9%	Limpeza grossa: até 7º pav. / Limpeza fina: até 6º pav., executando 7º pav.
DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração)				R\$ 51.830.359	39.965	R\$ 51.830.359	100,0%		
38	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	—		R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%		
DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				R\$ 51.830.359	39.965	R\$ 51.830.359	100,0%		


Execução física = % "Previsto" acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision em dezembro; no corte = % "Realizado". Situação em 31/12 = atividades do cronograma de atividades concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.

Ed Jardim · Curva física por cenário

Avanço físico acumulado dos itens diretos (26 PLs), ponderado pela projeção de cada PL · Corte: ago/26 · Realizado no corte: 23,27%

Curva S

Visão geral > passe o mouse no gráfico para ver o detalhamento do mês

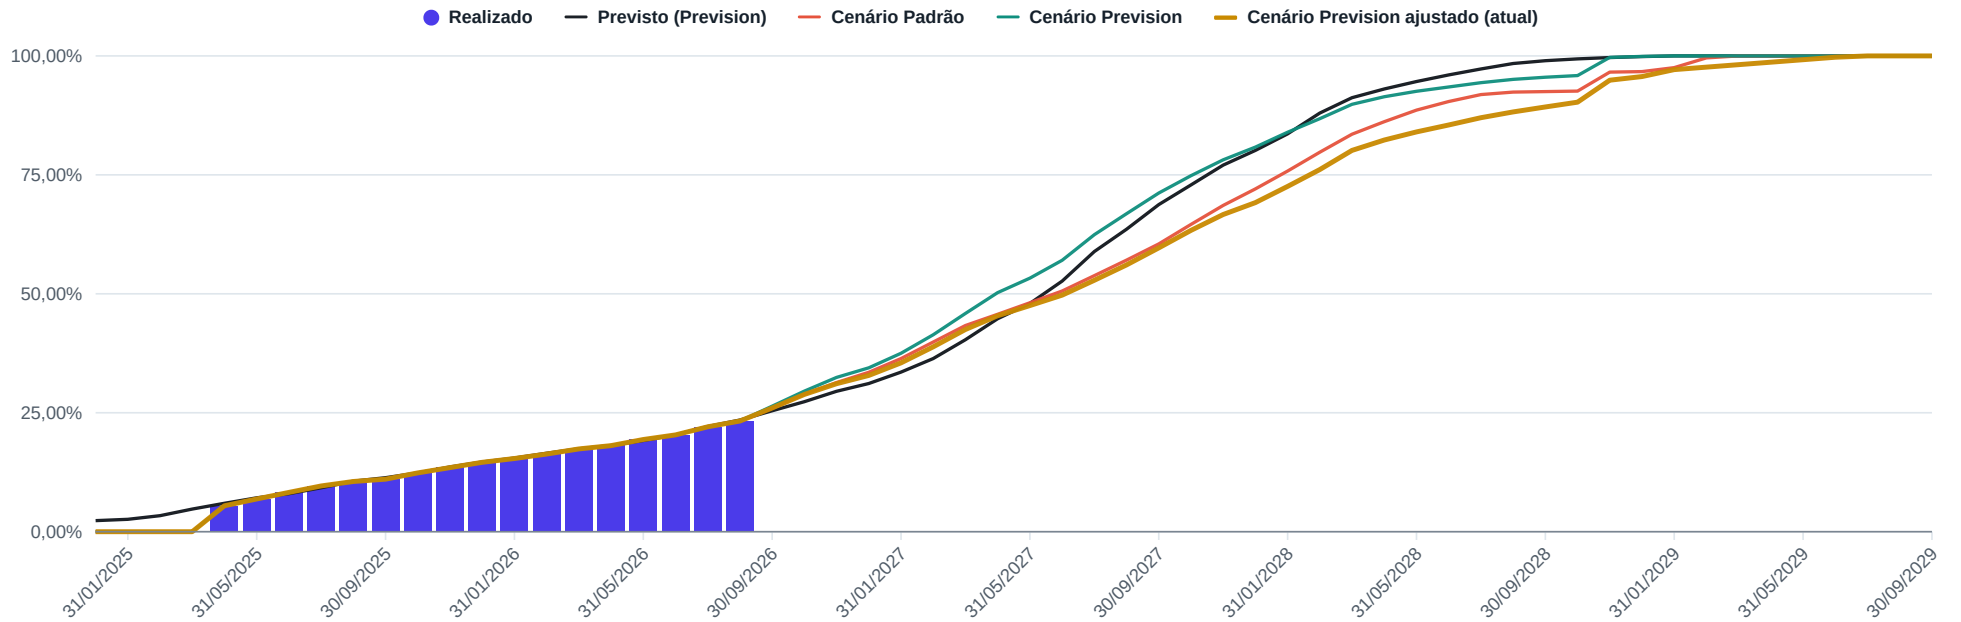

AVANÇO FÍSICO ACUMULADO NO FIM DE CADA ANO

Data	Realizado	Previsto (Prevision)	Padrão	Prevision	Prevision ajustado
31/12/2024	0,0%	2,3%	0,0%	0,0%	0,0%
31/12/2025	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%
31/12/2026	—	31,1%	33,5%	34,4%	32,8%
31/12/2027	—	80,1%	72,1%	80,8%	69,2%
31/12/2028	—	99,9%	96,7%	99,9%	95,7%
31/12/2029	—	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Conclusão (100%)		jan/29	mar/29	jan/29	jul/29

POR PL EM 31/12/2027

PL	No corte	Prevision	Padrão	Prevision	Prevision ajustado
SERVIÇOS INICIAIS	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
CONTENÇÃO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TERRAPLENAGEM	89,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
FUNDAÇÃO PROFUNDA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	88,2%	100,0%	99,7%	100,0%	99,8%
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	67,0%	100,0%	98,5%	99,1%	98,5%
ALVENARIA	31,0%	95,7%	97,2%	96,4%	94,9%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,0%	93,9%	96,1%	94,4%	91,1%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,0%	57,4%	55,9%	59,3%	57,6%
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,0%	100,0%	79,1%	100,0%	53,1%
INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	0,0%	76,8%	89,1%	77,7%	75,5%
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,0%	85,8%	62,5%	85,8%	62,6%
ELEVADORES	0,0%	97,1%	90,0%	91,7%	90,1%
ESQUADRIAS	0,0%	57,6%	60,3%	62,4%	60,4%
SERRALHERIA	0,0%	5,0%	25,7%	5,1%	4,9%
MARCENARIA	0,0%	36,5%	0,0%	36,5%	35,1%
REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	0,5%	88,5%	96,4%	88,5%	85,4%
REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	15,1%	87,9%	90,5%	89,8%	87,7%
REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	0,0%	73,7%	51,3%	73,7%	37,8%
ESTRUTURA METÁLICA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA	0,0%	97,3%	61,2%	97,4%	70,1%
FORRO	0,0%	41,8%	38,4%	41,8%	40,2%
LOUÇAS SANITÁRIAS	0,0%	11,6%	29,1%	30,3%	29,1%
PINTURA	5,9%	53,3%	59,1%	53,9%	52,1%
JARDINEIRAS E PAISAGISMO	11,4%	67,8%	69,3%	66,0%	64,1%
LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,0%	9,3%	16,9%	9,3%	8,9%

Como a curva é montada. **Realizado e Previsto (Prevision):** % acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision (aba CP RESUMO) de cada PL. **Cenários:** até o corte, o realizado; depois, o físico de cada PL avança na mesma proporção do desembolso que falta no cenário (curva financeira da aba da PL). PL sem desembolso futuro segue o previsto do Prevision. A obra é a média das PLs diretas ponderada pela projeção (R\$ 121 mi). O Prevision pondera pelo custo do próprio cronograma, por isso o % dele pode ser um pouco diferente.

Ed Jardim · Gantt do cronograma

2.253 atividades do Prevision (situação em 28/09/26) · PL → pacote de trabalho → pavimento/tarefa · clique na seta para abrir



PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2024	2025				2026				2027				2028				2029
				out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan
▶ ESTRUTURA EMBASAMENTO B	19/05/25	10/10/25	100%																		
▶ ESTRUTURA EMBASAMENTO B - MEDIÇÃO	19/05/25	10/10/25	100%																		
▶ ESTRUTURA TORRE A	01/09/25	15/10/25	100%																		
▶ ESTRUTURA TORRE	15/09/25	06/04/27	67%																		
▶ ESTRUTURA EMBASAMENTO C	07/10/25	19/02/26	100%																		
▶ ESTRUTURA EMBASAMENTO C - MEDIÇÃO	07/10/25	17/02/26	100%																		
▶ ESTRUTURA TORRE A - LOOKAHEAD	03/11/25	28/11/25	100%																		
▶ ESTRUTURA TORRE - GARDEN - LOOKAEHAD	26/11/25	19/12/25	100%																		
▶ VIGA SOLTEIRA ⓘ	05/01/26	23/02/26	100%																		
▶ VIGA INVERTIDA ⓘ	05/01/26	14/01/26	100%																		
▶ VIGAS V31, V403 E V405 - TERRAÇO SALÃO D...	19/03/26	30/04/26	100%																		
▶ PISO ARMADO - SETOR B ⓘ	17/06/26	17/07/26	100%																		
▶ PISO ARMADO - SETOR C ⓘ	20/07/26	14/08/26	100%																		
▶ PISO ARMADO - SETOR A ⓘ	17/08/26	31/08/26	100%																		
EXECUÇÃO DE MURO ⓘ	15/02/27	29/10/27	0%																		
▼ INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS ⓘ 6 inferidos	01/08/25	16/03/28	8%																		
▶ DRENAGEM ⓘ	01/08/25	03/10/25	100%																		
▶ RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE REUSO	02/03/26	31/03/26	100%																		
▶ POÇO ARTESIANO ⓘ	16/03/26	17/07/26	100%																		
▶ PRUMADA HIDROSSANITÁRIA	10/08/26	17/09/27	3%																		
▶ DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA	24/08/26	14/09/27	0%																		
▶ GÁS ⓘ	01/09/26	27/10/27	0%																		
▶ DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - SETOR B	08/09/26	07/10/26	0%																		
▶ SHAFT INTERNO INST. HIDRÁULICAS ⓘ	16/09/26	11/01/28	0%																		
▶ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	25/09/26	16/03/28	0%																		
▶ DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - SETOR C	08/10/26	10/11/26	0%																		
▶ DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - SETOR A	11/11/26	11/12/26	0%																		
▶ RESERVATÓRIO - CAIXA DE DETENÇÃO	23/04/27	26/07/27	0%																		
▶ RESERVATÓRIOS / BOILERS	22/06/27	12/07/27	0%																		
▶ RAMAL DE ENTRADA - COPASA ⓘ	01/07/27	01/10/27	0%																		

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2024	2025				2026				2027				2028				2029
				out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan
LIGAÇÃO COPASA ⓘ	02/07/27	05/11/27	0%										28/09/26				31/12/27				
▼ ALVENARIA ⓘ 5 inferidos	03/11/25	02/03/28	55%																		
▶ ALVENARIA BLOCO CHEIO + ACERTO DE TAL...	03/11/25	28/11/25	100%																		
▶ ESTUQUE - SETOR B ⓘ	10/11/25	17/07/26	100%																		
▶ ALVENARIA - POSTERIOR E LATERAL ESQUER...	03/12/25	19/06/26	100%																		
▶ ALVENARIA FECHAMENTO POSTERIOR C	25/02/26	04/03/26	100%																		
▶ ESTUQUE - SETOR C ⓘ	02/03/26	24/08/26	100%																		
▶ ALVENARIA RAMPA B	05/03/26	16/03/26	100%																		
▶ ALVENARIA FECHAMENTO LATERAL - SETOR C	05/03/26	19/03/26	100%																		
▶ ESTUQUE - SETOR A ⓘ	09/03/26	31/07/26	100%																		
▶ ALVENARIA - SETOR B	16/03/26	04/09/26	99%																		
▶ ALVENARIA CASA MAQUINAS A	17/03/26	27/03/26	100%																		
▶ ALVENARIA ÁREA SOCIAL	20/03/26	31/07/26	100%																		
▶ ALVENARIA	23/03/26	02/03/28	42%																		
▶ ALVENARIA EXTERNA	06/05/26	30/04/27	73%																		
▶ TRATAMENTO DE SHAFTS ⓘ	10/08/26	30/10/26	25%																		
▶ ALVENARIA - SETOR C	08/09/26	07/10/26	60%																		
▶ ALVENARIA - SETOR A	08/10/26	10/11/26	0%																		
▶ ENCUNHAMENTO	08/10/26	27/10/27	0%																		
▶ TRATAMENTO ACÚSTICO ⓘ	10/12/26	26/01/28	0%																		
▼ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ⓘ 4 inferidos	29/01/26	09/01/29	18%																		
▶ ENTRADA DE ENERGIA	29/01/26	05/06/26	100%																		
▶ RAMAL DE ENTRADA - CEMIG	16/02/26	05/06/26	100%																		
▶ INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 1º QUAD... ⓘ	01/04/26	16/06/26	99%																		
▶ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - TETO	01/06/26	14/10/27	15%																		
▶ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS - SET...	01/06/26	29/06/26	100%																		
▶ INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 2º QUAD... ⓘ	17/06/26	10/07/26	100%																		
▶ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS - SET...	30/06/26	21/07/26	100%																		
▶ INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 3º QUAD... ⓘ	06/07/26	30/07/26	100%																		
▶ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - PAREDES	13/07/26	16/03/28	4%																		

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2024	2025				2026				2027				2028				2029
				out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan
▶ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS - SET...	22/07/26	18/08/26	100%									■	28/09/26				31/12/27				
▶ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (TETO) - SETOR B	03/08/26	15/09/26	95%									■									
▶ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO - SETOR B	04/08/26	14/10/27	10%									■									
▶ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24/08/26	16/03/28	40%									■									
▶ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (TETO) - SETOR C	16/09/26	16/10/26	14%									■									
▶ PRUMADA ELÉTRICA INFRA	29/09/26	27/09/27	0%																		
▶ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO - SETOR C	08/10/26	10/11/26	0%									■									
▶ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (TETO) - SETOR A	19/10/26	18/11/26	0%										■								
▶ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO - SETOR A	11/11/26	01/12/26	0%										■								
▶ FIAÇÃO ELÉTRICA	13/01/27	17/04/28	0%																		
CAIXAS DE PASSAGEM	07/04/27	01/07/27	0%																		
▶ DISJUNTORES / MIOLOS ⓘ	02/08/27	18/10/28	0%																		
▶ SPDA	24/09/27	22/10/27	0%														■				
▶ ACABAMENTOS ELÉTRICOS	07/10/27	09/01/29	0%																		
PRUMADA ELÉTRICA CABOS	07/01/28	07/04/28	0%																		
▶ GERADOR	11/01/28	17/01/28	0%																		■
▼ JARDINEIRAS E PAISAGISMO ⓘ 4 inferidos	02/02/26	01/12/28	22%																		
▶ PAISAGISMO	02/02/26	01/12/28	19%																		
▶ CAMINHO DO CLIENTE ⓘ	08/05/26	04/09/26	100%									■									
▶ SISTEMA DE IRRIGAÇÃO ⓘ	04/01/27	22/04/27	0%																		
▶ QUADRA DE TÊNIS E POLIESPORTIVA ⓘ	10/02/27	16/07/27	0%																		
▶ PASSEIO ⓘ	10/02/28	06/03/28	0%																		■
▼ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	02/03/26	30/03/28	29%																		
▶ REBOCO - SETOR B	02/03/26	21/10/26	49%																		
▶ REBOCO - SETOR C	01/04/26	23/11/26	58%																		
▶ REBOCO INTERNO	21/05/26	30/03/28	25%																		
▶ REBOCO - SETOR A	25/05/26	18/12/26	15%																		
▶ REVESTIMENTO DE MASSA	03/08/26	30/09/26	94%																		
▶ TALISCAMENTO	03/08/26	30/09/27	8%																		
▼ LIMPEZA FINAL DE OBRA	16/03/26	06/02/29	0%																		

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2024	2025				2026				2027				2028				2029
				out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan
▶ LIMPEZA DE ETULHO E MADEIRA - SETOR B	16/03/26	20/03/26	100%										28/09/26				31/12/27				
▶ LIMPEZA GROSSA	21/09/27	08/12/28	0%																		
▶ LIMPEZA FINA	19/11/27	06/02/29	0%																		
▶ LIMPEZA FACHADA	20/03/28	23/05/28	0%																		
▼ SEM PL (gestão / entrega) 9 inferidos	04/05/26	13/02/29	6%																		
▶ ÁREA DE VIVÊNCIA ⓘ	04/05/26	15/06/26	100%																		
▶ ÁREA DE VIVÊNCIA + SALAS DE JOGOS ⓘ	06/07/26	14/08/26	93%																		
▶ COMUNICAÇÃO VISUAL ⓘ	22/11/27	07/02/29	0%																		
▶ CHECKLIST ⓘ	03/12/27	13/02/29	0%																		
ENXOVAL ⓘ	07/12/27	24/04/28	0%																		
MANUAL DE USO E OPERAÇÃO ⓘ	05/01/28	03/02/28	0%																		
HABITE-SE ⓘ	07/03/28	24/04/28	0%																		
AVCB ⓘ	17/03/28	24/04/28	0%																		
ENTREGA OBRA / CONDOMÍNIO ⓘ	25/04/28	19/05/28	0%																		
▼ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	17/06/26	13/04/28	12%																		
▶ CONTRAPISO	17/06/26	13/04/28	12%																		
▼ IMPERMEABILIZAÇÃO 1 inferido	13/07/26	02/03/28	7%																		
▶ REGULARIZAÇÃO DE PISO PARA IMPERMEABI...	13/07/26	22/09/26	92%																		
▶ IMPERMEABILIZAÇÃO	24/08/26	23/08/27	16%																		
▶ IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA	26/11/26	24/01/28	0%																		
▶ IMPERMEABILIZAÇÃO VARANDA E JARDINEIR...	11/12/26	07/02/28	0%																		
▶ DRENO + ATERRO JARDINEIRAS ⓘ	07/01/27	02/03/28	0%																		
▼ INSTALAÇÕES ESPECIAIS 4 inferidos	10/08/26	18/10/28	4%																		
▶ PISCINA	10/08/26	29/04/27	32%																		
▶ INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO	21/01/27	20/03/28	0%																		
▶ AR CONDICIONADO	12/02/27	22/10/27	0%																		
▶ VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO ⓘ	17/03/27	31/03/28	0%																		
▶ CFTV ⓘ	02/08/27	18/10/28	0%																		
▶ COMUNICAÇÃO E ALARME	27/09/27	11/01/28	0%																		
▶ EQUIPAMENTOS ⓘ	30/11/27	10/01/28	0%																		

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2024	2025				2026				2027				2028				2029
				out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan
▶ CARREGADOR VEICULAR / PORTA BOX ⓘ	06/12/27	17/03/28	0%										28/09/26				31/12/27				
▼ REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA	15/09/26	17/03/28	0%																		
▶ FACHADA POSTERIOR - F1 (A)	15/09/26	07/12/26	0%																		
▶ FACHADA JAIRO - F1 (B)	30/10/26	12/01/27	0%																		
▶ FACHADA FRONTAL - F1 (C)	10/12/26	11/05/27	0%																		
▶ FACHADA BALTAZAR - F1 (D)	15/12/26	29/01/27	0%																		
▶ FACHADA POSTERIOR - F2 (A)	01/04/27	18/08/27	0%																		
▶ FACHADA JAIRO - F2 (B)	11/06/27	09/09/27	0%																		
▶ FACHADA FRONTAL - F2 (C)	23/07/27	06/01/28	0%																		
▶ FACHADA BALTAZAR - F2 (D)	17/09/27	07/10/27	0%																		
▶ TEXTURA	11/10/27	02/02/28	0%																		
▶ FACHADA CREMALHEIRA	20/10/27	17/03/28	0%																		
▶ REBOCO EXTERNO	05/01/28	01/02/28	0%																		
▼ INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO ⓘ inferido	21/09/26	06/02/29	0%																		
▶ PRUMADA DE INCÊNDIO	21/09/26	17/09/27	0%																		
▶ ACABAMENTOS INCÊNDIO ⓘ	21/06/27	06/02/29	0%																		
▼ ESQUADRIAS ⓘ inferido	23/09/26	19/09/28	0%																		
▶ CONTRAMARCO	23/09/26	27/10/27	0%																		
▶ ESPALA ESQUADRIA DE ALUMINIO ⓘ	22/10/26	18/10/27	0%																		
▶ ESQUADRIA	08/04/27	12/09/28	0%																		
▶ ESQUADRIA MADEIRA	05/07/27	19/09/28	0%																		
▼ REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	11/01/27	09/01/29	0%																		
▶ REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO	11/01/27	24/02/27	0%																		
▶ REVESTIMENTO PAREDE	21/01/27	24/04/28	0%																		
▶ REVESTIMENTOS PISO	17/02/27	02/05/28	0%																		
▶ REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE	25/02/27	29/03/27	0%																		
▶ BANCADAS	03/03/27	24/03/28	0%																		
▶ PISO MADEIRA / LAMINADO	21/06/27	04/09/28	0%																		
▶ RODAPÉ MADEIRA / PVC	19/07/27	03/10/28	0%																		
▶ POLIMENTO PISO	28/07/27	18/10/27	0%																		

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2024	2025				2026				2027				2028				2029
				out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan
▶ DECK	02/08/27	15/09/27	0%										28/09/26				31/12/27				
▶ PISO VINÍLICO / LAMINADO	02/08/27	13/08/27	0%																		
▶ TRATAMENTO DE GRANITO/MÁRMORE	30/08/27	09/01/29	0%																		
▶ PISO ELEVADO / EXTERNO	24/11/27	18/02/28	0%																		
▼ FORRO	30/03/27	09/11/28	0%																		
▶ FORRO	30/03/27	10/05/28	0%																		
▶ FORRO DE MADEIRA	12/07/27	09/11/28	0%																		
▼ ELEVADORES	20/04/27	06/01/28	0%																		
▶ PREPARAÇÃO POÇO ELEVADOR	20/04/27	12/08/27	0%																		
▶ ELEVADOR 1	23/06/27	23/08/27	0%																		
▶ ELEVADOR 2	24/08/27	20/10/27	0%																		
▶ ELEVADOR 3	21/10/27	06/01/28	0%																		
▼ PINTURA 1 inferido	30/04/27	23/01/29	0%																		
▶ MASSA CORRIDA 1	30/04/27	19/05/28	0%																		
▶ PINTURA 1º DEMÃO	14/05/27	31/05/28	0%																		
▶ PINTURA 2º DEMÃO	05/10/27	22/12/28	0%																		
▶ PINTURA 3º DEMÃO	04/11/27	23/01/29	0%																		
▶ PINTURA VAGAS	12/11/27	03/03/28	0%																		
▼ LOUÇAS SANITÁRIAS	14/09/27	09/01/29	0%																		
▶ LOUÇAS	14/09/27	09/01/29	0%																		
▶ METAIS	20/10/27	09/01/29	0%																		
▼ SERRALHERIA	20/10/27	01/02/29	0%																		
▶ SERRALHERIA	20/10/27	01/02/29	0%																		
▼ ESTRUTURA METÁLICA	25/04/28	21/06/28	0%																		
▶ COBERTURA	25/04/28	21/06/28	0%																		

PACOTES NÃO DESCRITOS DE FORMA EXPRESSA NA CURVA DO PREVISION (42)

PL	Pacote	Nota
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	VIGA SOLTEIRA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: viga, solteira). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	VIGA INVERTIDA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: viga, invertida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	PISO ARMADO - SETOR B	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 28 – MARCENARIA.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	PISO ARMADO - SETOR C	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 28 – MARCENARIA.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	PISO ARMADO - SETOR A	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 28 – MARCENARIA.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	EXECUÇÃO DE MURO	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: muro). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	DRENAGEM	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: drenagem). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 25 – ELEVADORES.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	POÇO ARTESIANO	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: poco, artesiano). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 25 – ELEVADORES.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	GÁS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: gas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	SHAFT INTERNO INST. HIDRÁULICAS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: shaft). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 28 – MARCENARIA.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	RAMAL DE ENTRADA - COPASA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: ramal, entrada, copasa). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	LIGAÇÃO COPASA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: ligacao, copasa). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 05 – LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET; 34 – LOUÇAS E METAIS; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA.
ALVENARIA	ESTUQUE - SETOR B	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: estuque). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS.
ALVENARIA	ESTUQUE - SETOR C	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: estuque). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS.
ALVENARIA	ESTUQUE - SETOR A	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: estuque). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS.
ALVENARIA	TRATAMENTO DE SHAFTS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: tratamento, shafts). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
ALVENARIA	TRATAMENTO ACÚSTICO	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: tratamento, acustico). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO.

PL	Pacote	Nota
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 1º QUADRANTE	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: enterrada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 2º QUADRANTE	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: enterrada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 3º QUADRANTE	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: enterrada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	DISJUNTORES / MIOLOS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: disjuntores, miolos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
JARDINEIRAS E PAISAGISMO	CAMINHO DO CLIENTE	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: caminho, cliente). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 08 – FRETES E TRANSPORTES; 14 – TERRAPLENAGEM; 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA.
JARDINEIRAS E PAISAGISMO	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: sistema). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
JARDINEIRAS E PAISAGISMO	QUADRA DE TÊNIS E POLIESPORTIVA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: quadra, tenis, poliesportiva). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
JARDINEIRAS E PAISAGISMO	PASSEIO	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: passeio). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 31 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
SEM PL (gestão / entrega)	ÁREA DE VIVÊNCIA	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	ÁREA DE VIVÊNCIA + SALAS DE JOGOS	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	COMUNICAÇÃO VISUAL	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	CHECKLIST	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	ENXOVAL	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	MANUAL DE USO E OPERAÇÃO	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	HABITE-SE	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	AVCB	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	ENTREGA OBRA / CONDOMÍNIO	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
IMPERMEABILIZAÇÃO	DRENO + ATERRO JARDINEIRAS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO (termo sem correspondência: dreno, aterro, jardineiras). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: ventilacao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	CFTV	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: cftv). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	EQUIPAMENTOS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: equipamentos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 10 – MÃO DE OBRA PRÓPRIA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 14 – TERRAPLENAGEM.

PL	Pacote	Nota
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	CARREGADOR VEICULAR / PORTA BOX	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: carregador, veicular, porta). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.
INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	ACABAMENTOS INCÊNDIO	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO (termo sem correspondência: acabamentos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 10 – MÃO DE OBRA PRÓPRIA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.
ESQUADRIAS	ESPALA ESQUADRIA DE ALUMINIO	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 26 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: espala). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES; 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA.
PINTURA	MASSA CORRIDA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: massa, corrida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS; 30 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES.

Fonte: aba CRONOGRAMA.ATIVIDADES (export do Prevision). Datas de início e término e % realizado vêm do Prevision; nos níveis PL e pacote o % é a média dos itens ponderada pela duração. O cronograma é o mesmo nos três cenários (os cenários mudam as curvas financeiras, não as datas das atividades).
