

BOTÂNICO · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Agosto/2026 · Ano do retrato: 2027 · Valores em R\$ nominais, com taxa de administração

PROJEÇÃO TOTAL

R\$ 159,3 mi

orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE

R\$ 21,2 mi

13,3% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027

R\$ 56,8 mi

realizado + previsto

SALDO A REALIZAR

R\$ 137,8 mi

após a data de corte

CONFERÊNCIA


⚠ 2 pendência(s)

detalhes abaixo

REALIZADO (ATUAL)					COMPOSIÇÃO DO ANO	
Setembro/2026						
Ano	Anual R\$	Acumulado R\$	Anual %	Acumulado %	Realizado R\$	A realizar R\$
2024	R\$ 1.055.724,07	R\$ 1.055.724,07	0,66%	0,66%	R\$ 1.055.724,07	-
2025	R\$ 7.679.641,62	R\$ 8.735.365,69	4,83%	5,49%	R\$ 7.679.641,62	-
2026	R\$ 23.475.055,90	R\$ 32.210.421,59	14,76%	20,25%	R\$ 12.498.705,62	R\$ 10.976.350,28
2027	R\$ 56.824.943,69	R\$ 89.035.365,29	35,72%	55,97%	-	R\$ 56.824.943,69
2028	R\$ 61.030.014,29	R\$ 150.065.379,58	38,36%	94,33%	-	R\$ 61.030.014,29
2029	R\$ 9.012.940,91	R\$ 159.078.320,48	5,67%	100,00%	-	R\$ 9.012.940,91
2030	-	R\$ 159.078.320,48	0,00%	100,00%	-	-
TOTAL	R\$ 159.078.320,48		100,00%		R\$ 21.234.071,31	R\$ 137.844.249,17


Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

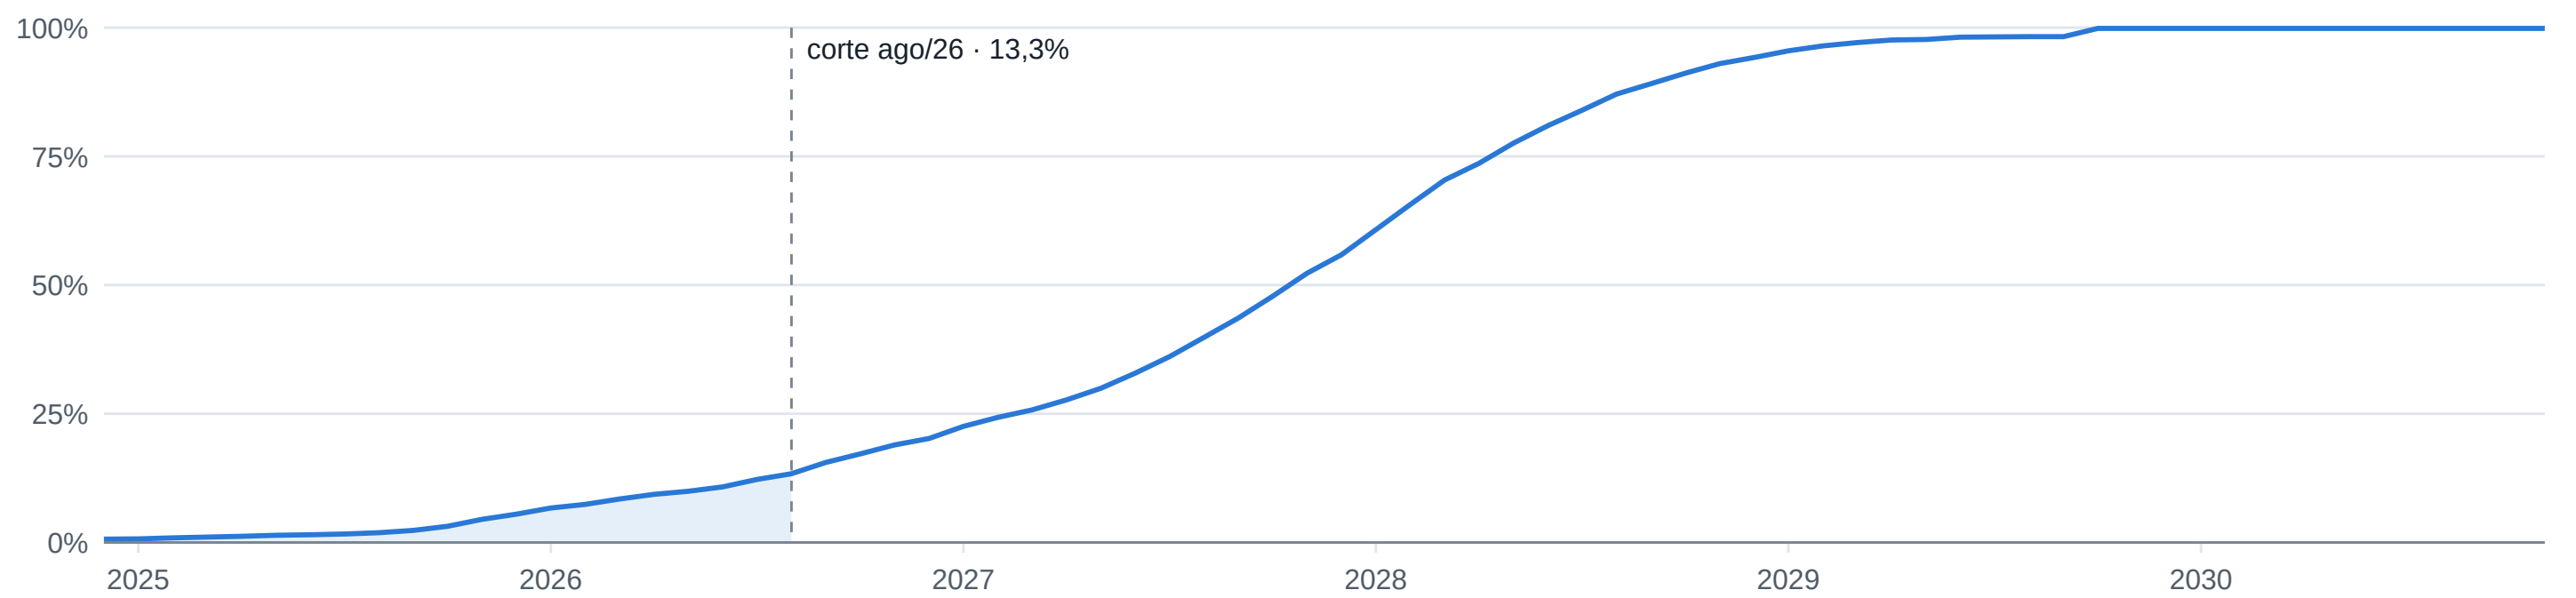

DESEMBOLSO ANUAL (R\$ MILHÕES)

Realizado A realizar

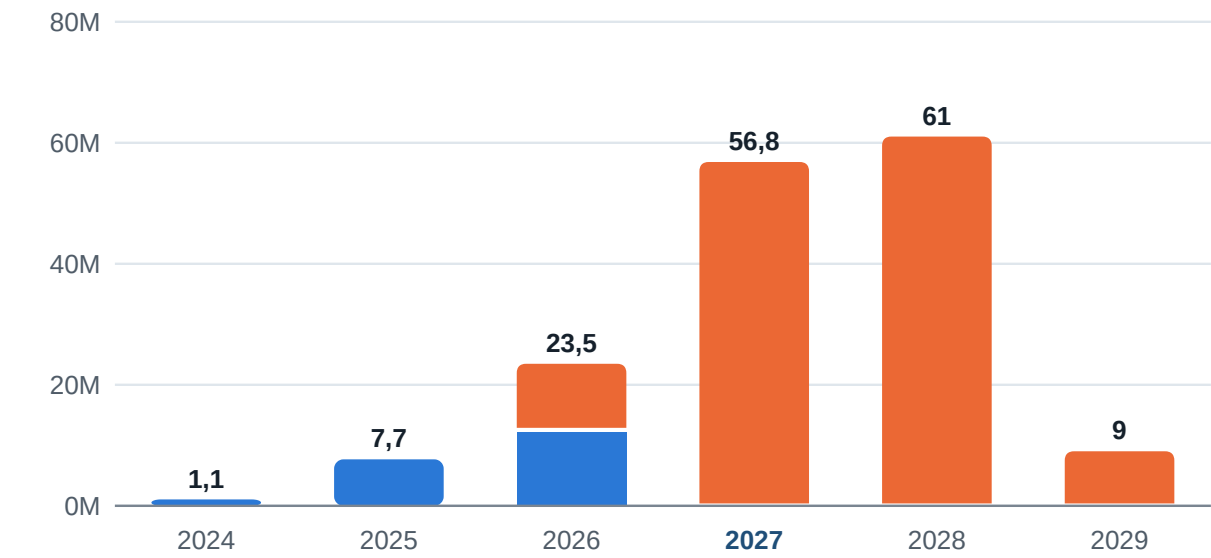

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

Grupo	R\$	% do ano	Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)	R\$ 9.848.886,54	17,3%	57,1%
Infraestrutura (12 a 16)	R\$ 1.318.864,26	2,3%	96,6%
Estrutura (17)	R\$ 17.609.815,16	31,0%	96,6%
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)	R\$ 16.904.873,00	29,7%	46,9%
Acabamentos (25 a 37)	R\$ 11.142.504,73	19,6%	24,8%
Taxa de administração	R\$ 0,00	0,0%	
TOTAL	R\$ 56.824.943,69	100,0%	

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

- LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO: Saldo sem curva (preencha a coluna H da aba)
- FUNDAÇÃO PROFUNDA: Saldo sem curva (preencha a coluna H da aba)

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.

BOTÂNICO · RETRATO DE 2027

Execução física (Prevision), desembolso do ano (fluxo financeiro) e situação da obra em 31/12/2027 · Data de corte do fluxo: ago/2026

DESEMBOLSO NO ANO (R\$ NOMINAL)
R\$ 56,8 mi
com taxa de administração

DESEMBOLSO NO ANO (INCC)
43.816 pts
pontos de índice

EM R\$ DO INCC SELECIONADO
R\$ 56,8 mi
INCC × índice do mês escolhido

EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO
57,2%
itens diretos, ponderado pela projeção

AVANÇO FINANCEIRO
58,8%
acumulado no fim do ano

MAIOR DESEMBOLSO DO ANO
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
R\$ 17.6 mi no ano

PLS EM 2027 — EXECUÇÃO FÍSICA, DESEMBOLSO E SITUAÇÃO EM 31/12/2027

■ Execução física no fim do ano (Prevision) ■ % do desembolso do ano INCC selecionado: 08/2026 (1.296,889)

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R\$ nominal	Desembolso INCC	R\$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
01	PROJETOS	—		R\$ 26.933	21	R\$ 26.933	0,0%	89,5%	
02	SEGUROS	—		R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	100,0%	
03	TAXAS DIVERSAS	—		R\$ 2.791	2	R\$ 2.791	0,0%	6,7%	
04	BARRACAO DE OBRA	—		R\$ 369.183	285	R\$ 369.183	0,6%	85,7%	
05	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO	—		R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	69,4%	
06	CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.	—		R\$ 143.910	111	R\$ 143.910	0,3%	42,1%	
07	DIVERSOS	—		R\$ 64.636	50	R\$ 64.636	0,1%	60,1%	
08	TRANSPORTES	—		R\$ 347.555	268	R\$ 347.555	0,6%	58,3%	
09	CONSULTORIAS (OBRAS)	—		R\$ 247.856	191	R\$ 247.856	0,4%	76,4%	
10	MÃO DE OBRA PRÓPRIA	—		R\$ 5.917.365	4.563	R\$ 5.917.365	10,4%	50,3%	
11	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	—		R\$ 2.728.658	2.104	R\$ 2.728.658	4,8%	57,9%	
01 a 11	INDIRETOS	—		R\$ 9.848.887	7.594	R\$ 9.848.887	17,3%	57,1%	
12	SERVIÇOS INICIAIS	100,0%	100,0%	R\$ 64.212	50	R\$ 64.212	0,1%	100,0%	Concluído (todas as 2 atividades)
13	CONTENÇÃO	100,0%	75,2%	R\$ 244.571	189	R\$ 244.571	0,4%	100,0%	Concluído (todas as 4 atividades)
14	TERRAPLENAGEM	100,0%	86,0%	R\$ 54.865	42	R\$ 54.865	0,1%	100,0%	Concluído (todas as 2 atividades)
15	FUNDAÇÃO PROFUNDA	100,0%	99,5%	R\$ 10.102	8	R\$ 10.102	0,0%	96,7%	Concluído (todas as 133 atividades)
16	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	100,0%	76,7%	R\$ 945.114	729	R\$ 945.114	1,7%	94,2%	Concluído (todas as 82 atividades)
12 a 16	SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES	100,0%	88,9%	R\$ 1.318.864	1.017	R\$ 1.318.864	2,3%	96,6%	
17	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	96,6%	8,1%	R\$ 17.609.815	13.579	R\$ 17.609.815	31,0%	96,6%	Estrutura: até 32º pav. (restam serviços no 32º pav.) Anotação do modelo anterior: ATÉ O COBERTURA - 32º PAVIMENTO

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R\$ nominal	Desembolso INCC	R\$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
18	ALVENARIA	66,8%	0,0%	R\$ 4.174.481	3.219	R\$ 4.174.481	7,3%	66,8%	Alvenaria: até 28º pav., executando 29º pav. / Encunhamento: até 27º pav. / Drywall 1ª face: até 20º pav., executando 21º pav. / Drywall 2ª face: até 17º pav., executando 18º pav. / Drywall: até térreo Anotação do modelo anterior: ALVENARIA - ATÉ 27º PAVIMENTO / GESSO ACARTONADO - 2ª FACE - ATÉ 16º PAVIMENTO
19	IMPERMEABILIZAÇÃO	30,5%	0,0%	R\$ 1.263.667	974	R\$ 1.263.667	2,2%	30,5%	Impermeabilização: até 16º pav., executando 17º pav. Anotação do modelo anterior: ATÉ O 15º PAVIMENTO
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,3%	0,0%	R\$ 3.410.016	2.629	R\$ 3.410.016	6,0%	32,2%	Distribuição elétrica / quadro: até 25º pav., executando 26º pav. / Prumada elétrica - infra: até 22º pav., executando 23º pav. / Distribuição elétrica/quadro - drywall: até 18º pav., executando 20º pav. / Fiação elétrica: até 12º pav., executando 13º pav. / Prumada elétrica - cabos: até 12º pav., executando 13º pav. / Fiação telecom/dados: até 12º pav., executando 13º pav. Anotação do modelo anterior: INFRAESTRUTURA - ATÉ O 14º PAVIMENTO / FIAÇÃO - ATÉ O 10º PAVIMENTO
21	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	65,1%	0,0%	R\$ 5.037.540	3.884	R\$ 5.037.540	8,9%	65,2%	Prumada hidrossanitária: até 27º pav., executando 28º pav. / Distribuição hidrossanitária: até 25º pav., executando 26º pav. / Distribuição de gás: até 25º pav., executando 26º pav. / Shaft interno inst. hidráulicas: até 22º pav., executando 23º pav. / Distribuição hidráulica: até 4º pav. (restam serviços no 1º pav.) / Distribuição de gás - drywall: até 18º pav., executando 20º pav. / Distribuição hidráulica - drywall: até 18º pav., executando 20º pav. Anotação do modelo anterior: INFRAESTRUTURA - ATÉ O 15º PAVIMENTO
22	INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	65,9%	0,0%	R\$ 542.268	418	R\$ 542.268	1,0%	65,9%	Prumada de incêndio: até 27º pav., executando 28º pav. Anotação do modelo anterior: PRUMADA - ATÉ 28º PAVIMENTO
23	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	33,6%	0,0%	R\$ 949.628	732	R\$ 949.628	1,7%	33,6%	Infraestrutura - ar condicionado: até 18º pav., executando 20º pav. Anotação do modelo anterior: RENOVAÇÃO DE AR - SUBSOLO
24	ELEVADORES	0,0%	0,0%	R\$ 1.527.273	1.178	R\$ 1.527.273	2,7%	44,8%	Aduelas (elevadores): em execução Anotação do modelo anterior: APENAS DESEMBOLSO FINANCEIRO - MONTAGEM PARA 2028
25	ESQUADRIAS	4,7%	0,0%	R\$ 2.819.635	2.174	R\$ 2.819.635	5,0%	23,9%	Contramarco: até 24º pav., executando 25º pav. / Esquadria de alumínio: até 7º pav., executando 8º pav. Anotação do modelo anterior: APENAS DESEMBOLSO FINANCEIRO - MONTAGEM PARA 2028
26	SERRALHERIA	19,1%	0,0%	R\$ 97.155	75	R\$ 97.155	0,2%	19,1%	Chumbamento de PCF: até 4º pav., executando 5º pav. / Serralheria: até 3º pav., executando 4º pav.
27	MARCENARIA	0,0%	0,0%	R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	0,2%	Não iniciado · início previsto em fev/2028
28	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	61,5%	0,0%	R\$ 710.365	548	R\$ 710.365	1,3%	61,5%	Contrapiso: até 21º pav., executando 22º pav. Anotação do modelo anterior: ATÉ O 21º PAVIMENTO
29	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	65,5%	0,0%	R\$ 1.736.579	1.339	R\$ 1.736.579	3,1%	65,5%	Taliscamento: até 26º pav., executando 27º pav. / Reboco interno: até 23º pav., executando 24º pav. Anotação do modelo anterior: ATÉ O 23º PAVIMENTO

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R\$ nominal	Desembolso INCC	R\$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
30	REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	23,3%	0,0%	R\$ 2.553.452	1.969	R\$ 2.553.452	4,5%	23,3%	Revestimento porcelanato parede: até 15º pav., executando 16º pav. / Revestimentos porcelanato piso: até 14º pav., executando 15º pav. / Bancadas: até 13º pav., executando 14º pav. Anotação do modelo anterior: PAREDES - ATÉ O 15º PAVIMENTO / PISOS - ATÉ O 14º PAVIMENTO
31	PAVIMENTAÇÃO	25,8%	0,0%	R\$ 29.014	22	R\$ 29.014	0,1%	25,8%	Passeios, muretas e rampas: em execução (térreo)
32	REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	41,4%	0,0%	R\$ 2.203.187	1.699	R\$ 2.203.187	3,9%	41,4%	Preparação para fachada aerada - F1 + F2 (1º etapa): concluído / Fachada loja: até térreo (restam serviços no térreo) / Fachada aerada - F1 + F2 (1º etapa): concluído / Preparação para fachada aerada - F3 + F4 (1º etapa): concluído / Fachada aerada - F3 + F4 (1º etapa): em execução / Peitoris e requadros de fachada - F1 + F2 (1º etapa): concluído / Preparação para fachada aerada - F5 (1º etapa): em execução Anotação do modelo anterior: 1ª ETAPA DE FACHADA - 70 % FINALIZADA
33	FORRO	18,2%	0,0%	R\$ 323.652	250	R\$ 323.652	0,6%	18,2%	Forro: até 11º pav., executando 12º pav. Anotação do modelo anterior: ATÉ O 11º PAVIMENTO
34	LOUÇAS SANITÁRIAS	0,0%	0,0%	R\$ 241.774	186	R\$ 241.774	0,4%	11,2%	Não iniciado · início previsto em mar/2028
35	PINTURA	15,0%	0,0%	R\$ 427.691	330	R\$ 427.691	0,8%	15,2%	Massa corrida: até térreo, executando 7º pav. Anotação do modelo anterior: TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE
36	PAISAGISMO	0,0%	0,0%	R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	0,0%	Não iniciado · início previsto em jun/2028
37	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,0%	0,0%	R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	0,0%	Não iniciado · início previsto em mar/2028
DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração)				R\$ 56.824.944	43.816	R\$ 56.824.944	100,0%		
38	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	—		R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%		
DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				R\$ 56.824.944	43.816	R\$ 56.824.944	100,0%		

Execução física = % "Previsto" acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision em dezembro; no corte = % "Realizado". Situação em 31/12 = atividades do cronograma de atividades concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.
