

# ED JARDIM · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Setembro/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: padrão (curvas digitadas) · R\$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL

R\$ 154,7 mi

orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE

R\$ 45,9 mi

29,7% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027

R\$ 56,0 mi

realizado + previsto

SALDO A REALIZAR

R\$ 108,8 mi

após a data de corte

CONFERÊNCIA


✓ Tudo OK

detalhes abaixo


| REALIZADO (ATUAL) |                    |                    |         |             | COMPOSIÇÃO DO ANO |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|-------------------|--------------------|
| Outubro/2026      |                    |                    |         |             |                   |                    |
| Ano               | Anual R\$          | Acumulado R\$      | Anual % | Acumulado % | Realizado R\$     | A realizar R\$     |
| 2024              | R\$ 5.778.713,93   | R\$ 5.778.713,93   | 3,74%   | 3,74%       | R\$ 5.778.713,93  | -                  |
| 2025              | R\$ 18.489.705,84  | R\$ 24.268.419,77  | 11,95%  | 15,69%      | R\$ 18.489.705,84 | -                  |
| 2026              | R\$ 34.288.497,43  | R\$ 58.556.917,20  | 22,16%  | 37,85%      | R\$ 21.604.582,49 | R\$ 12.683.914,94  |
| 2027              | R\$ 56.009.788,87  | R\$ 114.566.706,07 | 36,20%  | 74,05%      | -                 | R\$ 56.009.788,87  |
| 2028              | R\$ 32.502.136,81  | R\$ 147.068.842,88 | 21,01%  | 95,06%      | -                 | R\$ 32.502.136,81  |
| 2029              | R\$ 4.911.386,76   | R\$ 151.980.229,64 | 3,17%   | 98,24%      | -                 | R\$ 4.911.386,76   |
| 2030              | R\$ 2.725.430,97   | R\$ 154.705.660,62 | 1,76%   | 100,00%     | -                 | R\$ 2.725.430,97   |
| TOTAL             | R\$ 154.705.660,62 |                    | 100,00% |             | R\$ 45.873.002,26 | R\$ 108.832.658,36 |

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

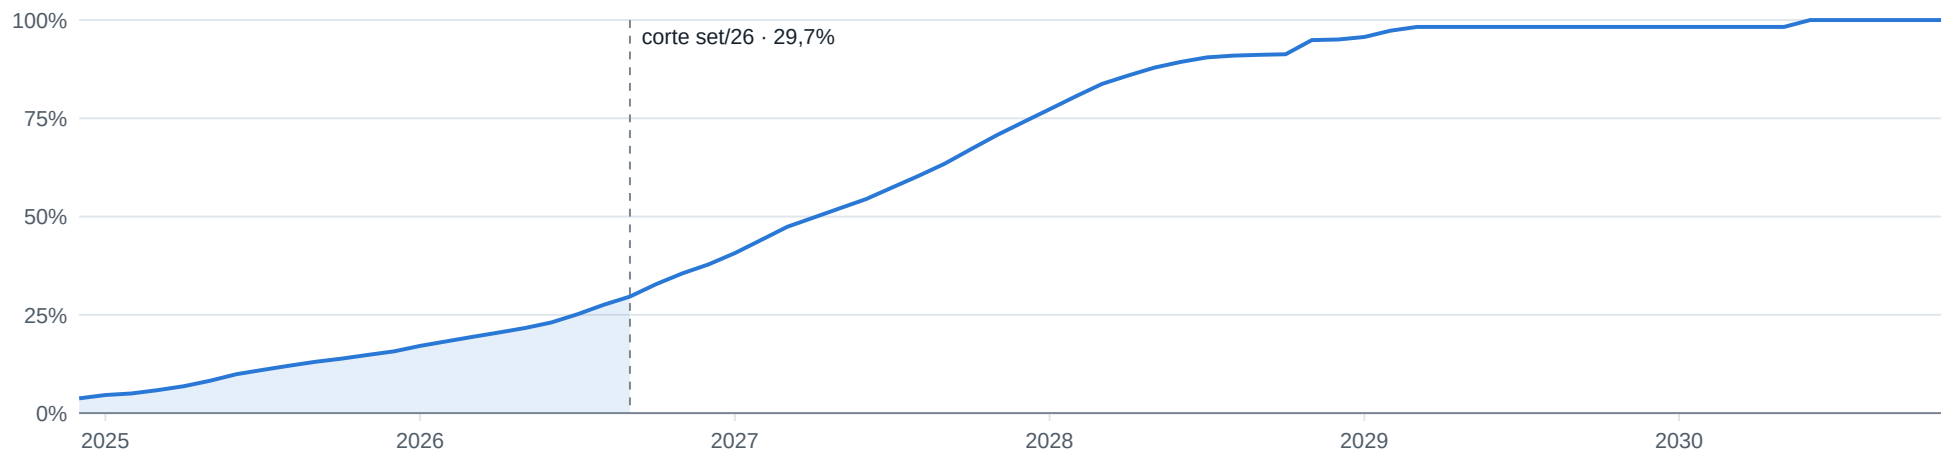

DESEMBOLSO ANUAL (R\$ MILHÕES)

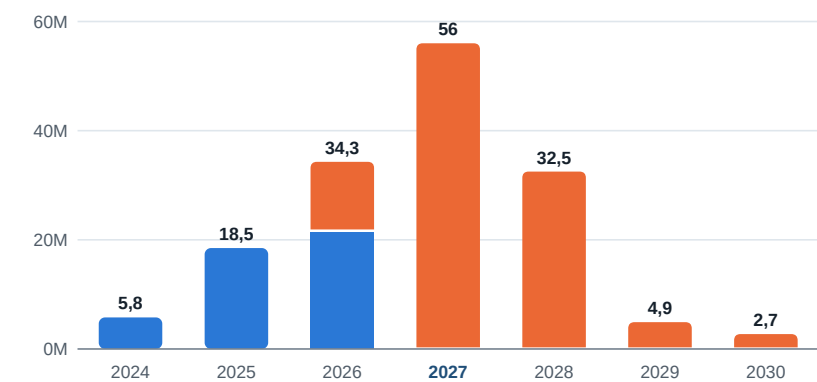

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

| Grupo                                        | R\$               | % do ano | Avanço financeiro |
|----------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Indiretos (01 a 11)                          | R\$ 7.588.160,21  | 13,5%    | 84,2%             |
| Infraestrutura (12 a 16)                     | R\$ 323.092,65    | 0,6%     | 99,8%             |
| Estrutura (17)                               | R\$ 3.966.525,43  | 7,1%     | 98,5%             |
| Vedações, instalações e elevadores (18 a 24) | R\$ 16.374.735,01 | 29,2%    | 75,6%             |
| Acabamentos (25 a 37)                        | R\$ 27.757.275,57 | 49,6%    | 56,2%             |
| Taxa de administração                        | R\$ 0,00          | 0,0%     |                   |
| TOTAL                                        | R\$ 56.009.788,87 | 100,0%   |                   |

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.

# ED JARDIM · RETRATO DE 2027

Execução física (Prevision), desembolso do ano (fluxo financeiro) e situação da obra em 31/12/2027 · Corte: set/2026 · Cenário: padrão

|                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DESEMBOLSO NO ANO (R\$ NOMINAL)</div> <div>R\$ 56,0 mi</div> <div>com taxa de administração</div> | <div>DESEMBOLSO NO ANO (INCC)</div> <div>43.093 pts</div> <div>pontos de índice</div> | <div>EM R\$ DO INCC SELECIONADO</div> <div>R\$ 56,0 mi</div> <div>INCC × índice do mês escolhido</div> | <div>EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO</div> <div>81,9%</div> <div>itens diretos, ponderado pela projeção</div> <div><div></div></div> | <div>AVANÇO FINANCEIRO</div> <div>77,9%</div> <div>acumulado no fim do ano</div> | <div>MAIOR DESEMBOLSO DO ANO</div> <div>REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO</div> <div>R\$ 10.0 mi no ano</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PLS EM 2027 — EXECUÇÃO FÍSICA, DESEMBOLSO E SITUAÇÃO EM 31/12/2027**

| Cód.           | PL / serviço                                                   | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano                            | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01             | PROJETOS                                                       | —                             |                    | R\$ 306.527               | 236                | R\$ 306.527                | <div><div></div></div> 0,5%         | 98,7%                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02             | SEGUROS                                                        | —                             |                    | R\$ 8.839                 | 7                  | R\$ 8.839                  | <div><div></div></div> 0,0%         | 91,8%                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03             | TAXAS DIVERSAS                                                 | —                             |                    | R\$ 109.339               | 84                 | R\$ 109.339                | <div><div></div></div> 0,2%         | 98,5%                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 04             | BARRACAO DE OBRA                                               | —                             |                    | R\$ 108.890               | 84                 | R\$ 108.890                | <div><div></div></div> 0,2%         | 97,0%                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 05             | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA, TELEFONIA, ESGOTO          | —                             |                    | R\$ 11.467                | 9                  | R\$ 11.467                 | <div><div></div></div> 0,0%         | 77,9%                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 06             | CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.                                 | —                             |                    | R\$ 176.360               | 136                | R\$ 176.360                | <div><div></div></div> 0,3%         | 92,4%                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 07             | DIVERSOS                                                       | —                             |                    | R\$ 23.565                | 18                 | R\$ 23.565                 | <div><div></div></div> 0,0%         | 92,2%                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 08             | TRANSPORTES                                                    | —                             |                    | R\$ 435.334               | 335                | R\$ 435.334                | <div><div></div></div> 0,8%         | 89,8%                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 09             | CONSULTORIAS (OBRAS)                                           | —                             |                    | R\$ 337.055               | 259                | R\$ 337.055                | <div><div></div></div> 0,6%         | 85,5%                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10             | MÃO DE OBRA PRÓPRIA                                            | —                             |                    | R\$ 4.930.202             | 3.793              | R\$ 4.930.202              | <div><div></div></div> 8,8%         | 81,4%                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11             | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                     | —                             |                    | R\$ 1.140.582             | 878                | R\$ 1.140.582              | <div><div></div></div> 2,0%         | 79,6%                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>01 a 11</b> | <b>INDIRETOS</b>                                               | —                             |                    | <b>R\$ 7.588.160</b>      | <b>5.838</b>       | <b>R\$ 7.588.160</b>       | <div><div></div></div> <b>13,5%</b> | <b>84,2%</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12             | SERVIÇOS INICIAIS                                              | <div><div></div></div> 100,0% | 90,0%              | R\$ 24.317                | 19                 | R\$ 24.317                 | <div><div></div></div> 0,0%         | 100,0%               | Concluído (todas as 2 atividades)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13             | CONTENÇÃO                                                      | <div><div></div></div> 100,0% | 100,0%             | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0%         | 100,0%               | Concluído (todas as 14 atividades)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14             | TERRAPLENAGEM                                                  | <div><div></div></div> 100,0% | 89,0%              | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0%         | 100,0%               | Concluído (todas as 6 atividades)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15             | FUNDAÇÃO PROFUNDA                                              | <div><div></div></div> 100,0% | 100,0%             | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0%         | 100,0%               | Concluído (todas as 12 atividades)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16             | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL                                           | <div><div></div></div> 100,0% | 91,9%              | R\$ 298.776               | 230                | R\$ 298.776                | <div><div></div></div> 0,5%         | 99,3%                | Concluído (todas as 81 atividades)                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>12 a 16</b> | <b>SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES</b> | <div><div></div></div> 100,0% | 95,0%              | <b>R\$ 323.093</b>        | <b>249</b>         | <b>R\$ 323.093</b>         | <div><div></div></div> 0,6%         | <b>99,8%</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17             | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO                                   | <div><div></div></div> 100,0% | 69,8%              | R\$ 3.966.525             | 3.052              | R\$ 3.966.525              | <div><div></div></div> 7,1%         | 98,5%                | Concluído (todas as 466 atividades)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18             | ALVENARIA                                                      | <div><div></div></div> 95,7%  | 35,8%              | R\$ 1.755.304             | 1.351              | R\$ 1.755.304              | <div><div></div></div> 3,1%         | 97,9%                | Alvenaria: até 27º pav. / Alvenaria externa: concluído / Encunhamento: concluído / Tratamento acústico: até 24º pav.                                                                                                                                                       |
| 19             | IMPERMEABILIZAÇÃO                                              | <div><div></div></div> 93,9%  | 0,0%               | R\$ 2.455.282             | 1.889              | R\$ 2.455.282              | <div><div></div></div> 4,4%         | 97,5%                | Impermeabilização: concluído / Impermeabilização interna: até 24º pav., executando 25º pav. / Impermeabilização varanda e jardineiras: até 24º pav. / Dreno + aterro jardineiras: até 23º pav., executando 24º pav.                                                        |
| 20             | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                          | <div><div></div></div> 57,4%  | 9,2%               | R\$ 3.649.498             | 2.808              | R\$ 3.649.498              | <div><div></div></div> 6,5%         | 57,1%                | Infraestrutura enterrada - 1º quadrante: concluído / Infraestrutura elétrica - teto: concluído / Infraestrutura elétrica - paredes: até 23º pav. / Distribuição elétrica / quadro - setor b: concluído / Prumada elétrica infra: concluído / Fiação elétrica: até 20º pav. |

| Cód. | PL / serviço                         | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                      |                               |                    |                           |                    |                            |          |                      | (restam serviços no 15º pav.) / Disjuntores / miolos: até 11º pav.<br>(restam serviços no 5º pav.) / Acabamentos elétricos: até 7º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21   | INSTALAÇÕES<br>HIDROSANITÁRIAS       | 100,0%                        | 0,0%               | R\$ 3.572.539             | 2.749              | R\$ 3.572.539              | 6,4%     | 81,7%                | Prumada hidrossanitária: concluído / Distribuição hidrossanitária: concluído / Gás: concluído / Shaft interno inst. hidráulicas: até 25º pav., executando 26º pav.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22   | INSTALAÇÕES COMBATE<br>INCÊNDIO      | 76,8%                         | 0,0%               | R\$ 589.485               | 454                | R\$ 589.485                | 1,1%     | 89,8%                | Prumada de incêndio: concluído / Acabamentos incêndio: até 7º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23   | INSTALAÇÕES ESPECIAIS                | 85,8%                         | 0,0%               | R\$ 3.513.894             | 2.704              | R\$ 3.513.894              | 6,3%     | 63,6%                | Infraestrutura - ar condicionado: até 22º pav., executando 23º pav. / Ventilação / exaustão: até 20º pav. / Cftv: até 11º pav.<br>(restam serviços no 5º pav.)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24   | ELEVADORES                           | 97,1%                         | 0,0%               | R\$ 838.733               | 645                | R\$ 838.733                | 1,5%     | 92,1%                | Preparação poço elevador: concluído / Elevador 1: concluído / Elevador 2: concluído / Elevador 3: em execução                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25   | ESQUADRIAS                           | 57,6%                         | 0,0%               | R\$ 6.999.575             | 5.385              | R\$ 6.999.575              | 12,5%    | 61,3%                | Contramarco: concluído / Espala esquadria de alumínio: concluído / Esquadria: até 14º pav., executando 15º pav. / Esquadria madeira: até 11º pav.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26   | SERRALHERIA                          | 5,0%                          | 0,0%               | R\$ 125.895               | 97                 | R\$ 125.895                | 0,2%     | 27,0%                | Serralheria: até 7º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27   | MARCENARIA                           | 36,5%                         | 0,0%               | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | 0,0%     | 0,0%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28   | REVESTIMENTOS DE MASSA EM<br>PISOS   | 88,5%                         | 0,5%               | R\$ 1.057.354             | 814                | R\$ 1.057.354              | 1,9%     | 98,0%                | Contrapiso: até 23º pav., executando 24º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29   | REVESTIMENTOS DE MASSA EM<br>PAREDES | 87,9%                         | 15,3%              | R\$ 1.617.737             | 1.245              | R\$ 1.617.737              | 2,9%     | 91,3%                | Reboco interno: até 26º pav., executando 27º pav. / Revestimento de massa: concluído / Taliscamento: concluído                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30   | REVESTIMENTOS DE<br>ACABAMENTO       | 73,7%                         | 0,0%               | R\$ 10.046.617            | 7.730              | R\$ 10.046.617             | 17,9%    | 52,2%                | Revestimento parede: até 22º pav. / Revestimentos piso: até 21º pav., executando 22º pav. / Bancadas: até 21º pav. (restam serviços no 13º pav.) / Piso madeira / laminado: até 11º pav. (restam serviços no 9º pav.) / Rodapé madeira / pvc: até 11º pav. (restam serviços no 8º pav.) / Tratamento de granito/mármore: até 7º pav., executando 10º pav.                                               |
| 31   | ESTRUTURA METÁLICA                   | 0,0%                          | 0,0%               | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | 0,0%     | 0,0%                 | Não iniciado - início previsto em abr/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32   | REVESTIMENTO DIVERSOS<br>FACHADA     | 97,3%                         | 0,0%               | R\$ 4.039.029             | 3.108              | R\$ 4.039.029              | 7,2%     | 62,1%                | Fachada posterior - F1 (a): concluído / Fachada jairo - F1 (b): concluído / Fachada frontal - F1 (c): concluído / Fachada baltazar - F1 (d): concluído / Fachada posterior - F2 (a): concluído / Fachada jairo - F2 (b): concluído / Fachada frontal - F2 (c): em execução / Fachada baltazar - F2 (d): concluído / Textura: até 2º pav. (restam serviços no térreo) / Fachada cremalheira: em execução |
| 33   | FORRO                                | 41,8%                         | 0,0%               | R\$ 866.364               | 667                | R\$ 866.364                | 1,5%     | 39,1%                | Forro: até 20º pav. (restam serviços no 14º pav.) / Forro de madeira: até 11º pav. (restam serviços no 8º pav.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34   | LOUÇAS SANITÁRIAS                    | 11,6%                         | 0,0%               | R\$ 366.523               | 282                | R\$ 366.523                | 0,7%     | 29,6%                | Louças: até 7º pav. / Metais: até 7º pav. (restam serviços no térreo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35   | PINTURA                              | 53,3%                         | 5,9%               | R\$ 1.228.680             | 945                | R\$ 1.228.680              | 2,2%     | 59,1%                | Massa corrida: até 20º pav. / Pintura 1ª demão: até 20º pav. (restam serviços no 12º pav.) / Pintura 2ª demão: até 7º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Cód.                                          | PL / serviço             | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano                      | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                          |                               |                    |                           |                    |                            |                               |                      | (restam serviços no 3º pav.) / Pintura 3ª demão: até 7º pav.                |
| 36                                            | JARDINEIRAS E PAISAGISMO | <div><div></div></div> 67,8%  | 11,8%              | R\$ 1.272.158             | 979                | R\$ 1.272.158              | <div><div></div></div> 2,3%   | 68,8%                | Paisagismo: até 10º pav., executando 11º pav.                               |
| 37                                            | LIMPEZA FINAL DE OBRA    | <div><div></div></div> 9,3%   | 0,0%               | R\$ 137.344               | 106                | R\$ 137.344                | <div><div></div></div> 0,2%   | 17,2%                | Limpeza grossa: até 7º pav. / Limpeza fina: até 6º pav., executando 7º pav. |
| DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração) |                          |                               |                    | R\$ 56.009.789            | 43.093             | R\$ 56.009.789             | <div><div></div></div> 100,0% |                      |                                                                             |
| 38                                            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO    | —                             |                    | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0%   |                      |                                                                             |
| DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   |                          |                               |                    | R\$ 56.009.789            | 43.093             | R\$ 56.009.789             | <div><div></div></div> 100,0% |                      |                                                                             |


Execução física = % "Previsto" acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision em dezembro; no corte = % "Realizado". Situação em 31/12 = atividades do cronograma de atividades concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.

# Ed Jardim - Curva física por cenário

Avanço físico acumulado dos itens diretos (26 PLs), ponderado pela projeção de cada PL - Corte: set/26 - Realizado no corte: 24,78%

## Curva S

Visão geral > passe o mouse no gráfico para ver o detalhamento do mês

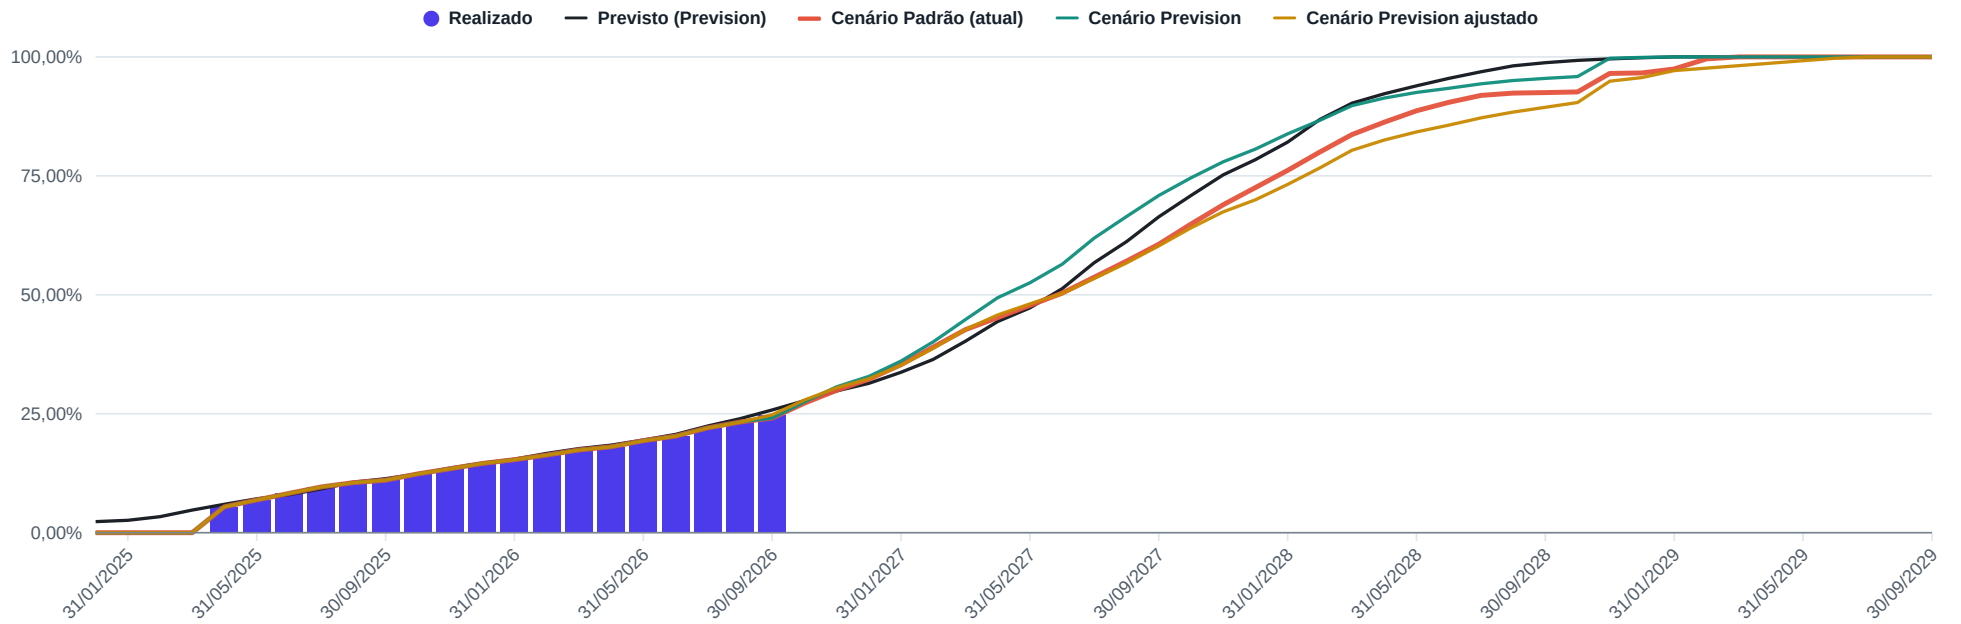

### AVANÇO FÍSICO ACUMULADO NO FIM DE CADA ANO

| Data             | Realizado | Previsto (Prevision) | Padrão | Prevision | Prevision ajustado |
|------------------|-----------|----------------------|--------|-----------|--------------------|
| 31/12/2024       | 0,0%      | 2,3%                 | 0,0%   | 0,0%      | 0,0%               |
| 31/12/2025       | 14,6%     | 14,6%                | 14,6%  | 14,6%     | 14,6%              |
| 31/12/2026       | —         | 31,4%                | 32,3%  | 32,9%     | 32,4%              |
| 31/12/2027       | —         | 78,4%                | 72,5%  | 80,6%     | 70,0%              |
| 31/12/2028       | —         | 99,8%                | 96,6%  | 99,9%     | 95,7%              |
| 31/12/2029       | —         | 100,0%               | 100,0% | 100,0%    | 100,0%             |
| Conclusão (100%) |           | jan/29               | mar/29 | jan/29    | jul/29             |

POR PL EM 31/12/2027

| PL                                | No corte | Prevision | Padrão | Prevision | Prevision ajustado |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|--------------------|
| SERVIÇOS INICIAIS                 | 90,0%    | 100,0%    | 100,0% | 100,0%    | 100,0%             |
| CONTENÇÃO                         | 100,0%   | 100,0%    | 100,0% | 100,0%    | 100,0%             |
| TERRAPLENAGEM                     | 89,0%    | 100,0%    | 100,0% | 100,0%    | 100,0%             |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA                 | 100,0%   | 100,0%    | 100,0% | 100,0%    | 100,0%             |
| FUNDAÇÃO SUPERFICIAL              | 91,9%    | 100,0%    | 99,8%  | 100,0%    | 99,7%              |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO      | 69,8%    | 100,0%    | 98,7%  | 99,0%     | 98,8%              |
| ALVENARIA                         | 35,8%    | 95,7%     | 98,0%  | 96,2%     | 95,6%              |
| IMPERMEABILIZAÇÃO                 | 0,0%     | 93,9%     | 97,4%  | 94,2%     | 93,1%              |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             | 9,2%     | 57,4%     | 56,7%  | 58,8%     | 58,6%              |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS       | 0,0%     | 100,0%    | 79,5%  | 100,0%    | 52,3%              |
| INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO      | 0,0%     | 76,8%     | 89,8%  | 77,2%     | 76,1%              |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS             | 0,0%     | 85,8%     | 63,6%  | 85,7%     | 63,9%              |
| ELEVADORES                        | 0,0%     | 97,1%     | 88,8%  | 89,9%     | 88,9%              |
| ESQUADRIAS                        | 0,0%     | 57,6%     | 61,2%  | 62,4%     | 61,6%              |
| SERRALHERIA                       | 0,0%     | 5,0%      | 26,2%  | 5,1%      | 5,0%               |
| MARCENARIA                        | 0,0%     | 36,5%     | 0,0%   | 36,5%     | 35,8%              |
| REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS   | 0,5%     | 88,5%     | 98,0%  | 88,5%     | 87,1%              |
| REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES | 15,3%    | 87,9%     | 91,4%  | 89,0%     | 97,6%              |
| REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO       | 0,0%     | 73,7%     | 52,3%  | 73,7%     | 38,6%              |
| ESTRUTURA METÁLICA                | 0,0%     | 0,0%      | 0,0%   | 0,0%      | 0,0%               |
| REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA     | 0,0%     | 97,3%     | 60,6%  | 97,2%     | 70,6%              |
| FORRO                             | 0,0%     | 41,8%     | 39,1%  | 41,8%     | 41,1%              |
| LOUÇAS SANITÁRIAS                 | 0,0%     | 11,6%     | 29,6%  | 30,3%     | 29,7%              |
| PINTURA                           | 5,9%     | 53,3%     | 59,7%  | 53,8%     | 52,9%              |
| JARDINEIRAS E PAISAGISMO          | 11,8%    | 67,8%     | 68,6%  | 64,2%     | 63,3%              |
| LIMPEZA FINAL DE OBRA             | 0,0%     | 9,3%      | 17,2%  | 9,3%      | 9,1%               |

Como a curva é montada. **Realizado e Previsto (Prevision):** % acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision (aba CP RESUMO) de cada PL. **Cenários:** até o corte, o realizado; depois, o físico de cada PL avança na mesma proporção do desembolso que falta no cenário (curva financeira da aba da PL). PL sem desembolso futuro segue o previsto do Prevision. A obra é a média das PLs diretas ponderada pela projeção (R\$ 121,2 mi). O Prevision pondera pelo custo do próprio cronograma, por isso o % dele pode ser um pouco diferente.

# Ed Jardim · Gantt do cronograma

2.253 atividades do Prevision (situação em 28/09/26) · PL → pacote de trabalho → pavimento/tarefa · clique na seta para abrir



| PL / pacote / pavimento                       | Início   | Término  | Real. | 2024 | 2025 |     |     |     | 2026 |     |     |     | 2027 |     |     |     | 2028 |     |     |     | 2029 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
|                                               |          |          |       | out  | jan  | abr | jul | out | jan  | abr | jul | out | jan  | abr | jul | out | jan  | abr | jul | out | jan  |
| ▶ ESTRUTURA EMBASAMENTO B                     | 19/05/25 | 10/10/25 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ ESTRUTURA EMBASAMENTO B - MEDIÇÃO           | 19/05/25 | 10/10/25 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ ESTRUTURA TORRE A                           | 01/09/25 | 15/10/25 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ ESTRUTURA TORRE                             | 15/09/25 | 06/04/27 | 67%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ ESTRUTURA EMBASAMENTO C                     | 07/10/25 | 19/02/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ ESTRUTURA EMBASAMENTO C - MEDIÇÃO           | 07/10/25 | 17/02/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ ESTRUTURA TORRE A - LOOKAHEAD               | 03/11/25 | 28/11/25 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ ESTRUTURA TORRE - GARDEN - LOOKAEHAD        | 26/11/25 | 19/12/25 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ VIGA SOLTEIRA ⓘ                             | 05/01/26 | 23/02/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ VIGA INVERTIDA ⓘ                            | 05/01/26 | 14/01/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ VIGAS V31, V403 E V405 - TERRAÇO SALÃO D... | 19/03/26 | 30/04/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ PISO ARMADO - SETOR B ⓘ                     | 17/06/26 | 17/07/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ PISO ARMADO - SETOR C ⓘ                     | 20/07/26 | 14/08/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ PISO ARMADO - SETOR A ⓘ                     | 17/08/26 | 31/08/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| EXECUÇÃO DE MURO ⓘ                            | 15/02/27 | 29/10/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▼ INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS ⓘ 6 inferidos   | 01/08/25 | 16/03/28 | 8%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ DRENAGEM ⓘ                                  | 01/08/25 | 03/10/25 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE REUSO               | 02/03/26 | 31/03/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ POÇO ARTESIANO ⓘ                            | 16/03/26 | 17/07/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ PRUMADA HIDROSSANITÁRIA                     | 10/08/26 | 17/09/27 | 3%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA                | 24/08/26 | 14/09/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ GÁS ⓘ                                       | 01/09/26 | 27/10/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - SETOR B           | 08/09/26 | 07/10/26 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ SHAFT INTERNO INST. HIDRÁULICAS ⓘ           | 16/09/26 | 11/01/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                     | 25/09/26 | 16/03/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - SETOR C           | 08/10/26 | 10/11/26 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - SETOR A           | 11/11/26 | 11/12/26 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ RESERVATÓRIO - CAIXA DE DETENÇÃO            | 23/04/27 | 26/07/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ RESERVATÓRIOS / BOILERS                     | 22/06/27 | 12/07/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| RAMAL DE ENTRADA - COPASA ⓘ                   | 01/07/27 | 01/10/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |

| PL / pacote / pavimento                      | Início   | Término  | Real. | 2024 | 2025 |     |     |     | 2026 |     |     |     | 2027     |     |     |     | 2028     |     |     |     | 2029 |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|------|
|                                              |          |          |       | out  | jan  | abr | jul | out | jan  | abr | jul | out | jan      | abr | jul | out | jan      | abr | jul | out | jan  |
| LIGAÇÃO COPASA ⓘ                             | 02/07/27 | 05/11/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     | 28/09/26 |     |     |     | 31/12/27 |     |     |     |      |
| ▼ ALVENARIA 5 inferidos                      | 03/11/25 | 02/03/28 | 55%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ALVENARIA BLOCO CHEIO + ACERTO DE TAL...   | 03/11/25 | 28/11/25 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ESTUQUE - SETOR B ⓘ                        | 10/11/25 | 17/07/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ALVENARIA - POSTERIOR E LATERAL ESQUER...  | 03/12/25 | 19/06/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ALVENARIA FECHAMENTO POSTERIOR C           | 25/02/26 | 04/03/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ESTUQUE - SETOR C ⓘ                        | 02/03/26 | 24/08/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ALVENARIA RAMPA B                          | 05/03/26 | 16/03/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ALVENARIA FECHAMENTO LATERAL - SETOR C     | 05/03/26 | 19/03/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ESTUQUE - SETOR A ⓘ                        | 09/03/26 | 31/07/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ALVENARIA - SETOR B                        | 16/03/26 | 04/09/26 | 99%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ALVENARIA CASA MAQUINAS A                  | 17/03/26 | 27/03/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ALVENARIA ÁREA SOCIAL                      | 20/03/26 | 31/07/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ALVENARIA                                  | 23/03/26 | 02/03/28 | 42%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ALVENARIA EXTERNA                          | 06/05/26 | 30/04/27 | 73%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ TRATAMENTO DE SHAFTS ⓘ                     | 10/08/26 | 30/10/26 | 25%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ALVENARIA - SETOR C                        | 08/09/26 | 07/10/26 | 60%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ALVENARIA - SETOR A                        | 08/10/26 | 10/11/26 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ENCUNHAMENTO                               | 08/10/26 | 27/10/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ TRATAMENTO ACÚSTICO ⓘ                      | 10/12/26 | 26/01/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▼ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 inferidos          | 29/01/26 | 09/01/29 | 18%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ENTRADA DE ENERGIA                         | 29/01/26 | 05/06/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ RAMAL DE ENTRADA - CEMIG                   | 16/02/26 | 05/06/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 1º QUAD... ⓘ    | 01/04/26 | 16/06/26 | 99%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - TETO             | 01/06/26 | 14/10/27 | 15%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS - SET... | 01/06/26 | 29/06/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 2º QUAD... ⓘ    | 17/06/26 | 10/07/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS - SET... | 30/06/26 | 21/07/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 3º QUAD... ⓘ    | 06/07/26 | 30/07/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - PAREDES          | 13/07/26 | 16/03/28 | 4%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |

| PL / pacote / pavimento                      | Início   | Término  | Real. | 2024 | 2025 |     |     |     | 2026 |     |     |     | 2027 |     |     |     | 2028 |     |     |     | 2029 |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
|                                              |          |          |       | out  | jan  | abr | jul | out | jan  | abr | jul | out | jan  | abr | jul | out | jan  | abr | jul | out | jan  |
| ▶ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS - SET... | 22/07/26 | 18/08/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (TETO) - SETOR B   | 03/08/26 | 15/09/26 | 95%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO - SETOR B   | 04/08/26 | 14/10/27 | 10%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                      | 24/08/26 | 16/03/28 | 40%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (TETO) - SETOR C   | 16/09/26 | 16/10/26 | 14%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ PRUMADA ELÉTRICA INFRA                     | 29/09/26 | 27/09/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO - SETOR C   | 08/10/26 | 10/11/26 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (TETO) - SETOR A   | 19/10/26 | 18/11/26 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO - SETOR A   | 11/11/26 | 01/12/26 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ FIAÇÃO ELÉTRICA                            | 13/01/27 | 17/04/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| CAIXAS DE PASSAGEM                           | 07/04/27 | 01/07/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ DISJUNTORES / MIOLOS ⓘ                     | 02/08/27 | 18/10/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ SPDA                                       | 24/09/27 | 22/10/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ ACABAMENTOS ELÉTRICOS                      | 07/10/27 | 09/01/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| PRUMADA ELÉTRICA CABOS                       | 07/01/28 | 07/04/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ GERADOR                                    | 11/01/28 | 17/01/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▼ JARDINEIRAS E PAISAGISMO ⓘ 4 inferidos     | 02/02/26 | 01/12/28 | 22%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ PAISAGISMO                                 | 02/02/26 | 01/12/28 | 19%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ CAMINHO DO CLIENTE ⓘ                       | 08/05/26 | 04/09/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ SISTEMA DE IRRIGAÇÃO ⓘ                     | 04/01/27 | 22/04/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ QUADRA DE TÊNIS E POLIESPORTIVA ⓘ          | 10/02/27 | 16/07/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ PASSEIO ⓘ                                  | 10/02/28 | 06/03/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▼ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES          | 02/03/26 | 30/03/28 | 29%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ REBOCO - SETOR B                           | 02/03/26 | 21/10/26 | 49%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ REBOCO - SETOR C                           | 01/04/26 | 23/11/26 | 58%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ REBOCO INTERNO                             | 21/05/26 | 30/03/28 | 25%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ REBOCO - SETOR A                           | 25/05/26 | 18/12/26 | 15%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ REVESTIMENTO DE MASSA                      | 03/08/26 | 30/09/26 | 94%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▶ TALISCAMENTO                               | 03/08/26 | 30/09/27 | 8%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |
| ▼ LIMPEZA FINAL DE OBRA                      | 16/03/26 | 06/02/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |

| PL / pacote / pavimento                    | Início   | Término  | Real. | 2024 | 2025 |     |     |     | 2026 |     |     |     | 2027     |     |     |     | 2028     |     |     |     | 2029 |
|--------------------------------------------|----------|----------|-------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|------|
|                                            |          |          |       | out  | jan  | abr | jul | out | jan  | abr | jul | out | jan      | abr | jul | out | jan      | abr | jul | out | jan  |
| ▶ LIMPEZA DE ETULHO E MADEIRA - SETOR B    | 16/03/26 | 20/03/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     | 28/09/26 |     |     |     | 31/12/27 |     |     |     |      |
| ▶ LIMPEZA GROSSA                           | 21/09/27 | 08/12/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ LIMPEZA FINA                             | 19/11/27 | 06/02/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ LIMPEZA FACHADA                          | 20/03/28 | 23/05/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▼ SEM PL (gestão / entrega) 9 inferidos    | 04/05/26 | 13/02/29 | 6%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ÁREA DE VIVÊNCIA ⓘ                       | 04/05/26 | 15/06/26 | 100%  |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ÁREA DE VIVÊNCIA + SALAS DE JOGOS ⓘ      | 06/07/26 | 14/08/26 | 93%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ COMUNICAÇÃO VISUAL ⓘ                     | 22/11/27 | 07/02/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ CHECKLIST ⓘ                              | 03/12/27 | 13/02/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ENXOVAL ⓘ                                  | 07/12/27 | 24/04/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| MANUAL DE USO E OPERAÇÃO ⓘ                 | 05/01/28 | 03/02/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| HABITE-SE ⓘ                                | 07/03/28 | 24/04/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| AVCB ⓘ                                     | 17/03/28 | 24/04/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ENTREGA OBRA / CONDOMÍNIO ⓘ                | 25/04/28 | 19/05/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▼ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS          | 17/06/26 | 13/04/28 | 12%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ CONTRAPISO                               | 17/06/26 | 13/04/28 | 12%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▼ IMPERMEABILIZAÇÃO 1 inferido             | 13/07/26 | 02/03/28 | 7%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ REGULARIZAÇÃO DE PISO PARA IMPERMEABI... | 13/07/26 | 22/09/26 | 92%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ IMPERMEABILIZAÇÃO                        | 24/08/26 | 23/08/27 | 16%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA                | 26/11/26 | 24/01/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ IMPERMEABILIZAÇÃO VARANDA E JARDINEIR... | 11/12/26 | 07/02/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ DRENO + ATERRO JARDINEIRAS ⓘ             | 07/01/27 | 02/03/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▼ INSTALAÇÕES ESPECIAIS 4 inferidos        | 10/08/26 | 18/10/28 | 4%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ PISCINA                                  | 10/08/26 | 29/04/27 | 32%   |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO         | 21/01/27 | 20/03/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ AR CONDICIONADO                          | 12/02/27 | 22/10/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO ⓘ                  | 17/03/27 | 31/03/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ CFTV ⓘ                                   | 02/08/27 | 18/10/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ COMUNICAÇÃO E ALARME                     | 27/09/27 | 11/01/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ EQUIPAMENTOS ⓘ                           | 30/11/27 | 10/01/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |

| PL / pacote / pavimento                   | Início   | Término  | Real. | 2024 | 2025 |     |     |     | 2026 |     |     |     | 2027     |     |     |     | 2028     |     |     |     | 2029 |
|-------------------------------------------|----------|----------|-------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|------|
|                                           |          |          |       | out  | jan  | abr | jul | out | jan  | abr | jul | out | jan      | abr | jul | out | jan      | abr | jul | out | jan  |
| ▶ CARREGADOR VEICULAR / PORTA BOX ⓘ       | 06/12/27 | 17/03/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     | 28/09/26 |     |     |     | 31/12/27 |     |     |     |      |
| ▼ REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA           | 15/09/26 | 17/03/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ FACHADA POSTERIOR - F1 (A)              | 15/09/26 | 07/12/26 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ FACHADA JAIRO - F1 (B)                  | 30/10/26 | 12/01/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ FACHADA FRONTAL - F1 (C)                | 10/12/26 | 11/05/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ FACHADA BALTAZAR - F1 (D)               | 15/12/26 | 29/01/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ FACHADA POSTERIOR - F2 (A)              | 01/04/27 | 18/08/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ FACHADA JAIRO - F2 (B)                  | 11/06/27 | 09/09/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ FACHADA FRONTAL - F2 (C)                | 23/07/27 | 06/01/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ FACHADA BALTAZAR - F2 (D)               | 17/09/27 | 07/10/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ TEXTURA                                 | 11/10/27 | 02/02/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ FACHADA CREMALHEIRA                     | 20/10/27 | 17/03/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ REBOCO EXTERNO                          | 05/01/28 | 01/02/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▼ INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO ⓘ inferido | 21/09/26 | 06/02/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ PRUMADA DE INCÊNDIO                     | 21/09/26 | 17/09/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ACABAMENTOS INCÊNDIO ⓘ                  | 21/06/27 | 06/02/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▼ ESQUADRIAS ⓘ inferido                   | 23/09/26 | 19/09/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ CONTRAMARCO                             | 23/09/26 | 27/10/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ESPALA ESQUADRIA DE ALUMINIO ⓘ          | 22/10/26 | 18/10/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ESQUADRIA                               | 08/04/27 | 12/09/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ESQUADRIA MADEIRA                       | 05/07/27 | 19/09/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▼ REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO             | 11/01/27 | 09/01/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO          | 11/01/27 | 24/02/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ REVESTIMENTO PAREDE                     | 21/01/27 | 24/04/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ REVESTIMENTOS PISO                      | 17/02/27 | 02/05/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE         | 25/02/27 | 29/03/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ BANCADAS                                | 03/03/27 | 24/03/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ PISO MADEIRA / LAMINADO                 | 21/06/27 | 04/09/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ RODAPÉ MADEIRA / PVC                    | 19/07/27 | 03/10/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ POLIMENTO PISO                          | 28/07/27 | 18/10/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |

| PL / pacote / pavimento         | Início   | Término  | Real. | 2024 | 2025 |     |     |     | 2026 |     |     |     | 2027     |     |     |     | 2028     |     |     |     | 2029 |
|---------------------------------|----------|----------|-------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|------|
|                                 |          |          |       | out  | jan  | abr | jul | out | jan  | abr | jul | out | jan      | abr | jul | out | jan      | abr | jul | out | jan  |
| ▶ DECK                          | 02/08/27 | 15/09/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     | 28/09/26 |     |     |     | 31/12/27 |     |     |     |      |
| ▶ PISO VINÍLICO / LAMINADO      | 02/08/27 | 13/08/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ TRATAMENTO DE GRANITO/MÁRMORE | 30/08/27 | 09/01/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ PISO ELEVADO / EXTERNO        | 24/11/27 | 18/02/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▼ FORRO                         | 30/03/27 | 09/11/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ FORRO                         | 30/03/27 | 10/05/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ FORRO DE MADEIRA              | 12/07/27 | 09/11/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▼ ELEVADORES                    | 20/04/27 | 06/01/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ PREPARAÇÃO POÇO ELEVADOR      | 20/04/27 | 12/08/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ELEVADOR 1                    | 23/06/27 | 23/08/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ELEVADOR 2                    | 24/08/27 | 20/10/27 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ ELEVADOR 3                    | 21/10/27 | 06/01/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▼ PINTURA 1 inferido            | 30/04/27 | 23/01/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ MASSA CORRIDA 1               | 30/04/27 | 19/05/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ PINTURA 1º DEMÃO              | 14/05/27 | 31/05/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ PINTURA 2º DEMÃO              | 05/10/27 | 22/12/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ PINTURA 3º DEMÃO              | 04/11/27 | 23/01/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ PINTURA VAGAS                 | 12/11/27 | 03/03/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▼ LOUÇAS SANITÁRIAS             | 14/09/27 | 09/01/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ LOUÇAS                        | 14/09/27 | 09/01/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ METAIS                        | 20/10/27 | 09/01/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▼ SERRALHERIA                   | 20/10/27 | 01/02/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ SERRALHERIA                   | 20/10/27 | 01/02/29 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▼ ESTRUTURA METÁLICA            | 25/04/28 | 21/06/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |
| ▶ COBERTURA                     | 25/04/28 | 21/06/28 | 0%    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |

## PACOTES NÃO DESCRITOS DE FORMA EXPRESSA NA CURVA DO PREVISION (42)

| PL                           | Pacote                                 | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | <b>VIGA SOLTEIRA</b>                   | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: viga, solteira). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS.                                                                    |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | <b>VIGA INVERTIDA</b>                  | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: viga, invertida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS.                                                                   |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | <b>PISO ARMADO - SETOR B</b>           | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 28 – MARCENARIA.                                                                |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | <b>PISO ARMADO - SETOR C</b>           | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 28 – MARCENARIA.                                                                |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | <b>PISO ARMADO - SETOR A</b>           | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 28 – MARCENARIA.                                                                |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | <b>EXECUÇÃO DE MURO</b>                | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: muro). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA.                                                                                               |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  | <b>DRENAGEM</b>                        | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: drenagem). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 25 – ELEVADORES.                                                                     |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  | <b>POÇO ARTESIANO</b>                  | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: poco, artesiano). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 25 – ELEVADORES.                                                                                                       |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  | <b>GÁS</b>                             | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: gas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.                                                                                |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  | <b>SHAFT INTERNO INST. HIDRÁULICAS</b> | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: shaft). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 28 – MARCENARIA.                                                                                                                 |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  | <b>RAMAL DE ENTRADA - COPASA</b>       | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: ramal, entrada, copasa). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.                                                                                     |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  | <b>LIGAÇÃO COPASA</b>                  | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: ligacao, copasa). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 05 – LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET; 34 – LOUÇAS E METAIS; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA. |
| ALVENARIA                    | <b>ESTUQUE - SETOR B</b>               | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: estuque). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS.                                                                                                                               |
| ALVENARIA                    | <b>ESTUQUE - SETOR C</b>               | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: estuque). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS.                                                                                                                               |
| ALVENARIA                    | <b>ESTUQUE - SETOR A</b>               | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: estuque). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS.                                                                                                                               |
| ALVENARIA                    | <b>TRATAMENTO DE SHAFTS</b>            | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: tratamento, shafts). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO.                                                              |
| ALVENARIA                    | <b>TRATAMENTO ACÚSTICO</b>             | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: tratamento, acustico). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO.                                                            |

| PL                        | Pacote                                         | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     | <b>INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 1º QUADRANTE</b> | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: enterrada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                                                    |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     | <b>INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 2º QUADRANTE</b> | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: enterrada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                                                    |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     | <b>INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 3º QUADRANTE</b> | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: enterrada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                                                    |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     | <b>DISJUNTORES / MIOLOS</b>                    | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: disjuntores, miolos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                                          |
| JARDINEIRAS E PAISAGISMO  | <b>CAMINHO DO CLIENTE</b>                      | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: caminho, cliente). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 08 – FRETES E TRANSPORTES; 14 – TERRAPLENAGEM; 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA.                      |
| JARDINEIRAS E PAISAGISMO  | <b>SISTEMA DE IRRIGAÇÃO</b>                    | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: sistema). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.                 |
| JARDINEIRAS E PAISAGISMO  | <b>QUADRA DE TÊNIS E POLIESPORTIVA</b>         | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: quadra, tenis, poliesportiva). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |
| JARDINEIRAS E PAISAGISMO  | <b>PASSEIO</b>                                 | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: passeio). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 31 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.                                                                    |
| SEM PL (gestão / entrega) | <b>ÁREA DE VIVÊNCIA</b>                        | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEM PL (gestão / entrega) | <b>ÁREA DE VIVÊNCIA + SALAS DE JOGOS</b>       | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEM PL (gestão / entrega) | <b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>                      | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEM PL (gestão / entrega) | <b>CHECKLIST</b>                               | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEM PL (gestão / entrega) | <b>ENXOVAL</b>                                 | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEM PL (gestão / entrega) | <b>MANUAL DE USO E OPERAÇÃO</b>                | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEM PL (gestão / entrega) | <b>HABITE-SE</b>                               | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEM PL (gestão / entrega) | <b>AVCB</b>                                    | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEM PL (gestão / entrega) | <b>ENTREGA OBRA / CONDOMÍNIO</b>               | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                                 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO         | <b>DRENO + ATERRO JARDINEIRAS</b>              | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO (termo sem correspondência: dreno, aterro, jardineiras). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                                       |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS     | <b>VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO</b>                   | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: ventilacao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.                                                                        |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS     | <b>CFTV</b>                                    | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: cftv). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.                                                                                |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS     | <b>EQUIPAMENTOS</b>                            | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: equipamentos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 10 – MÃO DE OBRA PRÓPRIA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 14 – TERRAPLENAGEM.                     |

| PL                           | Pacote                                 | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS        | <b>CARREGADOR VEICULAR / PORTA BOX</b> | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: carregador, veicular, porta). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.                                            |
| INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO | <b>ACABAMENTOS INCÊNDIO</b>            | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO (termo sem correspondência: acabamentos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 10 – MÃO DE OBRA PRÓPRIA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.    |
| ESQUADRIAS                   | <b>ESPALA ESQUADRIA DE ALUMINIO</b>    | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 26 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: espala). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES; 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA.                               |
| PINTURA                      | <b>MASSA CORRIDA</b>                   | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: massa, corrida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS; 30 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES. |

Fonte: aba CRONOGRAMA.ATIVIDADES (export do Prevision). Datas de início e término e % realizado vêm do Prevision; nos níveis PL e pacote o % é a média dos itens ponderada pela duração. O cronograma é o mesmo nos três cenários (os cenários mudam as curvas financeiras, não as datas das atividades).
