

BOTÂNICO · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Agosto/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: padrão (curvas digitadas) · R\$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL

R\$ 160,4 mi

orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE

R\$ 21,3 mi

13,3% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027

R\$ 47,6 mi

realizado + previsto

SALDO A REALIZAR

R\$ 139,1 mi

após a data de corte

CONFERÊNCIA


✓ Tudo OK

detalhes abaixo


REALIZADO (ATUAL)					COMPOSIÇÃO DO ANO	
Setembro/2026						
Ano	Anual R\$	Acumulado R\$	Anual %	Acumulado %	Realizado R\$	A realizar R\$
2024	R\$ 1.055.724,07	R\$ 1.055.724,07	0,66%	0,66%	R\$ 1.055.724,07	-
2025	R\$ 7.679.641,61	R\$ 8.735.365,68	4,79%	5,45%	R\$ 7.679.641,61	-
2026	R\$ 25.567.560,42	R\$ 34.302.926,10	15,94%	21,38%	R\$ 12.548.975,13	R\$ 13.018.585,28
2027	R\$ 47.604.449,83	R\$ 81.907.375,93	29,67%	51,06%	-	R\$ 47.604.449,83
2028	R\$ 66.701.794,01	R\$ 148.609.169,93	41,58%	92,64%	-	R\$ 66.701.794,01
2029	R\$ 11.811.809,47	R\$ 160.420.979,40	7,36%	100,00%	-	R\$ 11.811.809,47
2030	-	R\$ 160.420.979,40	0,00%	100,00%	-	-
TOTAL	R\$ 160.420.979,40		100,00%		R\$ 21.284.340,81	R\$ 139.136.638,59

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

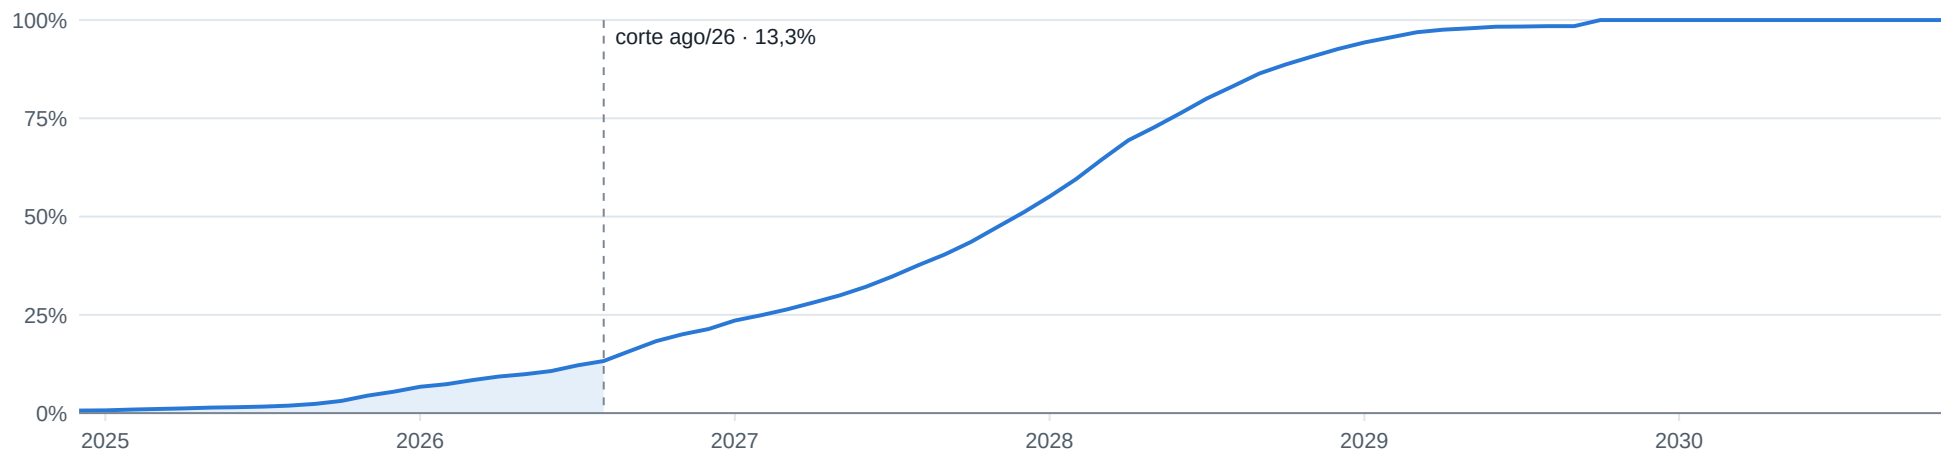

DESEMBOLSO ANUAL (R\$ MILHÕES)

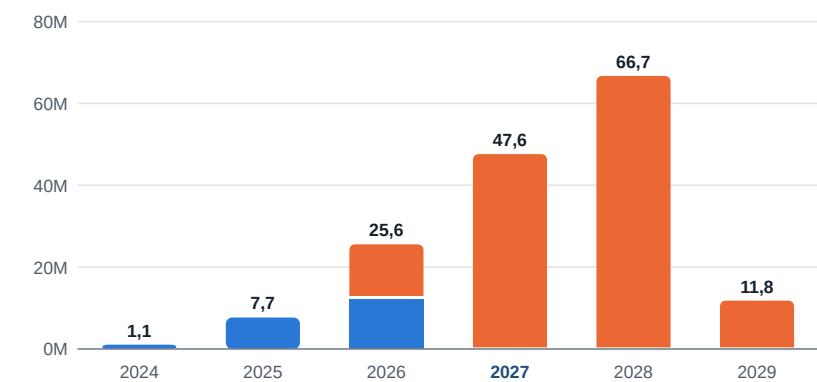

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

Grupo	R\$	% do ano	Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)	R\$ 9.868.861,03	20,7%	57,8%
Infraestrutura (12 a 16)	R\$ 1.296.311,29	2,7%	98,2%
Estrutura (17)	R\$ 16.405.808,44	34,5%	97,4%
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)	R\$ 11.338.654,26	23,8%	32,0%
Acabamentos (25 a 37)	R\$ 8.694.814,82	18,3%	18,9%
Taxa de administração	R\$ 0,00	0,0%	
TOTAL	R\$ 47.604.449,83	100,0%	

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.
