

ED JARDIM · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Setembro/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: Prevision · R\$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL

R\$ 154,7 mi

orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE

R\$ 45,9 mi

29,7% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027

R\$ 65,5 mi

realizado + previsto

SALDO A REALIZAR

R\$ 108,8 mi

após a data de corte

CONFERÊNCIA


✓ Tudo OK

detalhes abaixo


REALIZADO (ATUAL) Outubro/2026					COMPOSIÇÃO DO ANO	
Ano	Anual R\$	Acumulado R\$	Anual %	Acumulado %	Realizado R\$	A realizar R\$
2024	R\$ 5.778.713,93	R\$ 5.778.713,93	3,74%	3,74%	R\$ 5.778.713,93	-
2025	R\$ 18.489.705,84	R\$ 24.268.419,77	11,95%	15,69%	R\$ 18.489.705,84	-
2026	R\$ 34.540.878,18	R\$ 58.809.297,95	22,33%	38,01%	R\$ 21.604.582,49	R\$ 12.936.295,69
2027	R\$ 65.543.349,75	R\$ 124.352.647,70	42,37%	80,38%	-	R\$ 65.543.349,75
2028	R\$ 26.566.515,93	R\$ 150.919.163,63	17,17%	97,55%	-	R\$ 26.566.515,93
2029	R\$ 1.061.066,01	R\$ 151.980.229,64	0,69%	98,24%	-	R\$ 1.061.066,01
2030	R\$ 2.725.430,97	R\$ 154.705.660,62	1,76%	100,00%	-	R\$ 2.725.430,97
TOTAL	R\$ 154.705.660,62		100,00%		R\$ 45.873.002,26	R\$ 108.832.658,36

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

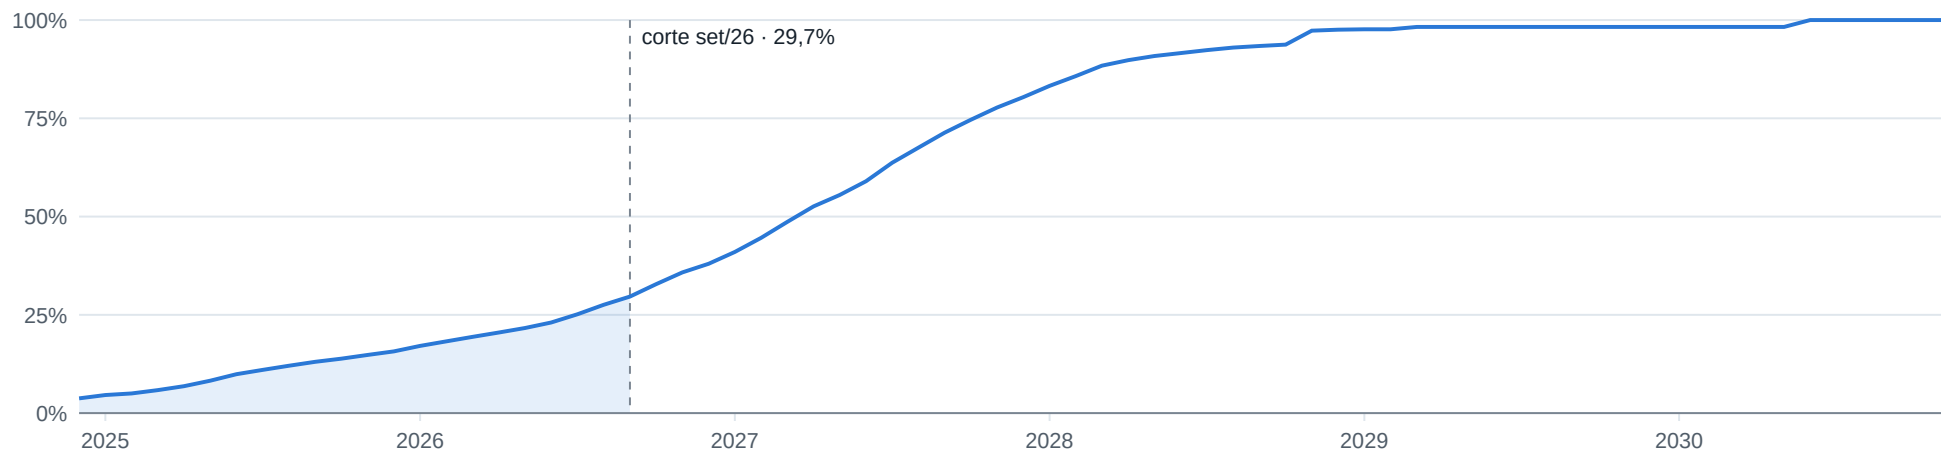

DESEMBOLSO ANUAL (R\$ MILHÕES)

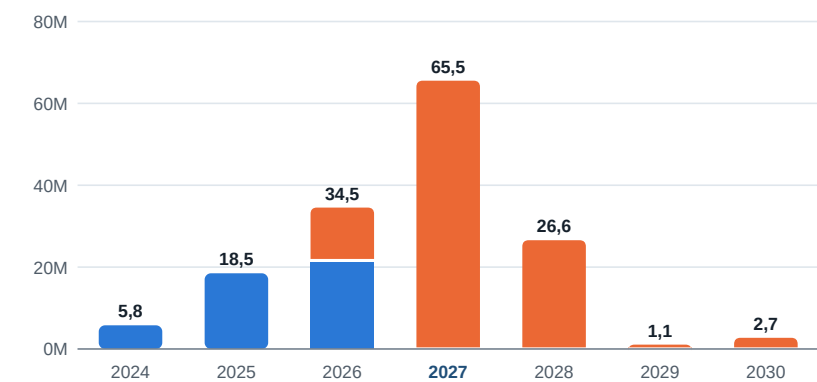

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

Grupo	R\$	% do ano	Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)	R\$ 7.760.211,17	11,8%	84,8%
Infraestrutura (12 a 16)	R\$ 900.096,70	1,4%	100,0%
Estrutura (17)	R\$ 4.055.322,09	6,2%	98,9%
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)	R\$ 18.564.351,22	28,3%	82,7%
Acabamentos (25 a 37)	R\$ 34.263.368,58	52,3%	68,9%
Taxa de administração	R\$ 0,00	0,0%	
TOTAL	R\$ 65.543.349,75	100,0%	

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.
