

TORRE CATHARINA · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Agosto/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: padrão (curvas digitadas) · R\$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL

R\$ 183,7 mi

orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE

R\$ 44,4 mi

24,2% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027

R\$ 60,2 mi

realizado + previsto

SALDO A REALIZAR

R\$ 139,2 mi

após a data de corte

CONFERÊNCIA


✓ Tudo OK

detalhes abaixo


REALIZADO (ATUAL)					COMPOSIÇÃO DO ANO	
Setembro/2026						
Ano	Anual R\$	Acumulado R\$	Anual %	Acumulado %	Realizado R\$	A realizar R\$
2024	R\$ 3.987.357,38	R\$ 3.987.357,38	2,17%	2,17%	R\$ 3.987.357,38	-
2025	R\$ 21.526.348,38	R\$ 25.513.705,76	11,72%	13,89%	R\$ 21.526.348,38	-
2026	R\$ 36.400.334,35	R\$ 61.914.040,11	19,82%	33,71%	R\$ 18.898.795,42	R\$ 17.501.538,93
2027	R\$ 60.192.057,24	R\$ 122.106.097,35	32,78%	66,49%	-	R\$ 60.192.057,24
2028	R\$ 49.348.547,46	R\$ 171.454.644,80	26,87%	93,36%	-	R\$ 49.348.547,46
2029	R\$ 7.739.338,28	R\$ 179.193.983,09	4,21%	97,57%	-	R\$ 7.739.338,28
2030	R\$ 4.457.955,27	R\$ 183.651.938,36	2,43%	100,00%	-	R\$ 4.457.955,27
TOTAL	R\$ 183.651.938,36		100,00%		R\$ 44.412.501,18	R\$ 139.239.437,18

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

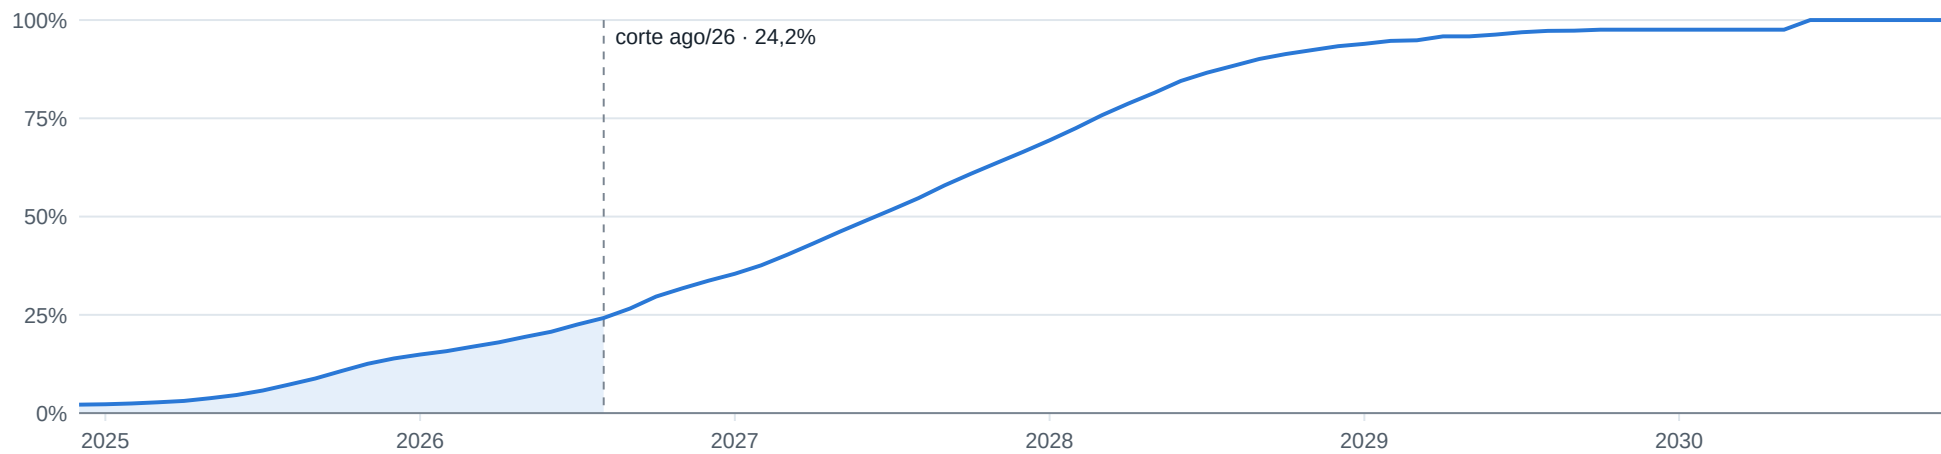

DESEMBOLSO ANUAL (R\$ MILHÕES)

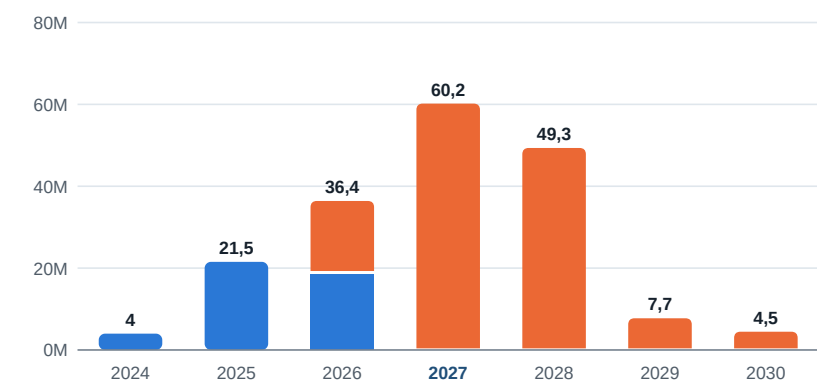

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

Grupo	R\$	% do ano	Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)	R\$ 8.794.288,20	14,6%	67,6%
Infraestrutura (12 a 16)	R\$ 244.926,37	0,4%	99,9%
Estrutura (17)	R\$ 5.545.864,61	9,2%	95,7%
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)	R\$ 21.223.967,34	35,3%	64,1%
Acabamentos (25 a 37)	R\$ 19.271.003,24	32,0%	46,6%
Taxa de administração	R\$ 5.112.007,48	8,5%	
TOTAL	R\$ 60.192.057,24	100,0%	

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.

TORRE CATHARINA · RETRATO DE 2027

Execução física (Prevision), desembolso do ano (fluxo financeiro) e situação da obra em 31/12/2027 · Corte: ago/2026 · Cenário: padrão

DESEMBOLSO NO ANO (R\$ NOMINAL) R\$ 60,2 mi com taxa de administração	DESEMBOLSO NO ANO (INCC) 46.413 pts pontos de índice	EM R\$ DO INCC SELECIONADO R\$ 60,2 mi INCC × índice do mês escolhido	EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO 74,6% itens diretos, ponderado pela projeção	AVANÇO FINANCEIRO 70,2% acumulado no fim do ano	MAIOR DESEMBOLSO DO ANO REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO R\$ 6.3 mi no ano
--	---	--	--	--	--

PLS EM 2027 — EXECUÇÃO FÍSICA, DESEMBOLSO E SITUAÇÃO EM 31/12/2027

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R\$ nominal	Desembolso INCC	R\$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
01	PROJETOS	—		R\$ 3.946	3	R\$ 3.946	0,0%	99,9%	
02	SEGUROS	—		R\$ 26.891	21	R\$ 26.891	0,0%	83,8%	
03	TAXAS DIVERSAS	—		R\$ 3.093	2	R\$ 3.093	0,0%	7,8%	
04	BARRACAO DE OBRA	—		R\$ 118.715	92	R\$ 118.715	0,2%	97,6%	Concluído (todas as 18 atividades)
05	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA, TELEFONIA, ESGOTO	—		R\$ 16.306	13	R\$ 16.306	0,0%	81,0%	
06	CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.	—		R\$ 205.133	158	R\$ 205.133	0,3%	65,0%	
07	DIVERSOS	—		R\$ 63.550	49	R\$ 63.550	0,1%	69,8%	
08	TRANSPORTES	—		R\$ 367.253	283	R\$ 367.253	0,6%	65,9%	
09	CONSULTORIAS (OBRAS)	—		R\$ 206.686	159	R\$ 206.686	0,3%	71,5%	
10	MÃO DE OBRA PRÓPRIA	—		R\$ 5.677.980	4.378	R\$ 5.677.980	9,4%	62,0%	
11	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	—		R\$ 2.104.735	1.623	R\$ 2.104.735	3,5%	63,7%	
01 a 11	INDIRETOS	—		R\$ 8.794.288	6.781	R\$ 8.794.288	14,6%	67,6%	
12	SERVIÇOS INICIAIS	100,0%	100,0%	R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 4 atividades)
13	CONTENÇÃO	100,0%	100,0%	R\$ 29.293	23	R\$ 29.293	0,0%	99,9%	Concluído (todas as 257 atividades)
14	TERRAPLENAGEM	100,0%	100,0%	R\$ 3.625	3	R\$ 3.625	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 4 atividades)
15	FUNDAÇÃO PROFUNDA	100,0%	100,0%	R\$ 12.016	9	R\$ 12.016	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 178 atividades)
16	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	100,0%	98,9%	R\$ 199.993	154	R\$ 199.993	0,3%	99,7%	Concluído (todas as 133 atividades)
12 a 16	SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES	100,0%	99,8%	R\$ 244.926	189	R\$ 244.926	0,4%	99,9%	
17	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	100,0%	53,4%	R\$ 5.545.865	4.276	R\$ 5.545.865	9,2%	95,7%	Concluído (todas as 1192 atividades)
18	ALVENARIA	97,0%	6,3%	R\$ 3.782.332	2.916	R\$ 3.782.332	6,3%	82,5%	Alvenaria: concluído / Encunhamento: concluído / Montantes do drywall: até 29º pav. (restam serviços no 2º pav.) / Drywall 1ª face: concluído / Drywall 2ª face: concluído / Drywall: até 3º pav. (restam serviços no 2º pav.)
19	IMPERMEABILIZAÇÃO	80,0%	0,0%	R\$ 2.182.308	1.683	R\$ 2.182.308	3,6%	56,8%	Impermeabilização: até 29º pav.
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	66,5%	0,0%	R\$ 5.720.021	4.411	R\$ 5.720.021	9,5%	58,4%	Inst. elétricas: até 3º pav. (restam serviços no 1º pav.) / Prumada elétrica (infra): até 29º pav. / Inst. embutidas na alvenaria: concluído / Distribuição elétrica / quadro: concluído / Acabamentos elétricos: até 2º pav. (restam serviços no 3º subsolo) / Fiação elétrica e iluminação: até 26º pav., executando

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R\$ nominal	Desembolso INCC	R\$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
									27º pav. / Prumada elétrica (cabos): até 26º pav., executando 27º pav. / Fiação elétrica: até 2º pav. (restam serviços no 5º subsolo)
21	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	91,3%	0,4%	R\$ 4.399.226	3.392	R\$ 4.399.226	7,3%	69,0%	Inst. hidráulicas: até 1º subsolo, executando 1º pav. / Prumada hidrossanitária: concluído / Gás piso: concluído / Distribuição hidrossanitária: concluído / Gás parede: concluído / Rede hidrossanitária: concluído
22	INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	70,6%	0,0%	R\$ 711.103	548	R\$ 711.103	1,2%	100,0%	Prumada de incêndio: concluído / Inst. incêndio: até 2º pav. (restam serviços no 2º pav.)
23	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	74,4%	0,0%	R\$ 1.490.043	1.149	R\$ 1.490.043	2,5%	39,9%	Inst. especiais: concluído / Infra de ar condicionado: até 29º pav. (restam serviços no 2º pav.) / Comunicação e alarme: até 1º pav. (restam serviços no 1º subsolo)
24	ELEVADORES	45,0%	0,0%	R\$ 2.938.934	2.266	R\$ 2.938.934	4,9%	65,2%	Elevadores social - 01: concluído / Elevadores social - 02: concluído
25	ESQUADRIAS	17,9%	0,0%	R\$ 4.372.612	3.372	R\$ 4.372.612	7,3%	37,7%	Contramarco: até 29º pav. (restam serviços no 3º pav.) / Esquadria de alumínio: até 2º pav. (restam serviços no 2º pav.) / Esquadrias de alumínio: até 4º pav., executando 5º pav.
26	SERRALHERIA	13,5%	0,0%	R\$ 517.787	399	R\$ 517.787	0,9%	80,4%	PCF (marco): concluído / PCF (folhas): até 1º subsolo / Pontos de ancoragem inox: concluído / Guarda- corpo: até 2º pav.
27	MARCNARIA	22,8%	0,0%	R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	0,0%	Marcenaria: até 1º pav.
28	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	95,3%	0,2%	R\$ 993.161	766	R\$ 993.161	1,6%	100,0%	Contrapiso: até 29º pav.
29	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	99,3%	5,8%	R\$ 1.764.105	1.360	R\$ 1.764.105	2,9%	88,7%	Reboco interno: até 29º pav. (restam serviços no 3º pav.) / Taliscamento: concluído
30	REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	65,9%	0,0%	R\$ 6.265.605	4.831	R\$ 6.265.605	10,4%	70,5%	Revestimentos porcelanato piso: até 28º pav., executando 29º pav. / Revestimento porcelanato parede: até 29º pav. / Bancadas: até 27º pav., executando 28º pav. / Piso vinílico / laminado: em execução (4º pav.)
31	PAVIMENTAÇÃO	100,0%	0,0%	R\$ 168.760	130	R\$ 168.760	0,3%	50,0%	Passeios: concluído / Pintura de demarcação de vagas: até 1º subsolo (restam serviços no 2º subsolo)
32	REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	49,4%	3,0%	R\$ 2.881.803	2.222	R\$ 2.881.803	4,8%	48,2%	Reboco externo (fachada lateral chopp da fábrica): concluído / Reboco externo (fachada fundo chopp da fábrica): concluído / Reboco plano de ação fachada concordia: concluído / Plano de ação reboco fachada olympus: concluído / Textura: até 1º subsolo / Reboco de fachada - fase 1: 18 de 20 concluídas / Pintura espala fechada - fase 1: 3 de 4 concluídas / Reboco de fachada - fase 2: 6 de 20 concluídas / Pintura espala fechada - fase 2: 2 de 4 concluídas / Granito fachada: 1 de 4 concluídas / Pintura/textura da fachada: em execução / Reboco externo: em execução
33	FORRO	70,3%	0,0%	R\$ 807.227	622	R\$ 807.227	1,3%	46,2%	Forro: até 25º pav., executando 26º pav.
34	LOUÇAS SANITÁRIAS	1,3%	0,0%	R\$ 381.321	294	R\$ 381.321	0,6%	18,1%	Louças: até 2º subsolo

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R\$ nominal	Desembolso INCC	R\$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
35	PINTURA	44,4%	11,0%	R\$ 1.118.621	863	R\$ 1.118.621	1,9%	33,2%	Pintura: até 1º subsolo (restam serviços no 4º subsolo) / Massa corrida: até 24º pav., executando 25º pav. / Pintura 1ª demão: até 23º pav., executando 24º pav. / Pintura 2ª demão: até 2º pav. / Pintura 3ª demão: até 2º pav.
36	PAISAGISMO	7,5%	0,0%	R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	0,0%	Paisagismo: em execução (3º pav.)
37	LIMPEZA FINAL DE OBRA	12,2%	0,0%	R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	0,0%	Limpeza fina: até 2º pav. / Limpeza grossa: até 2º pav. (restam serviços no 4º subsolo)
DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração)				R\$ 55.080.050	42.471	R\$ 55.080.050	91,5%		
38	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	—		R\$ 5.112.007	3.942	R\$ 5.112.007	8,5%		
DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				R\$ 60.192.057	46.413	R\$ 60.192.057	100,0%		

Execução física = % "Previsto" acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision em dezembro; no corte = % "Realizado". Situação em 31/12 = atividades do cronograma de atividades concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.

Torre Catharina · Gantt do cronograma

4.059 atividades do Prevision (situação em 28/09/26) · PL → pacote de trabalho → pavimento/tarefa · clique na seta para abrir



PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2025			2026			2027				2028				2029		
				abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul		out	jan
▶ PRIMEIRA PRAÇA DE TRABALHO - TUBUL... ⓘ	15/04/25	11/06/25	100%																	
▶ FUNDAÇÕES PROFUNDAS - GERAL	24/04/25	12/09/25	100%																	
▶ FUNDAÇÕES ACESSO FRONTAL	28/04/25	09/05/25	100%																	
▶ FUNDAÇÕES PRIMEIRA PRAÇA DE TRABALHO	12/05/25	21/05/25	100%																	
▶ FUNDAÇÕES SEGUNDA PRAÇA DE TRABALHO	27/05/25	02/07/25	100%																	
▶ FUNDAÇÕES CHOPP DA FÁBRICA	09/06/25	17/06/25	100%																	
▶ FUNDAÇÕES 1125 PRÉDIO	18/07/25	05/09/25	100%																	
▶ ÚLTIMA FASE DE FUNDAÇÕES - PRÉDIO	21/08/25	12/09/25	100%																	
▼ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	12/05/25	03/08/26	100%																	
▶ BLOCOS E CINTAS - PERIFERIA ALAMEDA	12/05/25	02/09/25	100%																	
▶ BLOCOS E CINTAS - MEDIÇÃO	16/05/25	12/05/26	100%																	
▶ BLOCOS E CINTAS - TORRE	30/07/25	14/11/25	100%																	
▶ BLOCOS E CINTAS - LOOKAHEAD	11/03/26	03/08/26	100%																	
▼ SERVIÇOS INICIAIS	12/05/25	30/05/25	100%																	
▶ SERVIÇOS INICIAIS - ADEQUAÇÃO PARA INÍCI...	12/05/25	30/05/25	100%																	
▼ ESTRUTURA EM CONCRETO ARMA... ⓘ 16 inferidos	04/06/25	13/07/27	79%																	
▶ ESTRUTURA - AFASTAMENTO FRONTAL - MED...	04/06/25	14/07/25	100%																	
▶ ESTRUTURA - PROJEÇÃO ALAMEDA - MEDIÇÃO	04/08/25	19/10/26	84%																	
▶ ESTRUTURA - PROJEÇÃO ALAMEDA (2º ETAP...	17/09/25	13/11/25	100%																	
▶ ESTRUTURA - PROJEÇÃO CONCORDIA - MEDI...	21/10/25	30/09/26	93%																	
▶ ESTRUTURA TORRE - MEDIÇÃO	10/11/25	13/07/27	52%																	
▶ ESTRUTURA ALAMEDA - LOOKAHEAD	19/11/25	09/10/26	69%																	
▶ ESTRUTURA - PROJEÇÃO OLYMPUS - MEDIÇÃO	24/11/25	11/12/26	77%																	
▶ ESTRUTURA TORRE - LOOKAHEAD	26/11/25	18/09/26	100%																	
▶ OBRA CIVIL CÂMARA ⓘ	10/12/25	05/01/26	100%																	
▶ ESTRUTURA OLYMPUS - LOOKAHEAD	05/01/26	16/12/26	65%																	
▶ ESTRUTURA TORRE - ESCADA	07/01/26	15/07/26	100%																	
▶ ESTRUTURA - TRIPINHA - LOOKAHEAD	07/01/26	01/07/26	100%																	
▶ ESTRUTURA CONCORDIA - LOOKAHEAD	19/01/26	19/08/26	100%																	
▶ RESERVATÓRIO - LOOKAHEAD ⓘ	02/02/26	02/03/26	100%																	

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2025			2026			2027				2028				2029		
				abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul		out	jan
▶ ESTRUTURA - ESCADA DA TORRE	03/03/26	23/06/26	100%																	
▶ ESTRUTURA LOOKAHEAD TAMPAS RESERVATÓRIAS	03/03/26	06/03/26	100%																	
▶ ESTRUTURA RAMPA 6° AO 5° SUBSOLO	30/03/26	16/04/26	100%																	
▶ RAMPA PROJEÇÃO DA TORRE LOOKAHEAD ⓘ	10/04/26	22/04/26	100%																	
▶ PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO CONCORDIA ⓘ	16/04/26	01/06/26	100%																	
▶ ESTRUTURA PROJEÇÃO RAMPA OLIMPUS	20/04/26	14/10/26	68%																	
▶ ESTRUTURA TORRE LOOKAHEAD	04/05/26	27/05/26	100%																	
▶ PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO TORRE LOOKAHEAD ⓘ	11/05/26	03/07/26	100%																	
▶ VIGA DE FECHAMENTO LATERAL CHOPP ⓘ	18/05/26	22/05/26	100%																	
▶ ESTRUTURA - OLIMPUS LOOKAHEAD	21/05/26	15/06/26	100%																	
▶ ESTRUTURA - CONCORDIA LOOKAHEAD	25/05/26	30/09/26	68%																	
▶ VIGA DE TRAVAMENTO VM1/VM2 LOOKAHEAD ⓘ	28/05/26	08/06/26	100%																	
▶ PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS ⓘ	02/06/26	21/08/26	100%																	
▶ PISO EM CONCRETO E INSTALAÇÕES CHOPP ⓘ	02/06/26	03/07/26	100%																	
▶ ESTRUTURA TORRE INTERMEDIÁRIO 3 LOOKAHEAD	02/06/26	10/06/26	100%																	
▶ VIGAS DA LAJE DE SOLIDARIZAÇÃO DO 1° PACOTE	08/06/26	18/06/26	100%																	
▶ PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS ⓘ	09/06/26	15/07/26	100%																	
▶ LAJE CONTRAPISO - PISO ARMADO ⓘ	10/06/26	30/09/26	95%																	
▶ TRIPÃO 2° ETAPA ESTRUTURA LOOKAHEAD ⓘ	30/06/26	15/07/26	100%																	
▶ RAMPA DE VEÍCULOS - 5° AO 6° SS. (TERRAPLENAGEM) ⓘ	14/09/26	04/11/26	3%																	
▶ ESTRUTURA DA RAMPA ALAMEDA LOOKAHEAD	13/10/26	13/11/26	0%																	
▶ RESERVATÓRIO OLYMPUS INTER 4 LOOKAHEAD ⓘ	23/10/26	06/11/26	0%																	
▶ LAJE DE COBERTURA DO PILOTIS (CONCORDIA) ⓘ	17/12/26	20/01/27	0%																	
▶ LAJE COBERTURA PILOTIS (OLYMPUS) ⓘ	17/12/26	20/01/27	0%																	
▼ TERRAPLENAGEM	07/07/25	13/08/26	100%																	
▶ TERRAPLENAGEM - LIBERAÇÃO DOS TIRANTES	07/07/25	11/07/25	100%																	
▶ TERRAPLENAGEM GERAL	16/07/25	13/08/26	100%																	
▶ TERRAPLENAGEM - PÓS TIRANTE	12/09/25	18/09/25	100%																	
▶ RETIRADA/ESCAVAÇÃO DO TALUDE DA CONTORNAÇÃO	08/04/26	10/04/26	100%																	
▼ PINTURA ⓘ inferido	24/04/26	06/12/28	9%																	

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2025			2026			2027				2028				2029	
				abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan
▶ TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE	24/04/26	28/09/27	55%																
▶ PINTURA	24/02/27	07/11/28	0%																
▶ MASSA CORRIDA ⓘ	23/03/27	23/08/28	0%																
▶ PINTURA 1º DEMÃO	03/05/27	01/09/28	0%																
▶ PINTURA 2º DEMÃO	09/07/27	14/11/28	0%																
▶ PINTURA 3º DEMÃO	19/08/27	06/12/28	0%																
▼ ALVENARIA ⓘ 4 inferidos	27/04/26	13/12/28	6%																
▶ ALVENARIA	27/04/26	25/11/27	19%																
▶ ALVENARIA FACHADA LATERAL CHOPP DA FÁ...	14/08/26	11/09/26	100%																
▶ ALVENARIA FACHADA FUNDOS CHOPP DA FÁ...	04/09/26	02/10/26	80%																
▶ PLANO DE AÇÃO ALVENARIA FACHADA ACÁCIA	01/10/26	13/11/26	0%																
▶ ENCUNHAMENTO	09/10/26	23/08/27	0%																
▶ ALVENARIA PLANO DE AÇÃO FACHADA CONC...	22/10/26	12/11/26	0%																
▶ PLANO DE AÇÃO ALVENARIA FACHADA OLYM...	26/10/26	24/11/26	0%																
▶ MONTANTES DO DRYWALL ⓘ	15/12/26	13/01/28	0%																
▶ DRYWALL 1º FACE ⓘ	06/01/27	11/11/27	0%																
▶ DRYWALL 2º FACE ⓘ	28/01/27	13/12/27	0%																
▶ DRYWALL ⓘ	26/02/27	20/04/28	0%																
▶ EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE MURO	01/08/28	13/12/28	0%																
▼ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ⓘ 3 inferidos	26/05/26	27/11/28	4%																
▶ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS(INFR...	26/05/26	30/10/26	92%																
▶ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	03/09/26	18/09/28	5%																
▶ PRUMADA ELÉTRICA (INFRA)	07/10/26	24/01/28	0%																
▶ INSTALAÇÕES EMBUTIDAS NA ALVENARIA ⓘ	20/10/26	14/09/27	0%																
▶ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO	18/01/27	26/11/27	0%																
▶ ACABAMENTOS ELÉTRICOS	03/03/27	27/11/28	0%																
▶ FIAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	30/03/27	31/07/28	0%																
▶ PRUMADA ELÉTRICA (CABOS)	30/03/27	01/08/28	0%																
▶ INFRA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS	14/04/27	20/03/28	0%																
▶ FIAÇÃO ELÉTRICA	20/05/27	26/05/28	0%																

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2025			2026			2027			2028				2029			
				abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	
▶ GERADOR	31/08/27	14/09/27	0%								28/09/26					31/12/27				
▶ OBRA CIVIL SUBESTAÇÃO/TRANSFORMA... ⓘ	22/12/27	10/04/28	0%																	
▶ DISJUNTORES / MIOLOS ⓘ	27/01/28	24/10/28	0%																	
▶ ENTRADA DE ENERGIA	04/02/28	10/04/28	0%																	
▶ SUBESTAÇÃO	11/04/28	23/05/28	0%																	
▼ INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (7 inferidos)	08/06/26	24/10/28	6%																	
▶ INFRA DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	08/06/26	20/03/28	9%																	
▶ INFRA HIDROSSANITÁRIA - CHOPP DA FÁBRICA	06/07/26	17/07/26	100%																	
▶ INFRA HIDRÁULICA PAREDES	10/08/26	30/10/26	87%																	
▶ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12/08/26	22/08/28	14%																	
▶ EXECUÇÃO DA ESCADA HIDRÁULICA LAT... ⓘ	14/09/26	02/10/26	0%																	
▶ DRENAGEM PLUVIAL TALUDES ⓘ	28/09/26	01/12/26	0%																	
▶ PRUMADA HIDROSSANITÁRIA	07/10/26	22/11/27	0%																	
▶ GÁS PISO ⓘ	24/11/26	06/10/27	0%																	
▶ DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA	18/01/27	30/11/27	0%																	
▶ GÁS PAREDE ⓘ	18/01/27	24/11/27	0%																	
▶ REDE HIDROSSANITÁRIA	18/01/27	24/11/27	0%																	
▶ GÁS ⓘ	01/03/27	26/11/27	0%																	
▶ SHAFT INTERNO INST. HIDRÁULICAS ⓘ	17/03/27	13/12/27	0%																	
▶ AQUECIMENTO SOLAR ⓘ	04/08/28	24/10/28	0%																	
▶ RESERVATÓRIOS / BOILERS	07/08/28	04/09/28	0%																	
▼ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	06/07/26	16/03/28	2%																	
▶ REBOCO INTERNO	06/07/26	16/03/28	3%																	
▶ TALISCAMENTO	20/10/26	30/08/27	0%																	
▼ BARRACAO DE OBRA (1 inferido)	08/07/26	04/09/26	100%																	
▶ EXECUÇÃO DO CANTEIRO (ENGENHARIA)	08/07/26	31/08/26	100%																	
▶ MUDANÇA DO ALMOXARIFADO ⓘ	22/07/26	05/08/26	100%																	
▶ EXECUÇÃO DO CANTEIRO (REFEITÓRIO)	06/08/26	04/09/26	100%																	
▼ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	16/07/26	10/04/28	2%																	
▶ CONTRAPISO	16/07/26	10/04/28	2%																	

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2025			2026			2027			2028				2029			
				abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr		jul	out	
▼ IMPERMEABILIZAÇÃO	21/08/26	14/06/28	2%																	
▶ IMPERMEABILIZAÇÃO CORTINA 1 E 2 LOOKA...	21/08/26	11/09/26	87%																	
▶ IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO PL...	28/09/26	14/10/26	0%																	
▶ IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA	26/10/26	14/06/28	0%																	
▶ IMPERMEABILIZAÇÃO	09/02/27	08/05/28	0%																	
▼ REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	01/09/26	27/11/28	1%																	
▶ POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO LOOKAH...	01/09/26	19/10/26	39%																	
▶ REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO	20/01/27	11/07/28	0%																	
▶ REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE	27/01/27	30/06/28	0%																	
▶ BANCADAS	17/03/27	20/07/28	0%																	
▶ REVESTIMENTO ACABAMENTO	02/07/27	03/08/28	0%																	
▶ POLIMENTO DE PISO	06/07/27	03/02/28	0%																	
▶ PISO ELEVADO	02/09/27	15/09/28	0%																	
▶ DECK	05/10/27	04/01/28	0%																	
▶ PISO VINÍLICO / LAMINADO	20/12/27	22/09/28	0%																	
▶ RODAPÉ MADEIRA / PVC	18/01/28	13/10/28	0%																	
▶ PISO EMBORRACHADO	10/11/28	27/11/28	0%																	
▼ INSTALAÇÕES ESPECIAIS	02/09/26	24/10/28	3%																	
▶ INSTALAÇÕES ESPECIAIS	02/09/26	27/10/27	11%																	
▶ INFRA DE AR CONDICIONADO	18/01/27	20/03/28	0%																	
▶ INFRA DE SISTEMAS - CFTV	14/04/27	20/03/28	0%																	
▶ COMUNICAÇÃO E ALARME	18/06/27	24/10/28	0%																	
▶ PISCINA	26/01/28	29/03/28	0%																	
▶ EQUIPAMENTOS	13/07/28	19/07/28	0%																	
▼ SERRALHERIA 1 inferido	08/09/26	14/09/28	0%																	
▶ INSTALAÇÃO DE PCF (MARCO)	08/09/26	17/09/27	0%																	
▶ INSTALAÇÃO DE PCF (FOLHAS)	26/08/27	09/08/28	0%																	
▶ PONTOS DE ANCORAGEM INOX i	14/09/27	04/10/27	0%																	
▶ GUARDA- CORPO	04/10/27	14/09/28	0%																	
▶ SERRALHERIA	31/07/28	21/08/28	0%																	

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2025			2026			2027				2028				2029	
				abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan
▼ SEM PL (gestão / entrega) 11 inferidos	14/09/26	19/01/29	0%																
▶ PLANO DE AÇÃO ENTREGA DO MEZANINO... i	14/09/26	19/10/26	8%																
▶ APARTAMENTO PROTÓTIPO 01 (52,54 m²) ... i	01/10/26	18/01/27	0%																
▶ APARTAMENTO PROTÓTIPO 06 (54,39 m²) i	01/10/26	15/01/27	0%																
▶ APARTAMENTO PROTÓTIPO 05 (85,07 m²) i	01/10/26	18/01/27	0%																
▶ CHECKLIST i	13/08/27	10/01/29	0%																
▶ VISTORIA APTOS i	07/04/28	19/01/29	0%																
ENXOVAL i	09/08/28	19/12/28	0%																
MANUAL DE USO E OPERAÇÃO i	11/08/28	09/10/28	0%																
AVCB i	14/08/28	10/10/28	0%																
HABITE-SE i	11/10/28	18/12/28	0%																
ENTREGA SÍNDICO i	05/12/28	18/01/29	0%																
▼ REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	28/09/26	03/10/28	0%																
▶ REBOCO EXTERNO (FACHADA LATERAL CHO...	28/09/26	29/10/26	0%																
▶ REBOCO EXTERNO (FACHADA FUNDO CHOPP...	05/10/26	09/11/26	0%																
▶ REBOCO PLANO DE AÇÃO FACHADA CONCO...	05/10/26	26/10/26	0%																
▶ PLANO DE AÇÃO REBOCO FACHADA ACÁCIA	19/10/26	01/12/26	0%																
▶ PLANO DE AÇÃO REBOCO FACHADA OLYMPUS	03/11/26	01/12/26	0%																
▶ TEXTURA	17/02/27	13/06/28	0%																
▶ REBOCO DE FACHADA - FASE 1	05/03/27	03/01/28	0%																
▶ PINTURA ESPALA FECHADA - FASE 1	10/05/27	13/01/28	0%																
▶ REBOCO DE FACHADA - FASE 2	21/06/27	20/07/28	0%																
▶ PINTURA ESPALA FECHADA - FASE 2	29/07/27	26/04/28	0%																
▶ GRANITO FACHADA	25/08/27	20/07/28	0%																
▶ PINTURA/TEXTURA DA FACHADA	13/12/27	03/10/28	0%																
▶ REBOCO EXTERNO	14/12/27	19/01/28	0%																
▼ INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	01/10/26	20/03/28	0%																
▶ PRUMADA DE INCÊNDIO	01/10/26	16/11/27	0%																
▶ INSTALAÇÕES INCÊNDIO	22/10/26	20/03/28	0%																
▼ ESQUADRIAS	29/10/26	06/10/28	0%																

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2025			2026			2027				2028				2029	
				abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan
▶ CONTRAMARCO	29/10/26	12/01/28	0%									28/09/26			31/12/27				
▶ ESQUADRIA DE ALUMINIO	10/02/27	07/08/28	0%																
▶ ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	28/09/27	06/10/28	0%																
▶ ESQUADRIA MADEIRA	07/01/28	03/10/28	0%																
▼ FORRO	03/02/27	10/08/28	0%																
▶ FORRO	03/02/27	10/08/28	0%																
▼ LOUÇAS SANITÁRIAS 1 inferido	03/03/27	27/11/28	0%																
▶ LOUÇAS	03/03/27	24/10/28	0%																
▶ METAIS i	09/02/28	27/11/28	0%																
▼ LIMPEZA FINAL DE OBRA	12/03/27	18/12/28	0%																
▶ LIMPEZA FINA	12/03/27	18/12/28	0%																
▶ LIMPEZA GROSSA	18/06/27	03/11/28	0%																
▼ PAVIMENTAÇÃO 2 inferidos	29/04/27	09/11/28	0%																
▶ PASSEIOS	29/04/27	22/12/27	0%																
▶ PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS i	18/10/27	22/05/28	0%																
▶ QUADRA i	04/08/28	09/11/28	0%																
▼ MARCENARIA	16/07/27	23/08/28	0%																
▶ MARCENARIA	16/07/27	23/08/28	0%																
▼ ELEVADORES	15/09/27	17/11/28	0%																
▶ ELEVADORES SOCIAL - 01	15/09/27	15/10/27	0%																
▶ ELEVADORES SOCIAL - 02	15/09/27	15/10/27	0%																
▶ ELEVADOR COMERCIAL - 01	25/05/28	26/06/28	0%																
▶ ELEVADOR COMERCIAL - 02	25/05/28	26/06/28	0%																
▶ ELEVADOR DE SERVIÇO	17/10/28	17/11/28	0%																
▶ ELEVADORES SOCIAL - 03	17/10/28	17/11/28	0%																
▼ PAISAGISMO	14/12/27	23/10/28	0%																
▶ PAISAGISMO	14/12/27	23/10/28	0%																

PACOTES NÃO DESCRITOS DE FORMA EXPRESSA NA CURVA DO PREVISION (48)

PL	Pacote	Nota
FUNDAÇÃO PROFUNDA	PRIMEIRA PRAÇA DE TRABALHO - TUBULÕES	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: tubulões). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO; 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 26 – SERRALHERIA.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	OBRA CIVIL CÂMARA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: civil, câmara). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	RESERVATÓRIO - LOOKAHEAD	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: reservatório). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	RAMPA PROJEÇÃO DA TORRE LOOKAHEAD	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: rampa, projecao, torre). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 31 – PAVIMENTAÇÃO.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO CONCORDIA LOOKAHEAD	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO TORRE LOOKAHEAD	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	VIGA DE FECHAMENTO LATERAL CHOPP DA FÁBRICA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: viga, fechamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	VIGA DE TRAVAMENTO VM1/VM2 LOOKAHEAD	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: viga, travamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS 2º ETAPA LOOKAHEAD	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	PISO EM CONCRETO E INSTALAÇÕES CHOPP DA FÁBRICA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS 1º ETAPA LOOKAHEAD	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	LAJE CONTRAPISO - PISO ARMADO	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: laje, contrapiso, piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 35 – PINTURA.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	TRIPÃO 2º ETAPA ESTRUTURA LOOKAHEAD	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: tripao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	RAMPA DE VEÍCULOS - 5º AO 6º SS. (TERRENO) LOOKAHEAD	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: veículos, terreno). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	RESERVATÓRIO OLYMPUS INTER 4 LOOKAHEAD	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: reservatório). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA.

PL	Pacote	Nota
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	LAJE DE COBERTURA DO PILOTIS (CONCÓRDIA)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: laje). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 35 – PINTURA.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	LAJE COBERTURA PILOTIS (OLYMPUS)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: laje). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 35 – PINTURA.
PINTURA	MASSA CORRIDA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURA (termo sem correspondência: massa, corrida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 28 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS.
ALVENARIA	MONTANTES DO DRYWALL	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: montantes, drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
ALVENARIA	DRYWALL 1º FACE	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 35 – PINTURA.
ALVENARIA	DRYWALL 2º FACE	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 35 – PINTURA.
ALVENARIA	DRYWALL	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 35 – PINTURA.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INSTALAÇÕES EMBUTIDAS NA ALVENARIA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: embutidas, alvenaria). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 27 – MARCENARIA; 34 – LOUÇAS SANITÁRIAS.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	OBRA CIVIL SUBESTAÇÃO/TRANSFORMADORES	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: civil, transformadores). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	DISJUNTORES / MIOLOS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: disjuntores, miolos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	EXECUÇÃO DA ESCADA HIDRÁULICA LATERAL CHOPP DA FÁBRICA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: escada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 25 – ESQUADRIAS; 26 – SERRALHERIA.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL TALUDES	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: drenagem, taludes). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	GÁS PISO	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: gás, piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	GÁS PAREDE	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: gás). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	GÁS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: gás). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	SHAFT INTERNO INST. HIDRÁULICAS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: shaft). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	AQUECIMENTO SOLAR	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: aquecimento, solar). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 25 – ESQUADRIAS.

PL	Pacote	Nota
BARRACAO DE OBRA	MUDANÇA DO ALMOXARIFADO	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 04 – BARRACAO DE OBRA (termo sem correspondência: mudança). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
SERRALHERIA	PONTOS DE ANCORAGEM INOX	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 26 – SERRALHERIA (termo sem correspondência: pontos, ancoragem, inox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.
SEM PL (gestão / entrega)	PLANO DE AÇÃO ENTREGA DO MEZANINO PARA ESTACIONAMENTO	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	APARTAMENTO PROTÓTIPO 01 (52,54 m²) LOOKAREAD	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	APARTAMENTO PROTÓTIPO 06 (54,39 m²)	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	APARTAMENTO PROTÓTIPO 05 (85,07 m²)	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	CHECKLIST	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	VISTORIA APTOS	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	ENXOVAL	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	MANUAL DE USO E OPERAÇÃO	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	AVCB	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	HABITE-SE	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	ENTREGA SÍNDICO	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
LOUÇAS SANITÁRIAS	METAIS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 34 – LOUÇAS SANITÁRIAS (termo sem correspondência: metais). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
PAVIMENTAÇÃO	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTAÇÃO (termo sem correspondência: pintura, demarcacao, vagas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
PAVIMENTAÇÃO	QUADRA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTAÇÃO (termo sem correspondência: quadra). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

Fonte: aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (export do Prevision). Datas de início e término e % realizado vêm do Prevision; nos níveis PL e pacote o % é a média dos itens ponderada pela duração. O cronograma é o mesmo nos três cenários (os cenários mudam as curvas financeiras, não as datas das atividades).
