

BOTÂNICO · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Agosto/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: Prevision · R\$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL

R\$ 160,4 mi

orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE

R\$ 21,3 mi

13,3% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027

R\$ 57,1 mi

realizado + previsto

SALDO A REALIZAR

R\$ 139,1 mi

após a data de corte

CONFERÊNCIA


✓ Tudo OK

detalhes abaixo


REALIZADO (ATUAL)					COMPOSIÇÃO DO ANO	
Setembro/2026						
Ano	Anual R\$	Acumulado R\$	Anual %	Acumulado %	Realizado R\$	A realizar R\$
2024	R\$ 1.055.724,07	R\$ 1.055.724,07	0,66%	0,66%	R\$ 1.055.724,07	-
2025	R\$ 7.679.641,61	R\$ 8.735.365,68	4,79%	5,45%	R\$ 7.679.641,61	-
2026	R\$ 24.409.808,86	R\$ 33.145.174,54	15,22%	20,66%	R\$ 12.548.975,13	R\$ 11.860.833,73
2027	R\$ 57.101.507,66	R\$ 90.246.682,20	35,59%	56,26%	-	R\$ 57.101.507,66
2028	R\$ 61.139.024,59	R\$ 151.385.706,78	38,11%	94,37%	-	R\$ 61.139.024,59
2029	R\$ 9.035.272,62	R\$ 160.420.979,40	5,63%	100,00%	-	R\$ 9.035.272,62
2030	-	R\$ 160.420.979,40	0,00%	100,00%	-	-
TOTAL	R\$ 160.420.979,40		100,00%		R\$ 21.284.340,81	R\$ 139.136.638,59

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

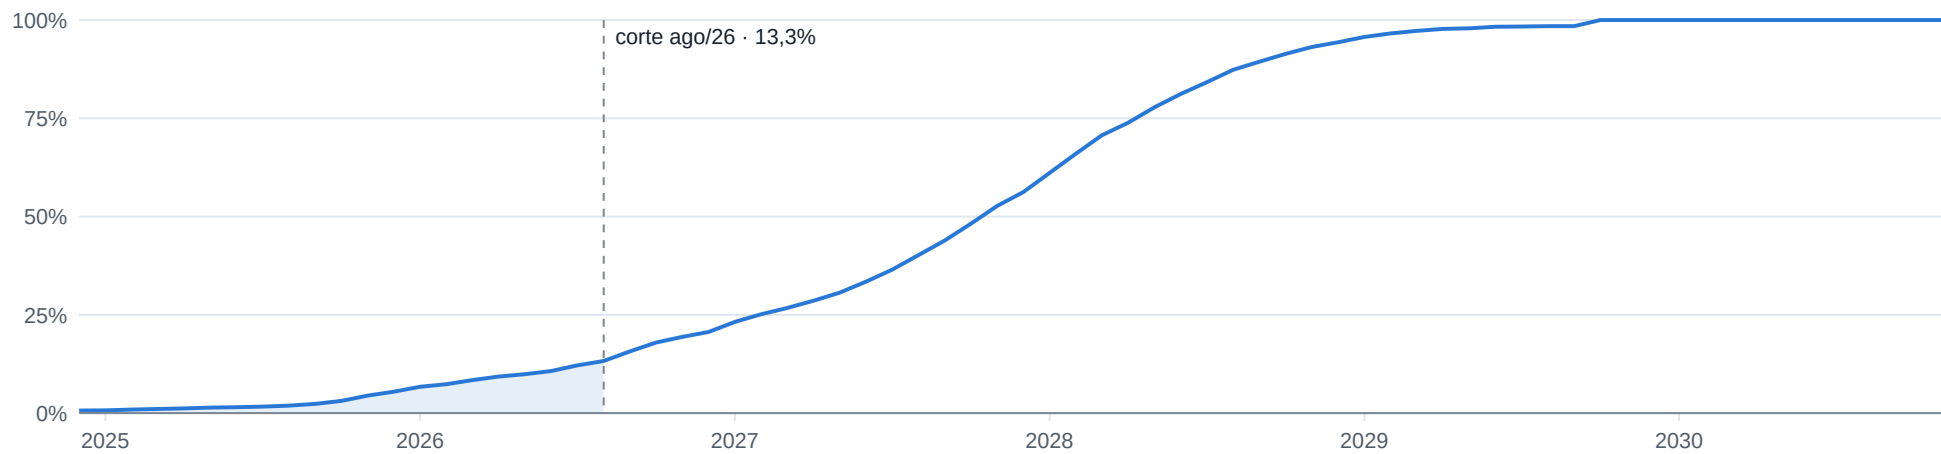

DESEMBOLSO ANUAL (R\$ MILHÕES)

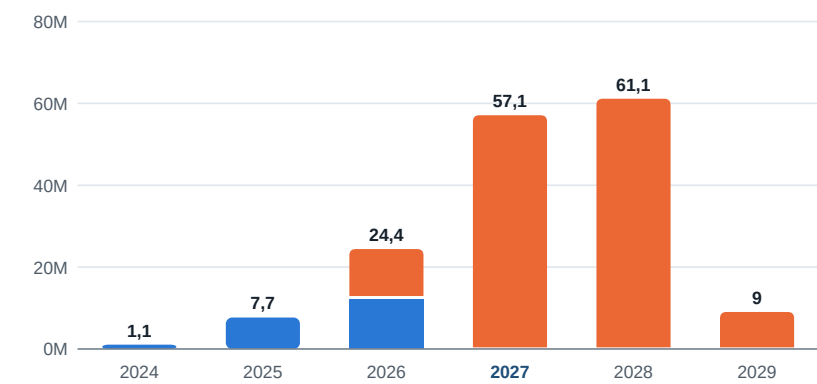

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

Grupo	R\$	% do ano	Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)	R\$ 9.868.861,03	17,3%	57,8%
Infraestrutura (12 a 16)	R\$ 1.426.609,28	2,5%	100,0%
Estrutura (17)	R\$ 17.446.985,14	30,6%	96,7%
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)	R\$ 17.091.438,18	29,9%	46,9%
Acabamentos (25 a 37)	R\$ 11.267.614,04	19,7%	24,8%
Taxa de administração	R\$ 0,00	0,0%	
TOTAL	R\$ 57.101.507,66	100,0%	

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.

BOTÂNICO · RETRATO DE 2027

Execução física (Prevision), desembolso do ano (fluxo financeiro) e situação da obra em 31/12/2027 · Corte: ago/2026 · Cenário: Prevision

DESEMBOLSO NO ANO (R\$ NOMINAL) R\$ 57,1 mi com taxa de administração	DESEMBOLSO NO ANO (INCC) 44.030 pts pontos de índice	EM R\$ DO INCC SELECIONADO R\$ 57,1 mi INCC × índice do mês escolhido	EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO 57,0% itens diretos, ponderado pela projeção	AVANÇO FINANCEIRO 59,3% acumulado no fim do ano	MAIOR DESEMBOLSO DO ANO ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO R\$ 17.4 mi no ano
--	---	--	--	--	--

PLS EM 2027 — EXECUÇÃO FÍSICA, DESEMBOLSO E SITUAÇÃO EM 31/12/2027

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R\$ nominal	Desembolso INCC	R\$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
01	PROJETOS	—		R\$ 15.577	12	R\$ 15.577	0,0%	93,5%	
02	SEGUROS	—		R\$ 56.612	44	R\$ 56.612	0,1%	100,0%	
03	TAXAS DIVERSAS	—		R\$ 2.823	2	R\$ 2.823	0,0%	6,6%	
04	BARRACAO DE OBRA	—		R\$ 342.909	264	R\$ 342.909	0,6%	86,5%	
05	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO	—		R\$ 27.946	22	R\$ 27.946	0,0%	100,0%	
06	CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.	—		R\$ 153.690	119	R\$ 153.690	0,3%	42,0%	
07	DIVERSOS	—		R\$ 62.346	48	R\$ 62.346	0,1%	61,8%	
08	TRANSPORTES	—		R\$ 349.046	269	R\$ 349.046	0,6%	59,0%	
09	CONSULTORIAS (OBRAS)	—		R\$ 236.040	182	R\$ 236.040	0,4%	77,2%	
10	MÃO DE OBRA PRÓPRIA	—		R\$ 5.901.876	4.551	R\$ 5.901.876	10,3%	50,6%	
11	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	—		R\$ 2.719.996	2.097	R\$ 2.719.996	4,8%	58,5%	
01 a 11	INDIRETOS	—		R\$ 9.868.861	7.610	R\$ 9.868.861	17,3%	57,8%	
12	SERVIÇOS INICIAIS	100,0%	100,0%	R\$ 58.439	45	R\$ 58.439	0,1%	100,0%	Concluído (todas as 2 atividades)
13	CONTENÇÃO	100,0%	75,2%	R\$ 51.364	40	R\$ 51.364	0,1%	100,0%	Concluído (todas as 4 atividades)
14	TERRAPLENAGEM	100,0%	86,0%	R\$ 3.124	2	R\$ 3.124	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 2 atividades)
15	FUNDAÇÃO PROFUNDA	100,0%	99,5%	R\$ 12.311	9	R\$ 12.311	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 133 atividades)
16	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	100,0%	76,7%	R\$ 1.301.371	1.003	R\$ 1.301.371	2,3%	99,9%	Concluído (todas as 82 atividades)
12 a 16	SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES	100,0%	88,8%	R\$ 1.426.609	1.100	R\$ 1.426.609	2,5%	100,0%	
17	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	96,6%	8,1%	R\$ 17.446.985	13.453	R\$ 17.446.985	30,6%	96,7%	Estrutura: até 32º pav. (restam serviços no 32º pav.) Anotação do modelo anterior: ATÉ O COBERTURA - 32º PAVIMENTO
18	ALVENARIA	66,8%	0,0%	R\$ 4.221.352	3.255	R\$ 4.221.352	7,4%	66,8%	Alvenaria: até 28º pav., executando 29º pav. / Encunhamento: até 27º pav. / Drywall 1ª face: até 20º pav., executando 21º pav. / Drywall 2ª face: até 17º pav., executando 18º pav. / Drywall: até térreo Anotação do modelo anterior: ALVENARIA - ATÉ 27º PAVIMENTO / GESSO ACARTONADO - 2ª FACE - ATÉ 16º PAVIMENTO
19	IMPERMEABILIZAÇÃO	30,5%	0,0%	R\$ 1.277.855	985	R\$ 1.277.855	2,2%	30,5%	Impermeabilização: até 16º pav., executando 17º pav. Anotação do modelo anterior: ATÉ O 15º PAVIMENTO
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,3%	0,0%	R\$ 3.426.681	2.642	R\$ 3.426.681	6,0%	32,2%	Distribuição elétrica / quadro: até 25º pav., executando 26º pav. / Prumada elétrica - infra: até 22º pav., executando 23º pav. /

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R\$ nominal	Desembolso INCC	R\$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
									Distribuição elétrica/quadro - drywall: até 18º pav., executando 20º pav. / Fiação elétrica: até 12º pav., executando 13º pav. / Prumada elétrica - cabos: até 12º pav., executando 13º pav. / Fiação telecom/dados: até 12º pav., executando 13º pav. Anotação do modelo anterior: INFRAESTRUTURA - ATÉ O 14º PAVIMENTO / FIAÇÃO - ATÉ O 10º PAVIMENTO
21	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	65,1%	0,0%	R\$ 5.112.481	3.942	R\$ 5.112.481	9,0%	65,1%	Prumada hidrossanitária: até 27º pav., executando 28º pav. / Distribuição hidrossanitária: até 25º pav., executando 26º pav. / Distribuição de gás: até 25º pav., executando 26º pav. / Shaft interno inst. hidráulicas: até 22º pav., executando 23º pav. / Distribuição hidráulica: até 4º pav. (restam serviços no 1º pav.) / Distribuição de gás - drywall: até 18º pav., executando 20º pav. / Distribuição hidráulica - drywall: até 18º pav., executando 20º pav. Anotação do modelo anterior: INFRAESTRUTURA - ATÉ O 15º PAVIMENTO
22	INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	65,9%	0,0%	R\$ 548.357	423	R\$ 548.357	1,0%	65,9%	Prumada de incêndio: até 27º pav., executando 28º pav. Anotação do modelo anterior: PRUMADA - ATÉ 28º PAVIMENTO
23	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	33,6%	0,0%	R\$ 960.291	740	R\$ 960.291	1,7%	33,6%	Infraestrutura - ar condicionado: até 18º pav., executando 20º pav. Anotação do modelo anterior: RENOVAÇÃO DE AR - SUBSOLO
24	ELEVADORES	0,0%	0,0%	R\$ 1.544.421	1.191	R\$ 1.544.421	2,7%	44,8%	Aduelas (elevadores): em execução Anotação do modelo anterior: APENAS DESEMBOLSO FINANCEIRO - MONTAGEM PARA 2028
25	ESQUADRIAS	4,7%	0,0%	R\$ 2.851.294	2.199	R\$ 2.851.294	5,0%	23,9%	Contramarco: até 24º pav., executando 25º pav. / Esquadria de alumínio: até 7º pav., executando 8º pav. Anotação do modelo anterior: APENAS DESEMBOLSO FINANCEIRO - MONTAGEM PARA 2028
26	SERRALHERIA	19,1%	0,0%	R\$ 98.246	76	R\$ 98.246	0,2%	19,1%	Chumbamento de PCF: até 4º pav., executando 5º pav. / Serralheria: até 3º pav., executando 4º pav.
27	MARcenARIA	0,0%	0,0%	R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	0,0%	Não iniciado - início previsto em fev/2028
28	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	61,5%	0,0%	R\$ 718.341	554	R\$ 718.341	1,3%	61,5%	Contrapiso: até 21º pav., executando 22º pav. Anotação do modelo anterior: ATÉ O 21º PAVIMENTO
29	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	65,5%	0,0%	R\$ 1.756.078	1.354	R\$ 1.756.078	3,1%	65,5%	Taliscamento: até 26º pav., executando 27º pav. / Reboco interno: até 23º pav., executando 24º pav. Anotação do modelo anterior: ATÉ O 23º PAVIMENTO
30	REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	23,3%	0,0%	R\$ 2.582.123	1.991	R\$ 2.582.123	4,5%	23,3%	Revestimento porcelanato parede: até 15º pav., executando 16º pav. / Revestimentos porcelanato piso: até 14º pav., executando 15º pav. / Bancadas: até 13º pav., executando 14º pav. Anotação do modelo anterior: PAREDES - ATÉ O 15º PAVIMENTO / PISOS - ATÉ O 14º PAVIMENTO
31	PAVIMENTAÇÃO	25,8%	0,0%	R\$ 29.339	23	R\$ 29.339	0,1%	25,8%	Passeios, muretas e rampas: em execução (térreo)

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R\$ nominal	Desembolso INCC	R\$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
32	REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	41,4%	0,0%	R\$ 2.227.925	1.718	R\$ 2.227.925	3,9%	41,4%	Preparação para fachada aerada - F1 + F2 (1º etapa): concluído / Fachada loja: até térreo (restam serviços no térreo) / Fachada aerada - F1 + F2 (1º etapa): concluído / Preparação para fachada aerada - F3 + F4 (1º etapa): concluído / Fachada aerada - F3 + F4 (1º etapa): em execução / Peitoris e requadros de fachada - F1 + F2 (1º etapa): concluído / Preparação para fachada aerada - F5 (1º etapa): em execução Anotação do modelo anterior: 1ª ETAPA DE FACHADA - 70 % FINAIZADA
33	FORRO	18,2%	0,0%	R\$ 327.286	252	R\$ 327.286	0,6%	18,2%	Forro: até 11º pav., executando 12º pav. Anotação do modelo anterior: ATÉ O 11º PAVIMENTO
34	LOUÇAS SANITÁRIAS	0,0%	0,0%	R\$ 244.489	189	R\$ 244.489	0,4%	11,2%	Não iniciado · início previsto em mar/2028
35	PINTURA	15,0%	0,0%	R\$ 432.493	333	R\$ 432.493	0,8%	15,2%	Massa corrida: até térreo, executando 7º pav. Anotação do modelo anterior: TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE
36	PAISAGISMO	0,0%	0,0%	R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	0,0%	Não iniciado · início previsto em jun/2028
37	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,0%	0,0%	R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%	0,0%	Não iniciado · início previsto em mar/2028
DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração)				R\$ 57.101.508	44.030	R\$ 57.101.508	100,0%		
38	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	—		R\$ 0	0	R\$ 0	0,0%		
DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				R\$ 57.101.508	44.030	R\$ 57.101.508	100,0%		

Execução física = % "Previsto" acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision em dezembro; no corte = % "Realizado". Situação em 31/12 = atividades do cronograma de atividades concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.

Botânico · Gantt do cronograma

2.387 atividades do Prevision (situação em 24/09/26) · PL → pacote de trabalho → pavimento/tarefa · clique na seta para abrir



PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2025		2026				2027				2028				2029	
				jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr
▼ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	13/04/26	09/04/27	83%																
▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	13/04/26	07/08/26	99%																
▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 1	13/04/26	27/04/26	100%																
▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2	22/04/26	15/05/26	100%																
▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3	08/05/26	10/07/26	100%																
▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - NUCLEO	25/05/26	03/07/26	100%																
▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 4	01/06/26	10/07/26	100%																
▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5	16/06/26	17/07/26	100%																
▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 6	03/07/26	17/07/26	100%																
▶ CINTAS FASE 1	21/09/26	01/10/26	0%																
▶ CINTAS FASE 2	02/10/26	16/10/26	0%																
▶ CINTAS FASE 3	19/10/26	30/10/26	0%																
▶ CINTAS FASE 4	19/10/26	30/10/26	0%																
▶ FUNDAÇÃO - PROJEÇÃO IGREJA	15/03/27	25/03/27	0%																
▶ BLOCOS E CINTAS - IGREJA	29/03/27	09/04/27	0%																
▼ ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	15/06/26	11/02/28	25%																
▶ ESTRUTURA	15/06/26	11/02/28	16%																
▶ Estrutura Térreo - Fase 2	13/07/26	17/08/26	100%																
▶ Estrutura Térreo - Fase 3	21/07/26	07/08/26	100%																
▶ Estrutura Térreo - Fase 4	04/08/26	26/08/26	100%																
▶ Estrutura Mezanino	04/08/26	28/08/26	100%																
▶ Estrutura 2º Pav - Fase 1	17/08/26	28/09/26	60%																
▶ ESTRUTURA IGREJA	18/01/27	03/05/27	0%																
▶ ESTRUTURA - PISO ARMADO	08/02/27	11/03/27	0%																
▼ PINTURA 5 inferidos	19/10/26	02/04/29	0%																
▶ TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO 1	19/10/26	10/05/27	0%																
▶ MASSA CORRIDA 1	24/11/27	01/12/28	0%																
▶ PINTURA 1º DEMÃO	11/01/28	05/01/29	0%																
▶ PINTURA 2º DEMÃO	27/03/28	27/02/29	0%																
▶ TEXTURA - 1º DEMÃO	17/04/28	26/01/29	0%																

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2025		2026				2027				2028				2029	
				jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr
▶ PINTURA DE TUBULAÇÕES (PAREDE E TETO)	17/04/28	15/01/29	0%							24/09/26				31/12/27					
▶ PINTURA 3º DEMÃO	02/05/28	02/04/29	0%																
▶ PINTURA - CORRIMÃO	05/05/28	01/06/28	0%																
▶ TEXTURA - 2º E 3º DEMÃO	09/06/28	09/03/29	0%																
▶ TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE -... ⓘ	22/06/28	19/07/28	0%																
▶ TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE -... ⓘ	03/08/28	31/08/28	0%																
▶ TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE -... ⓘ	09/10/28	07/11/28	0%																
▼ INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS ⓘ 3 inferidos	11/01/27	23/08/28	0%																
▶ DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - INFRAS ENTERR...	11/01/27	05/02/27	0%																
▶ PRUMADA HIDROSSANITÁRIA	05/04/27	26/05/28	0%																
▶ DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA	30/04/27	22/05/28	0%																
▶ DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	30/04/27	22/05/28	0%																
▶ SHAFT INTERNO INST. HIDRÁULICAS ⓘ	09/06/27	29/06/28	0%																
▶ DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA	28/06/27	23/02/28	0%																
▶ DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL	16/07/27	07/08/28	0%																
▶ DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL	16/07/27	07/08/28	0%																
▶ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24/09/27	30/05/28	0%																
▶ RESERVATÓRIO	19/10/27	21/07/28	0%																
▶ PRESSURIZAÇÃO (HIDRÁULICA) ⓘ	22/06/28	12/07/28	0%																
▶ MONTAGEM - BOILERS E AQUECEDORES ⓘ	24/07/28	23/08/28	0%																
▼ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ⓘ 3 inferidos	18/01/27	12/03/29	0%																
▶ ENTRADA DE ENERGIA	18/01/27	05/02/27	0%																
▶ INFRA ELÉTRICA - TETO	03/02/27	15/10/27	0%																
▶ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO	30/04/27	22/05/28	0%																
▶ PRUMADA ELÉTRICA - INFRA	09/06/27	30/06/28	0%																
▶ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL	16/07/27	07/08/28	0%																
▶ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24/09/27	30/05/28	0%																
▶ FIAÇÃO ELÉTRICA	01/10/27	24/10/28	0%																
▶ PRUMADA ELÉTRICA - CABOS	01/10/27	25/10/28	0%																
▶ FIAÇÃO TELECOM/DADOS	01/10/27	26/10/28	0%																

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2025		2026				2027				2028				2029	
				jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr
▶ GERADOR/TRANSFORMADOR ⓘ	17/01/28	01/03/28	0%										24/09/26					31/12/27	
▶ DISJUNTORES / MIOLOS ⓘ	21/01/28	05/02/29	0%																
▶ INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SENSORES	21/01/28	28/08/28	0%																
▶ INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	11/02/28	25/01/29	0%																
▶ ACABAMENTOS ELÉTRICOS	07/04/28	12/03/29	0%																
▶ INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS ⓘ	19/05/28	09/02/29	0%																
▶ SPDA	03/08/28	21/08/28	0%																
▼ ALVENARIA	16/03/27	21/08/28	0%																
▶ ALVENARIA	16/03/27	04/05/28	0%																
▶ ENCUNHAMENTO	07/04/27	27/04/28	0%																
▶ ALVENARIA - ISOLAMENTO DE CONTENÇÕES	09/04/27	11/05/27	0%																
▶ DRYWALL 1º FACE	05/07/27	25/07/28	0%																
▶ DRYWALL 2º FACE	29/07/27	21/08/28	0%																
▶ DRYWALL	10/09/27	02/03/28	0%																
▶ SHAFT	19/10/27	26/06/28	0%																
▼ INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO ⓘ inferido	30/03/27	14/09/28	0%																
▶ PRUMADA DE INCÊNDIO	30/03/27	18/04/28	0%																
▶ INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	04/10/27	26/05/28	0%																
▶ INSTALAÇÕES INCÊNDIO	31/01/28	18/02/28	0%																
▶ PRESSURIZAÇÃO (INCÊNDIO) ⓘ	24/08/28	14/09/28	0%																
▼ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	16/04/27	21/06/28	0%																
▶ TALISCAMENTO	16/04/27	09/05/28	0%																
▶ REBOCO INTERNO	26/05/27	21/06/28	0%																
▼ ESQUADRIAS ⓘ 3 inferidos	13/05/27	25/01/29	0%																
▶ CONTRAMARCO	13/05/27	02/06/28	0%																
▶ ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	07/12/27	17/11/28	0%																
▶ ESQUADRIA MADEIRA	04/02/28	12/01/29	0%																
▶ INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISE - F... ⓘ	10/05/28	21/06/28	0%																
▶ INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - ... ⓘ	22/06/28	02/08/28	0%																
▶ BRISE	26/07/28	25/01/29	0%																

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2025		2026				2027				2028				2029	
				jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr
▶ INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - ... ⓘ	18/08/28	06/10/28	0%							24/09/26				31/12/27					
▼ SERRALHERIA ⓘ	14/06/27	16/01/29	0%																
▶ CHUMBAMENTO DE PCF	14/06/27	12/01/28	0%																
▶ SERRALHERIA	02/08/27	29/06/28	0%																
▶ INSTALAÇÃO DE PCF (FOLHA)	14/02/28	16/01/29	0%																
▶ INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO (SERRALHERIA)	22/02/28	04/05/28	0%																
▶ PONTOS DE ANCORAGEM INOX ⓘ	29/03/28	04/04/28	0%																
▼ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	22/06/27	07/08/28	0%																
▶ CONTRAPISO	22/06/27	07/08/28	0%																
▼ INSTALAÇÕES ESPECIAIS ⓘ	16/07/27	05/02/29	0%																
▶ INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO	16/07/27	07/08/28	0%																
▶ PRESSURIZAÇÃO (VENTILAÇÃO)	19/10/27	06/12/27	0%																
▶ INST. MÓDULOS CHURRASQUEIRA ⓘ	31/01/28	04/02/28	0%																
▶ COMUNICAÇÃO E ALARME ⓘ	01/03/28	05/02/29	0%																
▶ AQUECEDOR (SAUNA) ⓘ	01/06/28	14/06/28	0%																
▶ EQUIPAMENTOS - PISCINA ⓘ	02/08/28	01/09/28	0%																
▼ IMPERMEABILIZAÇÃO	11/08/27	01/09/28	0%																
▶ IMPERMEABILIZAÇÃO	11/08/27	01/09/28	0%																
▼ REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHA... ⓘ	18/08/27	27/02/29	0%																
▶ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F1 +...	18/08/27	08/09/27	0%																
▶ FACHADA LOJA	26/08/27	18/01/28	0%																
▶ FACHADA AERADA - F1 + F2 (1º ETAPA)	09/09/27	05/11/27	0%																
▶ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F3 +...	14/10/27	04/11/27	0%																
▶ FACHADA AERADA - F3 + F4 (1º ETAPA)	08/11/27	12/01/28	0%																
▶ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F... ⓘ	08/11/27	06/12/27	0%																
▶ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F5 (...)	14/12/27	11/01/28	0%																
▶ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F... ⓘ	05/01/28	01/02/28	0%																
▶ FACHADA AERADA - F5 (1º ETAPA)	13/01/28	22/03/28	0%																
▶ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F1 +...	14/02/28	10/03/28	0%																
▶ REBOCO EXTERNO	03/03/28	25/05/28	0%																

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2025		2026				2027				2028				2029	
				jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr
▶ FACHADA AERADA - F1 + F2 (2º ETAPA)	13/03/28	25/04/28	0%																
▶ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F...	15/03/28	19/04/28	0%																
▶ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F3 +...	24/03/28	24/04/28	0%																
▶ TEXTURA - EXTERNA	27/03/28	27/02/29	0%																
▶ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F...	17/04/28	09/05/28	0%																
▶ FACHADA AERADA - F3 + F4 (2º ETAPA)	26/04/28	07/06/28	0%																
▶ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F5 (...)	10/05/28	06/06/28	0%																
▶ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F...	31/05/28	21/06/28	0%																
▶ FACHADA AERADA - F5 (2º ETAPA)	08/06/28	27/07/28	0%																
▶ FACHADA	16/06/28	19/09/28	0%																
▶ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F...	20/07/28	17/08/28	0%																
▶ FACHADA EMBASAMENTO	18/08/28	04/01/29	0%																
▼ REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	24/08/27	15/02/29	0%																
▶ REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE	24/08/27	15/09/28	0%																
▶ REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO	06/09/27	28/09/28	0%																
▶ REVESTIMENTO DE GRANITO PISO	20/09/27	04/08/28	0%																
▶ BANCADAS	20/09/27	11/10/28	0%																
▶ PISO VINÍLICO / LAMINADO	24/01/28	03/01/29	0%																
▶ RODAPÉ MADEIRA / PVC	17/02/28	23/01/29	0%																
▶ POLIMENTO DE PISO	24/03/28	15/12/28	0%																
▶ PISO EMBORRACHADO	18/05/28	31/05/28	0%																
▶ REVESTIMENTO ACABAMENTO	31/05/28	15/02/29	0%																
▶ PISO ELEVADO	11/09/28	26/10/28	0%																
▼ ELEVADORES	20/09/27	09/10/28	0%																
▶ INSTALAÇÃO DE ADUELAS (ELEVADORES)	20/09/27	13/07/28	0%																
▶ PREPARAÇÃO - POÇO DE ELEVADOR	14/02/28	18/05/28	0%																
▶ MONTAGEM - ELEVADOR 1	19/05/28	05/07/28	0%																
▶ MONTAGEM - ELEVADOR 2	06/07/28	22/08/28	0%																
▶ MONTAGEM - ELEVADOR 3	23/08/28	09/10/28	0%																
▼ FORRO	15/10/27	03/11/28	0%																

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.	2025		2026				2027				2028				2029	
				jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr	jul	out	jan	abr
▶ FORRO	15/10/27	03/11/28	0%						24/09/26					31/12/27					
▼ PAVIMENTAÇÃO 2 inferidos	30/11/27	01/03/29	0%																
▶ PASSEIOS, MURETAS E RAMPAS	30/11/27	09/03/28	0%																
▶ DEMARCAÇÃO DE VAGAS i	19/05/28	01/03/29	0%																
▶ QUADRA DE RECREAÇÃO i	08/08/28	10/10/28	0%																
▼ SEM PL (gestão / entrega) 7 inferidos	11/02/28	30/04/29	0%																
▶ PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS i	11/02/28	09/02/29	0%																
▶ CHECKLIST i	24/04/28	19/03/29	0%																
▶ CHECKLIST FINAL i	31/10/28	13/04/29	0%																
▶ ENXOVAL i	17/11/28	02/04/29	0%																
▶ VISTORIA APTOS i	08/01/29	18/04/29	0%																
▶ HABITE-SE i	01/03/29	02/04/29	0%																
▶ ENTREGA SÍNDICO i	03/04/29	30/04/29	0%																
▼ MARCENARIA	14/02/28	16/01/29	0%																
▶ MARCENARIA - SHAFTS	14/02/28	16/01/29	0%																
▼ LOUÇAS SANITÁRIAS	01/03/28	09/02/29	0%																
▶ LOUÇAS	01/03/28	05/02/29	0%																
▶ METAIS	01/03/28	05/02/29	0%																
▶ INSTALAÇÃO DE METAIS	19/05/28	09/02/29	0%																
▼ LIMPEZA FINAL DE OBRA	14/03/28	13/04/29	0%																
▶ LIMPEZA GROSSA	14/03/28	14/02/29	0%																
▶ LIMPEZA FINA	15/05/28	13/04/29	0%																
▶ LIMPEZA	26/06/28	02/04/29	0%																
▼ PAISAGISMO	08/06/28	06/12/28	0%																
▶ IRRIGAÇÃO	08/06/28	25/10/28	0%																
▶ PAISAGISMO	16/06/28	06/12/28	0%																

PACOTES NÃO DESCRITOS DE FORMA EXPRESSA NA CURVA DO PREVISION (45)

PL	Pacote	Nota
FUNDAÇÃO PROFUNDA	VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - CENTRAL DE POLÍMEROS)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.
FUNDAÇÃO PROFUNDA	VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 1º ETAPA)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.
FUNDAÇÃO PROFUNDA	VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 2º ETAPA)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.
FUNDAÇÃO PROFUNDA	VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 1º ETAPA)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.
FUNDAÇÃO PROFUNDA	VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 2º ETAPA)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.
FUNDAÇÃO PROFUNDA	VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA BOM JESUS)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.
FUNDAÇÃO PROFUNDA	VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 3º ETAPA)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.
PINTURA	TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
PINTURA	MASSA CORRIDA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: massa, corrida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 28 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES.
PINTURA	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F1 + F2	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
PINTURA	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F3 + F4	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
PINTURA	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F5	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	SHAFT INTERNO INST. HIDRÁULICAS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: shaft). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 18 – ALVENARIA; 27 – MARCENARIA.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	PRESSURIZAÇÃO (HIDRÁULICA)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: pressurização). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 34 – LOUÇAS E METAIS.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	MONTAGEM - BOILERS E AQUECEDORES	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: boilers). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	GERADOR/TRANSFORMADOR	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: gerador). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	DISJUNTORES / MIOLOS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: disjuntores, miolos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).

PL	Pacote	Nota
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: carregador, veículos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.
INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	PRESSURIZAÇÃO (INCÊNDIO)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO (termo sem correspondência: pressurização). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 34 – LOUÇAS E METAIS.
ESQUADRIAS	INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISE - F1 + F2	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 25 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: shadowbox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
ESQUADRIAS	INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - F3 + F4	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 25 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: shadowbox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
ESQUADRIAS	INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - F5	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 25 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: shadowbox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
SERRALHERIA	PONTOS DE ANCORAGEM INOX	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 26 – SERRALHERIA (termo sem correspondência: pontos, ancoragem, inox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	INST. MÓDULOS CHURRASQUEIRA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: módulos, churrasqueira). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	COMUNICAÇÃO E ALARME	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: comunicacao, alarme). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 09 – CONSULTORIAS (OBRAS); 22 – INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA.
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	AQUECEDOR (SAUNA)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: aquecedor). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS.
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	EQUIPAMENTOS - PISCINA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: equipamentos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 10 – MÃO DE OBRA PRÓPRIA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F1 + F2 (1ª ETAPA)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F3 + F4 (1ª ETAPA)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F5 (1ª ETAPA)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	TEXTURA - EXTERNA	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: textura). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS.
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F1 + F2 (2ª ETAPA)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F3 + F4 (2ª ETAPA)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F5 (2ª ETAPA)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.

PL	Pacote	Nota
REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	POLIMENTO DE PISO	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO (termo sem correspondência: polimento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO.
ELEVADORES	INSTALAÇÃO DE ADUELAS (ELEVADORES)	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – ELEVADORES (termo sem correspondência: aduelas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
PAVIMENTAÇÃO	DEMARCAÇÃO DE VAGAS	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTAÇÃO (termo sem correspondência: demarcacao, vagas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 18 – ALVENARIA; 35 – PINTURAS.
PAVIMENTAÇÃO	QUADRA DE RECREAÇÃO	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTAÇÃO (termo sem correspondência: quadra, recreacao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
SEM PL (gestão / entrega)	PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	CHECKLIST	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	CHECKLIST FINAL	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	ENXOVAL	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	VISTORIA APTOS	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	HABITE-SE	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	ENTREGA SÍNDICO	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.

Fonte: aba CRONOGRAMA.ATIVIDADES (export do Prevision). Datas de início e término e % realizado vêm do Prevision; nos níveis PL e pacote o % é a média dos itens ponderada pela duração. O cronograma é o mesmo nos três cenários (os cenários mudam as curvas financeiras, não as datas das atividades).
