

Estudo de fachada

FIM DO GRANITO

29/04/2028

R07: 15/02/2028, com equipes em conflito

FIM DA 1ª ETAPA (ATÉ 13º)

06/07/2027

R07: 30/06/2027 (texto fixo)

CONFLITOS DE EQUIPE


0

R12 · 0

R07 · 30 pares


GANTT POR EQUIPE

Quem está onde, e quando

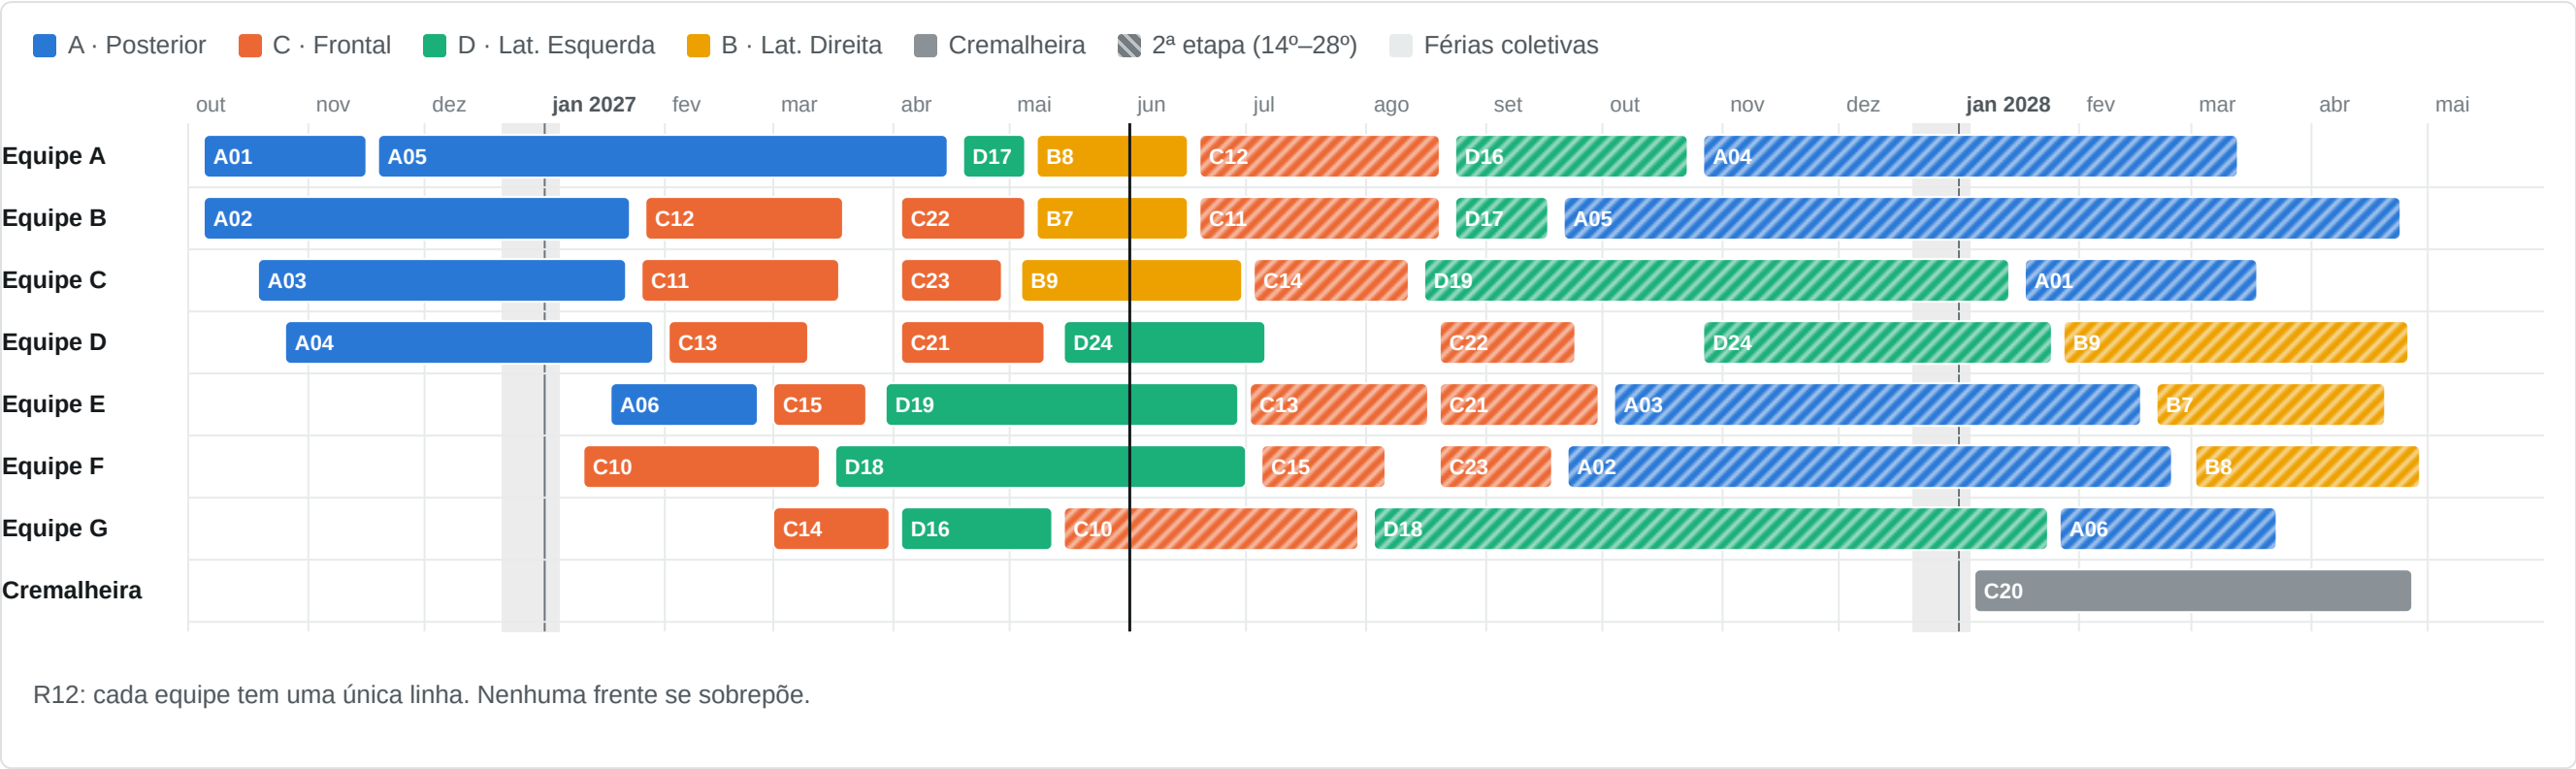


PAINEL DE EVOLUÇÃO

Balancins nas fachadas, data a data

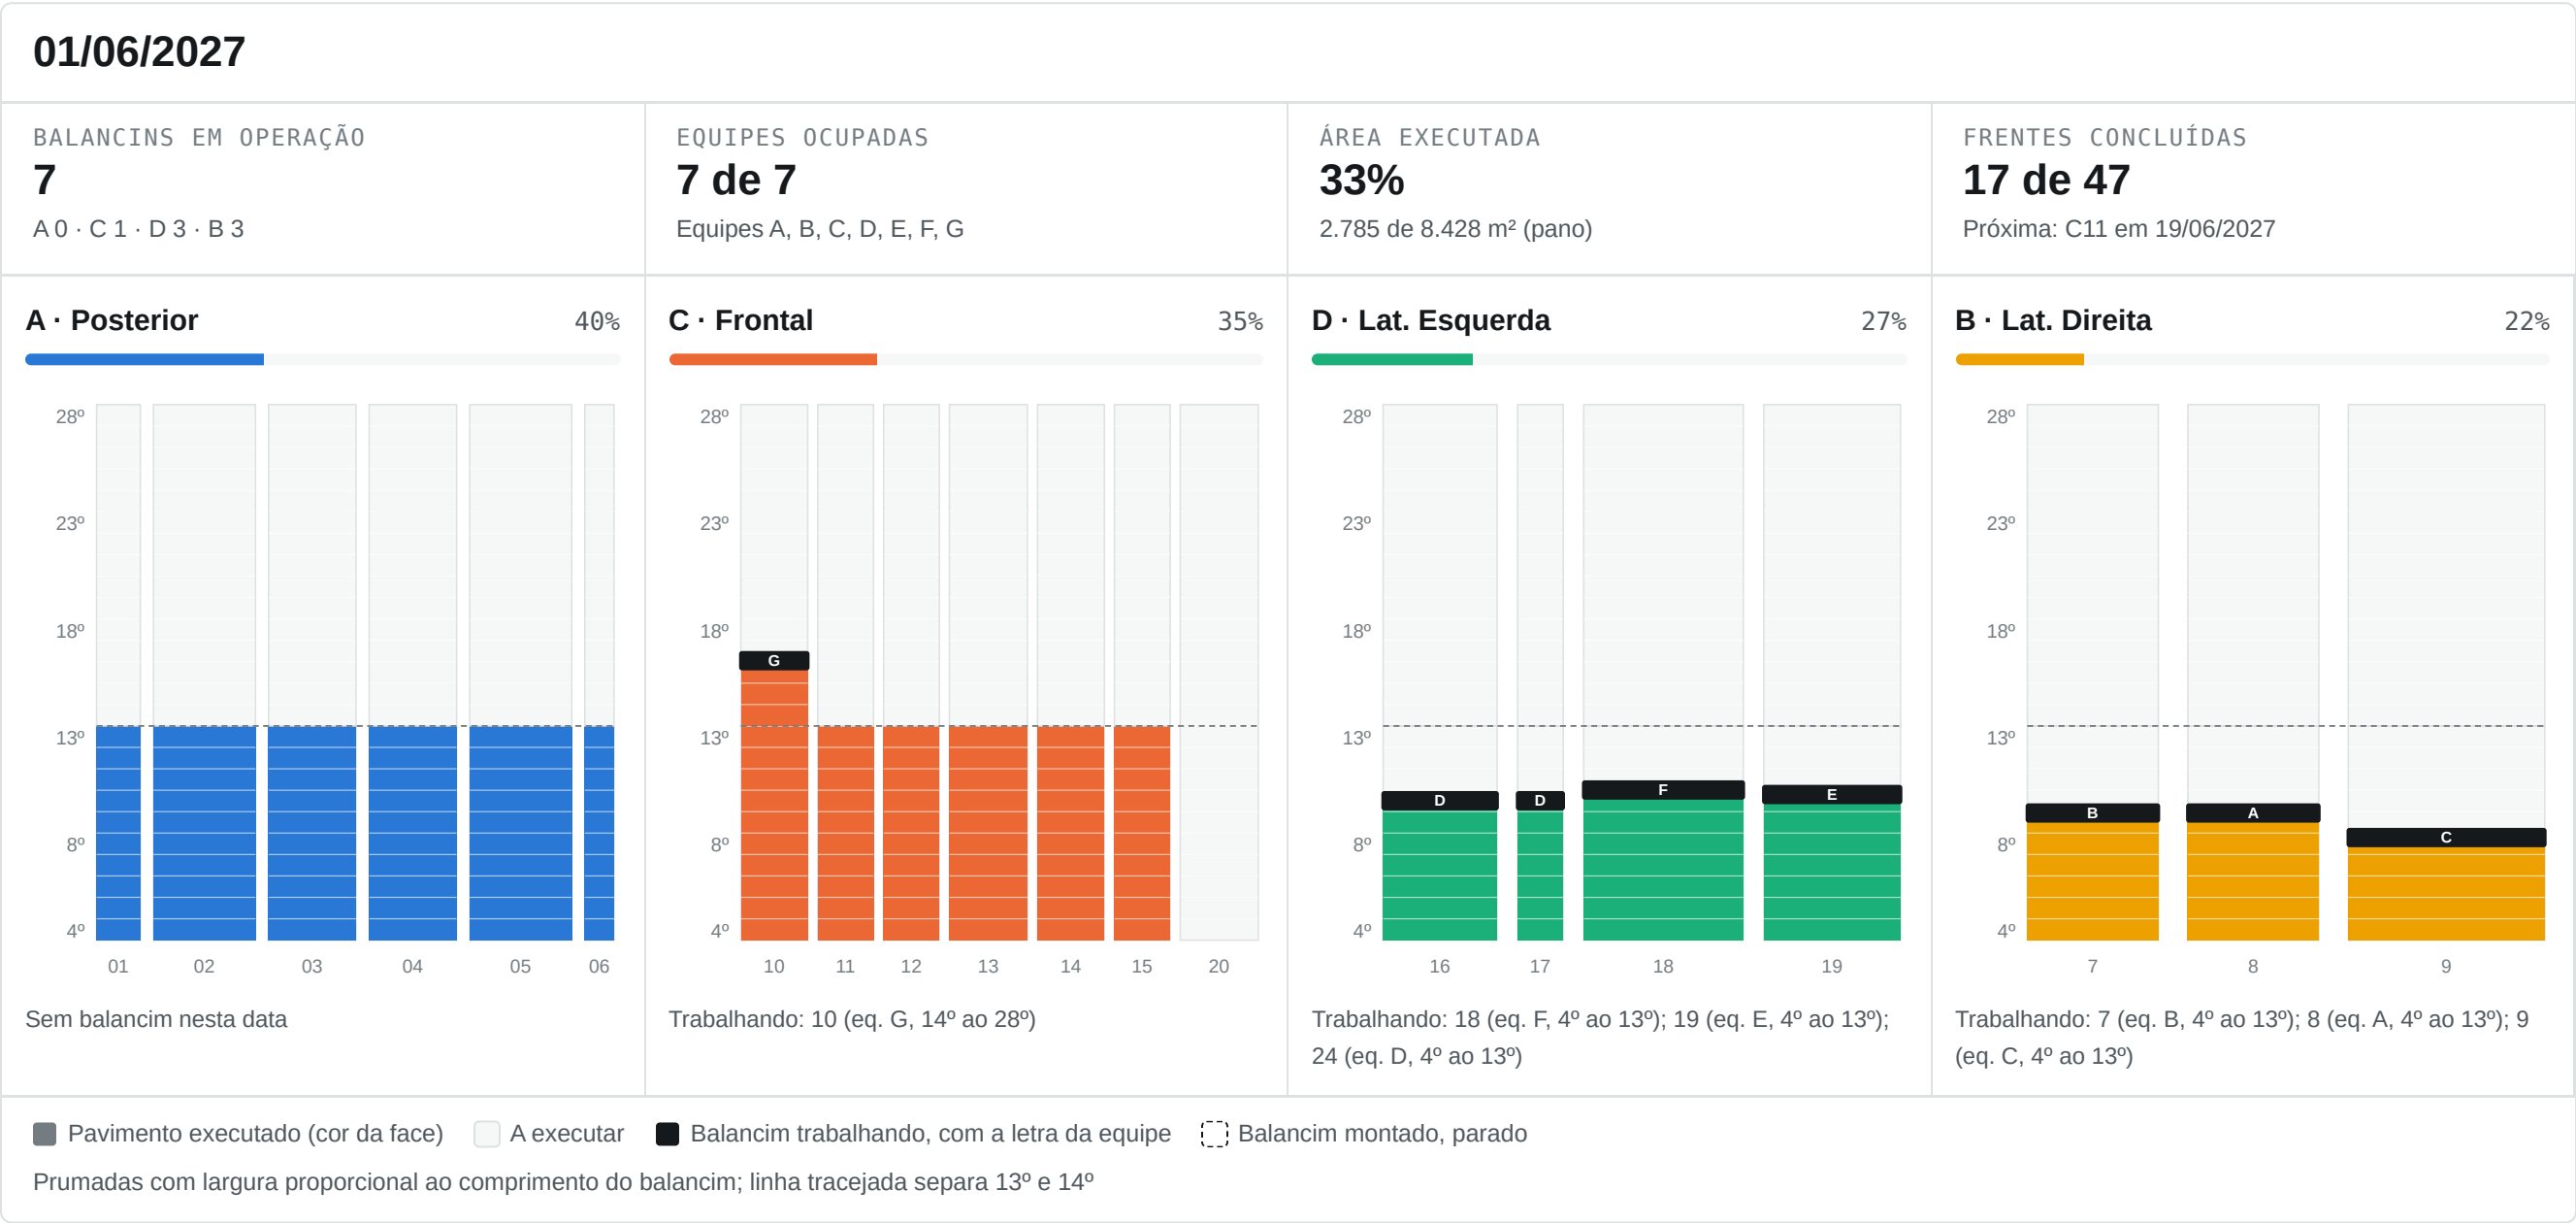

Marcos por face

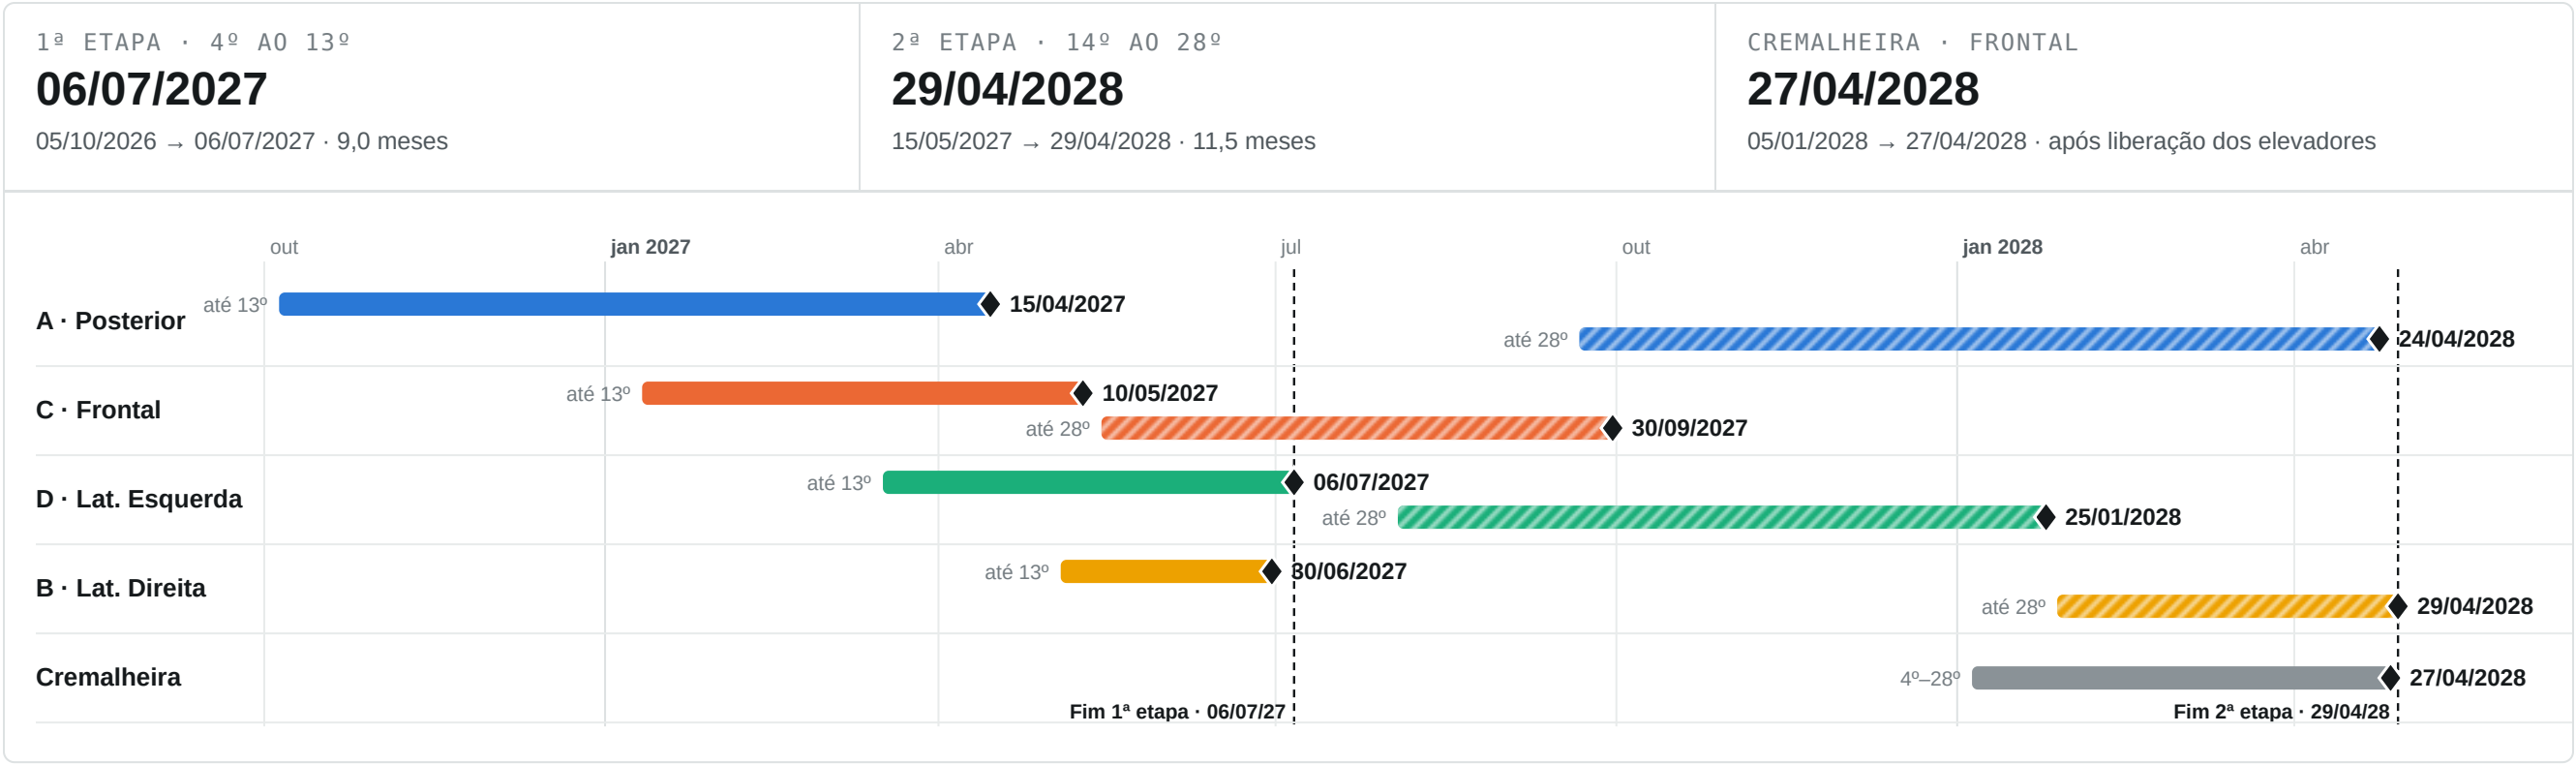

LINHA	FACE	TRECHO	BAL .	EQUIPE	INÍCIO	FIM	DIAS ÚTEIS	PAV .	TIPO	CUSTO R12	CUSTO R07
50	A · Posterior	14º ao 28º	02	B → F	22/09/2027 05/10/2026	25/02/2028 12/03/2027	117,2	15	Elétrico	R\$ 25.342	R\$ 25.633
51	A · Posterior	14º ao 28º	03	⌂ → E	04/10/2027 19/10/2026	17/02/2028 05/03/2027	100,5	15	Elétrico	R\$ 22.433	R\$ 22.579
52	A · Posterior	14º ao 28º	04	⌂ → A	27/10/2027 26/10/2026	13/03/2028 12/03/2027	100,5	15	Elétrico	R\$ 22.724	R\$ 22.579
53	A · Posterior	14º ao 28º	05	A → B	21/09/2027 09/12/2026	24/04/2028 10/07/2027	164,1	15	Elétrico	R\$ 34.068	R\$ 33.632
54	A · Posterior	14º ao 28º	06	B → G	27/01/2028 18/01/2027	23/03/2028 15/03/2027	46,9	15	Elétrico	R\$ 10.799	R\$ 10.799
56	B · Lat. Direita	14º ao 28º	7	B → E	21/02/2028 28/08/2027	20/04/2028 26/10/2027	48,7	15	Elétrico	R\$ 11.235	R\$ 11.235
57	B · Lat. Direita	14º ao 28º	8	⌂ → F	02/03/2028 15/03/2027	29/04/2028 13/05/2027	48,7	15	Elétrico	R\$ 11.089	R\$ 11.235
58	B · Lat. Direita	14º ao 28º	9	⌂ → D	28/01/2028 19/11/2027	26/04/2028 15/02/2028	73	15	Elétrico	R\$ 15.598	R\$ 15.452
60	C · Frontal	CREMALHEIRA	20	—	05/01/2028	27/04/2028	93,7	25	Manual	R\$ 5.300	—
63	D · Lat. Esquerda	4º ao 13º	24	→ D	15/05/2027 —	06/07/2027 —	43,8	44 5	Manual	R\$ 3.267	—
64	D · Lat. Esquerda	14º ao 28º	24	→ D	27/10/2027 —	25/01/2028 —	61,3	44 7	Manual	R\$ 4.533	—

PENDÊNCIAS

Não alterado (decisão da obra)

Produtividade	Cada face usa uma produtividade diferente (5 a 8 m²/dia). Mantidas como estavam.
Áreas	Três bases que não batem: Aux 8.428 m², tabela L150 5.772 m², cronograma 9.156 m².
Feriados	Faltam os feriados municipais.
Dinâmicas	BALANCINS e CRONO leem a aba "CENÁRIO 06.", que não existe mais, e não podem ser atualizadas.

O QUE MUDOU

Correções aplicadas

R12 · AB · AF · linhas 63–64	Variação par/ímpar na Frontal e na Lat. Esquerda. Em cada etapa, os balancins pares (13–15 e 16–17) fazem todos os pavimentos pares; depois de 3 dias úteis de montagem, os ímpares (21–23 e 24) fazem os ímpares. O balancim 24 ganhou frentes nas linhas 63 (4º–13º) e 64 (14º–28º), e o 16 e o 17 passaram a 5 + 8 pavimentos.
R11 · AUX-Feriados A85:C99	Férias coletivas de 20/12/2027 a 03/01/2028 incluídas. Onze frentes que atravessam o período terminam cerca de duas semanas depois, e o fim do granito passa de 18/04 para 03/05/2028. As Anotações passaram a usar a mesma lista (\$A\$2:\$A\$100).
R10 · AI60:A060	Cremalheira com custo de balancim manual: R\$ 1.000/mês por 123 dias (113 de uso + 10 de contingência), mais R\$ 600 de montagem e R\$ 600 de desmontagem, total de R\$ 5.300. O início continua em 05/01/2028, após a liberação dos elevadores.

Fonte: Estudo_fachada_-_Ed._Jardim_-_R12.xlsx (aba CENÁRIO 07), comparada com a R07. Dias úteis de segunda a sábado, descontando os feriados da aba AUX-Feriados.
