

# BOTÂNICO · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Agosto/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: padrão (curvas digitadas) · R\$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL

R\$ 160,4 mi

orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE

R\$ 21,3 mi

13,3% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027

R\$ 47,6 mi

realizado + previsto

SALDO A REALIZAR

R\$ 139,1 mi

após a data de corte

CONFERÊNCIA


✓ Tudo OK

detalhes abaixo


| REALIZADO (ATUAL) |                    |                    |         |             | COMPOSIÇÃO DO ANO |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|-------------------|--------------------|
| Setembro/2026     |                    |                    |         |             |                   |                    |
| Ano               | Anual R\$          | Acumulado R\$      | Anual % | Acumulado % | Realizado R\$     | A realizar R\$     |
| 2024              | R\$ 1.055.724,07   | R\$ 1.055.724,07   | 0,66%   | 0,66%       | R\$ 1.055.724,07  | -                  |
| 2025              | R\$ 7.679.641,61   | R\$ 8.735.365,68   | 4,79%   | 5,45%       | R\$ 7.679.641,61  | -                  |
| 2026              | R\$ 25.567.560,42  | R\$ 34.302.926,10  | 15,94%  | 21,38%      | R\$ 12.548.975,13 | R\$ 13.018.585,28  |
| 2027              | R\$ 47.604.449,83  | R\$ 81.907.375,93  | 29,67%  | 51,06%      | -                 | R\$ 47.604.449,83  |
| 2028              | R\$ 66.701.794,01  | R\$ 148.609.169,93 | 41,58%  | 92,64%      | -                 | R\$ 66.701.794,01  |
| 2029              | R\$ 11.811.809,47  | R\$ 160.420.979,40 | 7,36%   | 100,00%     | -                 | R\$ 11.811.809,47  |
| 2030              | -                  | R\$ 160.420.979,40 | 0,00%   | 100,00%     | -                 | -                  |
| TOTAL             | R\$ 160.420.979,40 |                    | 100,00% |             | R\$ 21.284.340,81 | R\$ 139.136.638,59 |

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

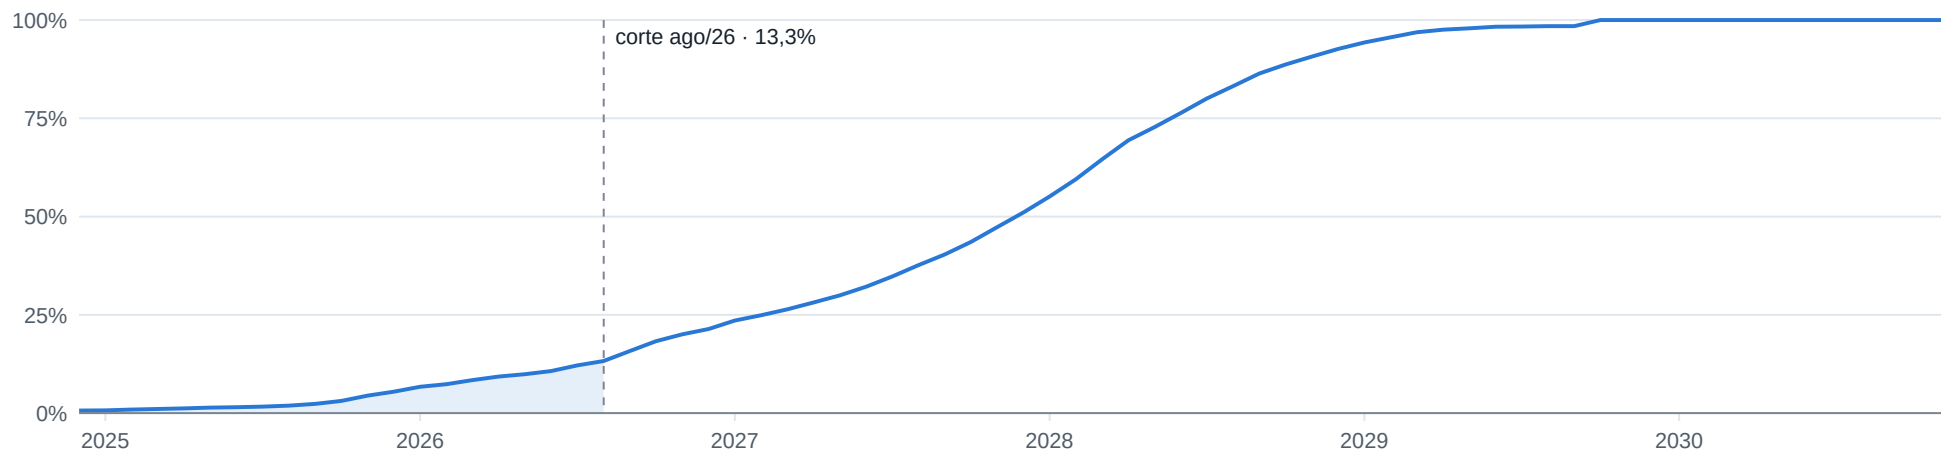

DESEMBOLSO ANUAL (R\$ MILHÕES)

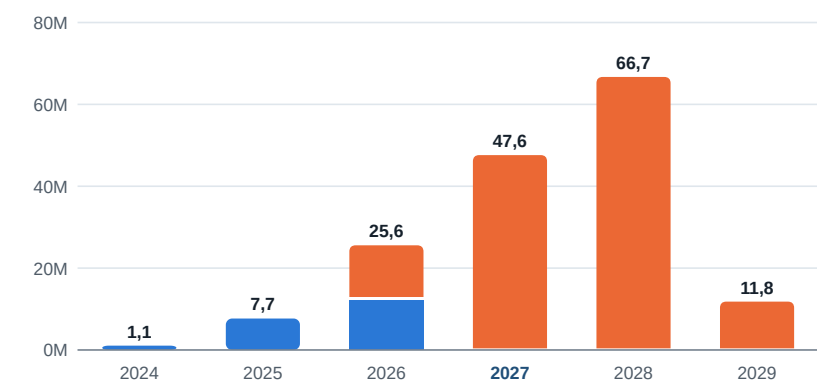

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

| Grupo                                        | R\$               | % do ano | Avanço financeiro |
|----------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Indiretos (01 a 11)                          | R\$ 9.868.861,03  | 20,7%    | 57,8%             |
| Infraestrutura (12 a 16)                     | R\$ 1.296.311,29  | 2,7%     | 98,2%             |
| Estrutura (17)                               | R\$ 16.405.808,44 | 34,5%    | 97,4%             |
| Vedações, instalações e elevadores (18 a 24) | R\$ 11.338.654,26 | 23,8%    | 32,0%             |
| Acabamentos (25 a 37)                        | R\$ 8.694.814,82  | 18,3%    | 18,9%             |
| Taxa de administração                        | R\$ 0,00          | 0,0%     |                   |
| TOTAL                                        | R\$ 47.604.449,83 | 100,0%   |                   |

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.

# BOTÂNICO · RETRATO DE 2027

Execução física (Prevision), desembolso do ano (fluxo financeiro) e situação da obra em 31/12/2027 · Corte: ago/2026 · Cenário: padrão

|                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DESEMBOLSO NO ANO (R\$ NOMINAL)</div> <div>R\$ 47,6 mi</div> <div>com taxa de administração</div> | <div>DESEMBOLSO NO ANO (INCC)</div> <div>36.707 pts</div> <div>pontos de índice</div> | <div>EM R\$ DO INCC SELECIONADO</div> <div>R\$ 47,6 mi</div> <div>INCC × índice do mês escolhido</div> | <div>EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO</div> <div>57,0%</div> <div>itens diretos, ponderado pela projeção</div> <div><div></div></div> | <div>AVANÇO FINANCEIRO</div> <div>55,2%</div> <div>acumulado no fim do ano</div> | <div>MAIOR DESEMBOLSO DO ANO</div> <div>ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</div> <div>R\$ 16.4 mi no ano</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PLS EM 2027 — EXECUÇÃO FÍSICA, DESEMBOLSO E SITUAÇÃO EM 31/12/2027**

| Cód.    | PL / serviço                                            | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | PROJETOS                                                | —                             |                    | R\$ 15.577                | 12                 | R\$ 15.577                 | 0,0%     | 93,5%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02      | SEGUROS                                                 | —                             |                    | R\$ 56.612                | 44                 | R\$ 56.612                 | 0,1%     | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 03      | TAXAS DIVERSAS                                          | —                             |                    | R\$ 2.823                 | 2                  | R\$ 2.823                  | 0,0%     | 6,6%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 04      | BARRACAO DE OBRA                                        | —                             |                    | R\$ 342.909               | 264                | R\$ 342.909                | 0,7%     | 86,5%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 05      | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA, TELEFONIA, ESGOTO   | —                             |                    | R\$ 27.946                | 22                 | R\$ 27.946                 | 0,1%     | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 06      | CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.                          | —                             |                    | R\$ 153.690               | 119                | R\$ 153.690                | 0,3%     | 42,0%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 07      | DIVERSOS                                                | —                             |                    | R\$ 62.346                | 48                 | R\$ 62.346                 | 0,1%     | 61,8%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 08      | TRANSPORTES                                             | —                             |                    | R\$ 349.046               | 269                | R\$ 349.046                | 0,7%     | 59,0%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09      | CONSULTORIAS (OBRAS)                                    | —                             |                    | R\$ 236.040               | 182                | R\$ 236.040                | 0,5%     | 77,2%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10      | MÃO DE OBRA PRÓPRIA                                     | —                             |                    | R\$ 5.901.876             | 4.551              | R\$ 5.901.876              | 12,4%    | 50,6%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11      | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                              | —                             |                    | R\$ 2.719.996             | 2.097              | R\$ 2.719.996              | 5,7%     | 58,5%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01 a 11 | INDIRETOS                                               | —                             |                    | R\$ 9.868.861             | 7.610              | R\$ 9.868.861              | 20,7%    | 57,8%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12      | SERVIÇOS INICIAIS                                       | 100,0%                        | 100,0%             | R\$ 58.439                | 45                 | R\$ 58.439                 | 0,1%     | 100,0%               | Concluído (todas as 2 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13      | CONTENÇÃO                                               | 100,0%                        | 75,2%              | R\$ 216.322               | 167                | R\$ 216.322                | 0,5%     | 100,0%               | Concluído (todas as 4 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14      | TERRAPLENAGEM                                           | 100,0%                        | 86,0%              | R\$ 59.591                | 46                 | R\$ 59.591                 | 0,1%     | 100,0%               | Concluído (todas as 2 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15      | FUNDAÇÃO PROFUNDA                                       | 100,0%                        | 99,5%              | R\$ 12.311                | 9                  | R\$ 12.311                 | 0,0%     | 100,0%               | Concluído (todas as 133 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16      | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL                                    | 100,0%                        | 76,7%              | R\$ 949.648               | 732                | R\$ 949.648                | 2,0%     | 94,1%                | Concluído (todas as 82 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 a 16 | SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES | 100,0%                        | 88,8%              | R\$ 1.296.311             | 1.000              | R\$ 1.296.311              | 2,7%     | 98,2%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17      | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO                            | 96,6%                         | 8,1%               | R\$ 16.405.808            | 12.650             | R\$ 16.405.808             | 34,5%    | 97,4%                | Estrutura: até 32º pav. (restam serviços no 32º pav.)<br>Anotação do modelo anterior: ATÉ O COBERTURA - 32º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                    |
| 18      | ALVENARIA                                               | 66,8%                         | 0,0%               | R\$ 3.695.425             | 2.849              | R\$ 3.695.425              | 7,8%     | 58,5%                | Alvenaria: até 28º pav., executando 29º pav. / Encunhamento: até 27º pav. / Drywall 1ª face: até 20º pav., executando 21º pav. / Drywall 2ª face: até 17º pav., executando 18º pav. / Drywall: até térreo<br>Anotação do modelo anterior: ALVENARIA - ATÉ 27º PAVIMENTO / GESSO ACARTONADO - 2ª FACE - ATÉ 16º PAVIMENTO |
| 19      | IMPERMEABILIZAÇÃO                                       | 30,5%                         | 0,0%               | R\$ 1.053.056             | 812                | R\$ 1.053.056              | 2,2%     | 25,2%                | Impermeabilização: até 16º pav., executando 17º pav.<br>Anotação do modelo anterior: ATÉ O 15º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                 |
| 20      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                   | 30,3%                         | 0,0%               | R\$ 2.084.698             | 1.607              | R\$ 2.084.698              | 4,4%     | 20,9%                | Distribuição elétrica / quadro: até 25º pav., executando 26º pav. / Prumada elétrica - infra: até 22º pav., executando 23º pav. /                                                                                                                                                                                        |

| Cód. | PL / serviço                      | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano                    | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                   |                               |                    |                           |                    |                            |                             |                      | Distribuição elétrica/quadro - drywall: até 18º pav., executando 20º pav. / Fiação elétrica: até 12º pav., executando 13º pav. / Prumada elétrica - cabos: até 12º pav., executando 13º pav. / Fiação telecom/dados: até 12º pav., executando 13º pav.<br>Anotação do modelo anterior: INFRAESTRUTURA - ATÉ O 14º PAVIMENTO / FIAÇÃO - ATÉ O 10º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                    |
| 21   | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS       | <div><div></div></div> 65,1%  | 0,0%               | R\$ 1.688.454             | 1.302              | R\$ 1.688.454              | <div><div></div></div> 3,5% | 24,1%                | Prumada hidrossanitária: até 27º pav., executando 28º pav. / Distribuição hidrossanitária: até 25º pav., executando 26º pav. / Distribuição de gás: até 25º pav., executando 26º pav. / Shaft interno inst. hidráulicas: até 22º pav., executando 23º pav. / Distribuição hidráulica: até 4º pav. (restam serviços no 1º pav.) / Distribuição de gás - drywall: até 18º pav., executando 20º pav. / Distribuição hidráulica - drywall: até 18º pav., executando 20º pav.<br>Anotação do modelo anterior: INFRAESTRUTURA - ATÉ O 15º PAVIMENTO |
| 22   | INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO      | <div><div></div></div> 65,9%  | 0,0%               | R\$ 481.655               | 371                | R\$ 481.655                | <div><div></div></div> 1,0% | 57,8%                | Prumada de incêndio: até 27º pav., executando 28º pav.<br>Anotação do modelo anterior: PRUMADA - ATÉ 28º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23   | INSTALAÇÕES ESPECIAIS             | <div><div></div></div> 33,6%  | 0,0%               | R\$ 790.945               | 610                | R\$ 790.945                | <div><div></div></div> 1,7% | 27,6%                | Infraestrutura - ar condicionado: até 18º pav., executando 20º pav.<br>Anotação do modelo anterior: RENOVAÇÃO DE AR - SUBSOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24   | ELEVADORES                        | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%               | R\$ 1.544.421             | 1.191              | R\$ 1.544.421              | <div><div></div></div> 3,2% | 44,8%                | Aduelas (elevadores): em execução<br>Anotação do modelo anterior: APENAS DESEMBOLSO FINANCEIRO - MONTAGEM PARA 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25   | ESQUADRIAS                        | <div><div></div></div> 4,7%   | 0,0%               | R\$ 2.851.294             | 2.199              | R\$ 2.851.294              | <div><div></div></div> 6,0% | 23,9%                | Contramarco: até 24º pav., executando 25º pav. / Esquadria de alumínio: até 7º pav., executando 8º pav.<br>Anotação do modelo anterior: APENAS DESEMBOLSO FINANCEIRO - MONTAGEM PARA 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26   | SERRALHERIA                       | <div><div></div></div> 19,1%  | 0,0%               | R\$ 81.889                | 63                 | R\$ 81.889                 | <div><div></div></div> 0,2% | 15,9%                | Chumbamento de PCF: até 4º pav., executando 5º pav. / Serralheria: até 3º pav., executando 4º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27   | MARcenARIA                        | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%               | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0% | 0,0%                 | Não iniciado - início previsto em fev/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28   | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS   | <div><div></div></div> 61,5%  | 0,0%               | R\$ 539.194               | 416                | R\$ 539.194                | <div><div></div></div> 1,1% | 46,2%                | Contrapiso: até 21º pav., executando 22º pav.<br>Anotação do modelo anterior: ATÉ O 21º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29   | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES | <div><div></div></div> 65,5%  | 0,0%               | R\$ 1.384.202             | 1.067              | R\$ 1.384.202              | <div><div></div></div> 2,9% | 51,6%                | Taliscamento: até 26º pav., executando 27º pav. / Reboco interno: até 23º pav., executando 24º pav.<br>Anotação do modelo anterior: ATÉ O 23º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30   | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO       | <div><div></div></div> 23,3%  | 0,0%               | R\$ 1.730.384             | 1.334              | R\$ 1.730.384              | <div><div></div></div> 3,6% | 15,6%                | Revestimento porcelanato parede: até 15º pav., executando 16º pav. / Revestimentos porcelanato piso: até 14º pav., executando 15º pav. / Bancadas: até 13º pav., executando 14º pav.<br>Anotação do modelo anterior: PAREDES - ATÉ O 15º PAVIMENTO / PISOS - ATÉ O 14º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31   | PAVIMENTAÇÃO                      | <div><div></div></div> 25,8%  | 0,0%               | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0% | 0,0%                 | Passeios, muretas e rampas: em execução (térreo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Cód.                                          | PL / serviço                    | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano                      | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32                                            | REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | <div><div></div></div> 41,4%  | 0,0%               | R\$ 1.263.173             | 974                | R\$ 1.263.173              | <div><div></div></div> 2,7%   | 23,4%                | Preparação para fachada aerada - F1 + F2 (1º etapa): concluído / Fachada loja: até térreo (restam serviços no térreo) / Fachada aerada - F1 + F2 (1º etapa): concluído / Preparação para fachada aerada - F3 + F4 (1º etapa): concluído / Fachada aerada - F3 + F4 (1º etapa): em execução / Peitoris e requadros de fachada - F1 + F2 (1º etapa): concluído / Preparação para fachada aerada - F5 (1º etapa): em execução<br>Anotação do modelo anterior: 1ª ETAPA DE FACHADA - 70 % FINAIZADA |
| 33                                            | FORRO                           | <div><div></div></div> 18,2%  | 0,0%               | R\$ 203.720               | 157                | R\$ 203.720                | <div><div></div></div> 0,4%   | 11,3%                | Forro: até 11º pav., executando 12º pav.<br>Anotação do modelo anterior: ATÉ O 11º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 34                                            | LOUÇAS SANITÁRIAS               | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%               | R\$ 244.489               | 189                | R\$ 244.489                | <div><div></div></div> 0,5%   | 11,2%                | Não iniciado · início previsto em mar/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 35                                            | PINTURA                         | <div><div></div></div> 15,0%  | 0,0%               | R\$ 396.469               | 306                | R\$ 396.469                | <div><div></div></div> 0,8%   | 10,1%                | Massa corrida: até térreo, executando 7º pav.<br>Anotação do modelo anterior: TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36                                            | PAISAGISMO                      | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%               | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%                 | Não iniciado · início previsto em jun/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37                                            | LIMPEZA FINAL DE OBRA           | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%               | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%                 | Não iniciado · início previsto em mar/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração) |                                 |                               |                    | R\$ 47.604.450            | 36.707             | R\$ 47.604.450             | <div><div></div></div> 100,0% |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 38                                            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO           | —                             |                    | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0%   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   |                                 |                               |                    | R\$ 47.604.450            | 36.707             | R\$ 47.604.450             | <div><div></div></div> 100,0% |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Execução física = % "Previsto" acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision em dezembro; no corte = % "Realizado". Situação em 31/12 = atividades do cronograma de atividades concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.

# Botânico · Gantt do cronograma

2.387 atividades do Prevision (situação em 24/09/26) · PL → pacote de trabalho → pavimento/tarefa · clique na seta para abrir



| PL / pacote / pavimento         | Início   | Término  | Real. | 2025 |     | 2026 |     | 2027 |     |          |     | 2028 |     |     |     | 2029 |          |     |     |
|---------------------------------|----------|----------|-------|------|-----|------|-----|------|-----|----------|-----|------|-----|-----|-----|------|----------|-----|-----|
|                                 |          |          |       | jul  | out | jan  | abr | jul  | out | jan      | abr | jul  | out | jan | abr | jul  | out      | jan | abr |
| ▼ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL          | 13/04/26 | 09/04/27 | 83%   |      |     |      |     |      |     | 24/09/26 |     |      |     |     |     |      | 31/12/27 |     |     |
| ▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL          | 13/04/26 | 07/08/26 | 99%   |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 1 | 13/04/26 | 27/04/26 | 100%  |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | 22/04/26 | 15/05/26 | 100%  |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | 08/05/26 | 10/07/26 | 100%  |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - NUCLEO | 25/05/26 | 03/07/26 | 100%  |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 4 | 01/06/26 | 10/07/26 | 100%  |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | 16/06/26 | 17/07/26 | 100%  |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 6 | 03/07/26 | 17/07/26 | 100%  |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ CINTAS FASE 1                 | 21/09/26 | 01/10/26 | 0%    |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ CINTAS FASE 2                 | 02/10/26 | 16/10/26 | 0%    |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ CINTAS FASE 3                 | 19/10/26 | 30/10/26 | 0%    |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ CINTAS FASE 4                 | 19/10/26 | 30/10/26 | 0%    |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ FUNDAÇÃO - PROJEÇÃO IGREJA    | 15/03/27 | 25/03/27 | 0%    |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ BLOCOS E CINTAS - IGREJA      | 29/03/27 | 09/04/27 | 0%    |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▼ ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  | 15/06/26 | 11/02/28 | 25%   |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ ESTRUTURA                     | 15/06/26 | 11/02/28 | 16%   |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ Estrutura Térreo - Fase 2     | 13/07/26 | 17/08/26 | 100%  |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ Estrutura Térreo - Fase 3     | 21/07/26 | 07/08/26 | 100%  |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ Estrutura Térreo - Fase 4     | 04/08/26 | 26/08/26 | 100%  |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ Estrutura Mezanino            | 04/08/26 | 28/08/26 | 100%  |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ Estrutura 2º Pav - Fase 1     | 17/08/26 | 28/09/26 | 60%   |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ ESTRUTURA IGREJA              | 18/01/27 | 03/05/27 | 0%    |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ ESTRUTURA - PISO ARMADO       | 08/02/27 | 11/03/27 | 0%    |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▼ PINTURA 5 inferidos           | 19/10/26 | 02/04/29 | 0%    |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO | 19/10/26 | 10/05/27 | 0%    |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ MASSA CORRIDA                 | 24/11/27 | 01/12/28 | 0%    |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ PINTURA 1º DEMÃO              | 11/01/28 | 05/01/29 | 0%    |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ PINTURA 2º DEMÃO              | 27/03/28 | 27/02/29 | 0%    |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |
| ▶ TEXTURA - 1º DEMÃO            | 17/04/28 | 26/01/29 | 0%    |      |     |      |     |      |     |          |     |      |     |     |     |      |          |     |     |

| PL / pacote / pavimento                      | Início   | Término  | Real. | 2025 |     | 2026 |     |     |     | 2027     |     |     |     | 2028     |     |     |     | 2029 |     |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|------|-----|
|                                              |          |          |       | jul  | out | jan  | abr | jul | out | jan      | abr | jul | out | jan      | abr | jul | out | jan  | abr |
| ▶ PINTURA DE TUBULAÇÕES (PAREDE E TETO)      | 17/04/28 | 15/01/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     | 24/09/26 |     |     |     | 31/12/27 |     |     |     |      |     |
| ▶ PINTURA 3º DEMÃO                           | 02/05/28 | 02/04/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ PINTURA - CORRIMÃO                         | 05/05/28 | 01/06/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ TEXTURA - 2º E 3º DEMÃO                    | 09/06/28 | 09/03/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE -... ⓘ     | 22/06/28 | 19/07/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE -... ⓘ     | 03/08/28 | 31/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE -... ⓘ     | 09/10/28 | 07/11/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▼ INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS ⓘ 3 inferidos  | 11/01/27 | 23/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - INFRAS ENTERR... | 11/01/27 | 05/02/27 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ PRUMADA HIDROSSANITÁRIA                    | 05/04/27 | 26/05/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA               | 30/04/27 | 22/05/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO DE GÁS                        | 30/04/27 | 22/05/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ SHAFT INTERNO INST. HIDRÁULICAS ⓘ          | 09/06/27 | 29/06/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA                    | 28/06/27 | 23/02/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL              | 16/07/27 | 07/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL          | 16/07/27 | 07/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                    | 24/09/27 | 30/05/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ RESERVATÓRIO                               | 19/10/27 | 21/07/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ PRESSURIZAÇÃO (HIDRÁULICA) ⓘ               | 22/06/28 | 12/07/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ MONTAGEM - BOILERS E AQUECEDORES ⓘ         | 24/07/28 | 23/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▼ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ⓘ 3 inferidos        | 18/01/27 | 12/03/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ ENTRADA DE ENERGIA                         | 18/01/27 | 05/02/27 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ INFRA ELÉTRICA - TETO                      | 03/02/27 | 15/10/27 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO             | 30/04/27 | 22/05/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ PRUMADA ELÉTRICA - INFRA                   | 09/06/27 | 30/06/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL     | 16/07/27 | 07/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                      | 24/09/27 | 30/05/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ FIAÇÃO ELÉTRICA                            | 01/10/27 | 24/10/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ PRUMADA ELÉTRICA - CABOS                   | 01/10/27 | 25/10/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ FIAÇÃO TELECOM/DADOS                       | 01/10/27 | 26/10/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |

| PL / pacote / pavimento                    | Início   | Término  | Real. | 2025 |     | 2026 |     |     |     | 2027 |     |     |          | 2028 |     |     |     | 2029     |     |
|--------------------------------------------|----------|----------|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|----------|------|-----|-----|-----|----------|-----|
|                                            |          |          |       | jul  | out | jan  | abr | jul | out | jan  | abr | jul | out      | jan  | abr | jul | out | jan      | abr |
| ▶ GERADOR/TRANSFORMADOR ⓘ                  | 17/01/28 | 01/03/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     | 24/09/26 |      |     |     |     | 31/12/27 |     |
| ▶ DISJUNTORES / MIOLOS ⓘ                   | 21/01/28 | 05/02/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SENSORES      | 21/01/28 | 28/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS                 | 11/02/28 | 25/01/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ ACABAMENTOS ELÉTRICOS                    | 07/04/28 | 12/03/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS ⓘ           | 19/05/28 | 09/02/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ SPDA                                     | 03/08/28 | 21/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▼ ALVENARIA                                | 16/03/27 | 21/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ ALVENARIA                                | 16/03/27 | 04/05/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ ENCUNHAMENTO                             | 07/04/27 | 27/04/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ ALVENARIA - ISOLAMENTO DE CONTENÇÕES     | 09/04/27 | 11/05/27 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ DRYWALL 1º FACE                          | 05/07/27 | 25/07/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ DRYWALL 2º FACE                          | 29/07/27 | 21/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ DRYWALL                                  | 10/09/27 | 02/03/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ SHAFT                                    | 19/10/27 | 26/06/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▼ INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO ⓘ inferido  | 30/03/27 | 14/09/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ PRUMADA DE INCÊNDIO                      | 30/03/27 | 18/04/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO                  | 04/10/27 | 26/05/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ INSTALAÇÕES INCÊNDIO                     | 31/01/28 | 18/02/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ PRESSURIZAÇÃO (INCÊNDIO) ⓘ               | 24/08/28 | 14/09/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▼ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES        | 16/04/27 | 21/06/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ TALISCAMENTO                             | 16/04/27 | 09/05/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ REBOCO INTERNO                           | 26/05/27 | 21/06/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▼ ESQUADRIAS ⓘ inferidos                   | 13/05/27 | 25/01/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ CONTRAMARCO                              | 13/05/27 | 02/06/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ ESQUADRIA DE ALUMÍNIO                    | 07/12/27 | 17/11/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ ESQUADRIA MADEIRA                        | 04/02/28 | 12/01/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISE - F... ⓘ | 10/05/28 | 21/06/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - ... ⓘ | 22/06/28 | 02/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |
| ▶ BRISE                                    | 26/07/28 | 25/01/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |

| PL / pacote / pavimento                               | Início   | Término  | Real. | 2025 |     | 2026 |     |     |     | 2027     |     |     |     | 2028     |     |     |     | 2029 |     |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|------|-----|
|                                                       |          |          |       | jul  | out | jan  | abr | jul | out | jan      | abr | jul | out | jan      | abr | jul | out | jan  | abr |
| ▶ <b>INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - ...</b> ⓘ     | 18/08/28 | 06/10/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     | 24/09/26 |     |     |     | 31/12/27 |     |     |     |      |     |
| ▼ <b>SERRALHERIA</b> 1 inferido                       | 14/06/27 | 16/01/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>CHUMBAMENTO DE PCF</b>                           | 14/06/27 | 12/01/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>SERRALHERIA</b>                                  | 02/08/27 | 29/06/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>INSTALAÇÃO DE PCF (FOLHA)</b>                    | 14/02/28 | 16/01/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO (SERRALHERIA)</b>         | 22/02/28 | 04/05/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>PONTOS DE ANCORAGEM INOX</b> ⓘ                   | 29/03/28 | 04/04/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▼ <b>REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS</b>              | 22/06/27 | 07/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>CONTRAPISO</b>                                   | 22/06/27 | 07/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▼ <b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b> 4 inferidos            | 16/07/27 | 05/02/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO</b>             | 16/07/27 | 07/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>PRESSURIZAÇÃO (VENTILAÇÃO)</b>                   | 19/10/27 | 06/12/27 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>INST. MÓDULOS CHURRASQUEIRA</b> ⓘ                | 31/01/28 | 04/02/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>COMUNICAÇÃO E ALARME</b> ⓘ                       | 01/03/28 | 05/02/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>AQUECEDOR (SAUNA)</b> ⓘ                          | 01/06/28 | 14/06/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>EQUIPAMENTOS - PISCINA</b> ⓘ                     | 02/08/28 | 01/09/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▼ <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                            | 11/08/27 | 01/09/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                            | 11/08/27 | 01/09/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▼ <b>REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHA...</b> 7 inferidos | 18/08/27 | 27/02/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F1 +...</b>     | 18/08/27 | 08/09/27 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>FACHADA LOJA</b>                                 | 26/08/27 | 18/01/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>FACHADA AERADA - F1 + F2 (1º ETAPA)</b>          | 09/09/27 | 05/11/27 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F3 +...</b>     | 14/10/27 | 04/11/27 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>FACHADA AERADA - F3 + F4 (1º ETAPA)</b>          | 08/11/27 | 12/01/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F...</b> ⓘ     | 08/11/27 | 06/12/27 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F5 (...)</b>    | 14/12/27 | 11/01/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F...</b> ⓘ     | 05/01/28 | 01/02/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>FACHADA AERADA - F5 (1º ETAPA)</b>               | 13/01/28 | 22/03/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F1 +...</b>     | 14/02/28 | 10/03/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ <b>REBOCO EXTERNO</b>                               | 03/03/28 | 25/05/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |      |     |

| PL / pacote / pavimento                     | Início   | Término  | Real. | 2025 |     | 2026 |     |     |     | 2027 |     |     |     | 2028 |     |     |     | 2029 |     |
|---------------------------------------------|----------|----------|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|
|                                             |          |          |       | jul  | out | jan  | abr | jul | out | jan  | abr | jul | out | jan  | abr | jul | out | jan  | abr |
| ▶ FACHADA AERADA - F1 + F2 (2º ETAPA)       | 13/03/28 | 25/04/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F...    | 15/03/28 | 19/04/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F3 +...  | 24/03/28 | 24/04/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ TEXTURA - EXTERNA                         | 27/03/28 | 27/02/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F...    | 17/04/28 | 09/05/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ FACHADA AERADA - F3 + F4 (2º ETAPA)       | 26/04/28 | 07/06/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F5 (...) | 10/05/28 | 06/06/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F...    | 31/05/28 | 21/06/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ FACHADA AERADA - F5 (2º ETAPA)            | 08/06/28 | 27/07/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ FACHADA                                   | 16/06/28 | 19/09/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F...    | 20/07/28 | 17/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ FACHADA EMBASAMENTO                       | 18/08/28 | 04/01/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▼ REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO               | 24/08/27 | 15/02/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE           | 24/08/27 | 15/09/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO            | 06/09/27 | 28/09/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ REVESTIMENTO DE GRANITO PISO              | 20/09/27 | 04/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ BANCADAS                                  | 20/09/27 | 11/10/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PISO VINÍLICO / LAMINADO                  | 24/01/28 | 03/01/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ RODAPÉ MADEIRA / PVC                      | 17/02/28 | 23/01/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ POLIMENTO DE PISO                         | 24/03/28 | 15/12/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PISO EMBORRACHADO                         | 18/05/28 | 31/05/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ REVESTIMENTO ACABAMENTO                   | 31/05/28 | 15/02/29 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PISO ELEVADO                              | 11/09/28 | 26/10/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▼ ELEVADORES                                | 20/09/27 | 09/10/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ INSTALAÇÃO DE ADUELAS (ELEVADORES)        | 20/09/27 | 13/07/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ PREPARAÇÃO - POÇO DE ELEVADOR             | 14/02/28 | 18/05/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ MONTAGEM - ELEVADOR 1                     | 19/05/28 | 05/07/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ MONTAGEM - ELEVADOR 2                     | 06/07/28 | 22/08/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▶ MONTAGEM - ELEVADOR 3                     | 23/08/28 | 09/10/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |
| ▼ FORRO                                     | 15/10/27 | 03/11/28 | 0%    |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |

| PL / pacote / pavimento                              | Início   | Término  | Real. | 2025 |     | 2026 |     |     |          | 2027 |     |     |     | 2028     |     |     |     | 2029 |     |
|------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|-----|------|-----|-----|----------|------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|------|-----|
|                                                      |          |          |       | jul  | out | jan  | abr | jul | out      | jan  | abr | jul | out | jan      | abr | jul | out | jan  | abr |
| ▶ FORRO                                              | 15/10/27 | 03/11/28 | 0%    |      |     |      |     |     | 24/09/26 |      |     |     |     | 31/12/27 |     |     |     |      |     |
| ▼ PAVIMENTAÇÃO <span>2 inferidos</span>              | 30/11/27 | 01/03/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ PASSEIOS, MURETAS E RAMPAS                         | 30/11/27 | 09/03/28 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ DEMARCAÇÃO DE VAGAS <span>i</span>                 | 19/05/28 | 01/03/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ QUADRA DE RECREAÇÃO <span>i</span>                 | 08/08/28 | 10/10/28 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▼ SEM PL (gestão / entrega) <span>7 inferidos</span> | 11/02/28 | 30/04/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS <span>i</span>        | 11/02/28 | 09/02/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ CHECKLIST <span>i</span>                           | 24/04/28 | 19/03/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ CHECKLIST FINAL <span>i</span>                     | 31/10/28 | 13/04/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ ENXOVAL <span>i</span>                             | 17/11/28 | 02/04/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ VISTORIA APTOS <span>i</span>                      | 08/01/29 | 18/04/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ HABITE-SE <span>i</span>                           | 01/03/29 | 02/04/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ ENTREGA SÍNDICO <span>i</span>                     | 03/04/29 | 30/04/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▼ MARCENARIA                                         | 14/02/28 | 16/01/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ MARCENARIA - SHAFTS                                | 14/02/28 | 16/01/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▼ LOUÇAS SANITÁRIAS                                  | 01/03/28 | 09/02/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ LOUÇAS                                             | 01/03/28 | 05/02/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ METAIS                                             | 01/03/28 | 05/02/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ INSTALAÇÃO DE METAIS                               | 19/05/28 | 09/02/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▼ LIMPEZA FINAL DE OBRA                              | 14/03/28 | 13/04/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ LIMPEZA GROSSA                                     | 14/03/28 | 14/02/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ LIMPEZA FINA                                       | 15/05/28 | 13/04/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ LIMPEZA                                            | 26/06/28 | 02/04/29 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▼ PAISAGISMO                                         | 08/06/28 | 06/12/28 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ IRRIGAÇÃO                                          | 08/06/28 | 25/10/28 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |
| ▶ PAISAGISMO                                         | 16/06/28 | 06/12/28 | 0%    |      |     |      |     |     |          |      |     |     |     |          |     |     |     |      |     |

## PACOTES NÃO DESCRITOS DE FORMA EXPRESSA NA CURVA DO PREVISION (45)

| PL                          | Pacote                                                    | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNDAÇÃO PROFUNDA           | <b>VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - CENTRAL DE POLÍMEROS)</b> | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.                                                                           |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA           | <b>VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 1º ETAPA)</b>  | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.                                                                           |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA           | <b>VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 2º ETAPA)</b>  | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.                                                                           |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA           | <b>VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 1º ETAPA)</b>     | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.                                                                           |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA           | <b>VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 2º ETAPA)</b>     | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.                                                                           |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA           | <b>VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA BOM JESUS)</b>        | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.                                                                           |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA           | <b>VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 3º ETAPA)</b>     | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.                                                                           |
| PINTURA                     | <b>TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO</b>                      | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.                               |
| PINTURA                     | <b>MASSA CORRIDA</b>                                      | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: massa, corrida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 28 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES. |
| PINTURA                     | <b>TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F1 + F2</b>          | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.                               |
| PINTURA                     | <b>TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F3 + F4</b>          | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.                               |
| PINTURA                     | <b>TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F5</b>               | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.                               |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | <b>SHAFT INTERNO INST. HIDRÁULICAS</b>                    | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: shaft). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 18 – ALVENARIA; 27 – MARCENARIA.                                                            |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | <b>PRESSURIZAÇÃO (HIDRÁULICA)</b>                         | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: pressurização). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 34 – LOUÇAS E METAIS.                                   |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | <b>MONTAGEM - BOILERS E AQUECEDORES</b>                   | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: boilers). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                                        |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       | <b>GERADOR/TRANSFORMADOR</b>                              | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: gerador). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.                                                 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       | <b>DISJUNTORES / MIOLOS</b>                               | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: disjuntores, miolos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                                  |

| PL                              | Pacote                                                      | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           | <b>INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS</b>                         | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: carregador, veículos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.                                                         |
| INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO    | <b>PRESSURIZAÇÃO (INCÊNDIO)</b>                             | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO (termo sem correspondência: pressurização). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 34 – LOUÇAS E METAIS.                                        |
| ESQUADRIAS                      | <b>INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISE - F1 + F2</b>            | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 25 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: shadowbox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                                                             |
| ESQUADRIAS                      | <b>INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - F3 + F4</b>           | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 25 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: shadowbox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                                                             |
| ESQUADRIAS                      | <b>INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - F5</b>                | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 25 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: shadowbox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).                                                                                                                                             |
| SERRALHERIA                     | <b>PONTOS DE ANCORAGEM INOX</b>                             | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 26 – SERRALHERIA (termo sem correspondência: pontos, ancoragem, inox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.                      |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS           | <b>INST. MÓDULOS CHURRASQUEIRA</b>                          | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: módulos, churrasqueira). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.                                                                |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS           | <b>COMUNICAÇÃO E ALARME</b>                                 | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: comunicacao, alarme). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 09 – CONSULTORIAS (OBRAS); 22 – INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA. |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS           | <b>AQUECEDOR (SAUNA)</b>                                    | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: aquecedor). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS.                                                                   |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS           | <b>EQUIPAMENTOS - PISCINA</b>                               | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: equipamentos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 10 – MÃO DE OBRA PRÓPRIA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.     |
| REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | <b>PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F1 + F2 (1ª ETAPA)</b> | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.                                               |
| REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | <b>PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F3 + F4 (1ª ETAPA)</b> | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.                                               |
| REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | <b>PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F5 (1ª ETAPA)</b>      | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.                                               |
| REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | <b>TEXTURA - EXTERNA</b>                                    | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: textura). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS.                                                                              |
| REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | <b>PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F1 + F2 (2ª ETAPA)</b> | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.                                               |
| REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | <b>PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F3 + F4 (2ª ETAPA)</b> | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.                                               |
| REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | <b>PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F5 (2ª ETAPA)</b>      | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.                                               |

| PL                          | Pacote                                    | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO | <b>POLIMENTO DE PISO</b>                  | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO (termo sem correspondência: polimento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO. |
| ELEVADORES                  | <b>INSTALAÇÃO DE ADUELAS (ELEVADORES)</b> | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – ELEVADORES (termo sem correspondência: aduelas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.                                                                        |
| PAVIMENTAÇÃO                | <b>DEMARCAÇÃO DE VAGAS</b>                | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTAÇÃO (termo sem correspondência: demarcacao, vagas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 18 – ALVENARIA; 35 – PINTURAS.                                              |
| PAVIMENTAÇÃO                | <b>QUADRA DE RECREAÇÃO</b>                | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTAÇÃO (termo sem correspondência: quadra, recreacao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.              |
| SEM PL (gestão / entrega)   | <b>PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS</b>       | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                       |
| SEM PL (gestão / entrega)   | <b>CHECKLIST</b>                          | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                       |
| SEM PL (gestão / entrega)   | <b>CHECKLIST FINAL</b>                    | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                       |
| SEM PL (gestão / entrega)   | <b>ENXOVAL</b>                            | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                       |
| SEM PL (gestão / entrega)   | <b>VISTORIA APTOS</b>                     | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                       |
| SEM PL (gestão / entrega)   | <b>HABITE-SE</b>                          | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                       |
| SEM PL (gestão / entrega)   | <b>ENTREGA SÍNDICO</b>                    | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.                                                                                                                                                                                                                       |

Fonte: aba CRONOGRAMA.ATIVIDADES (export do Prevision). Datas de início e término e % realizado vêm do Prevision; nos níveis PL e pacote o % é a média dos itens ponderada pela duração. O cronograma é o mesmo nos três cenários (os cenários mudam as curvas financeiras, não as datas das atividades).
