


Ed Jardim · Esquemático de avanço por pavimento

Corte ilustrativo (sem escala): cada célula é o avanço da PL no pavimento, pelas atividades do cronograma do Prevision · passe o mouse numa célula para ver o detalhe

Concluído Em andamento (50% a 99%) Em andamento (1% a 49%) A executar Sem atividade da PL no pavimento


SITUAÇÃO EM 07/10/2026 (realizado do cronograma)

Pavimentos 26% Infraestrutura 94% Fachada 0%

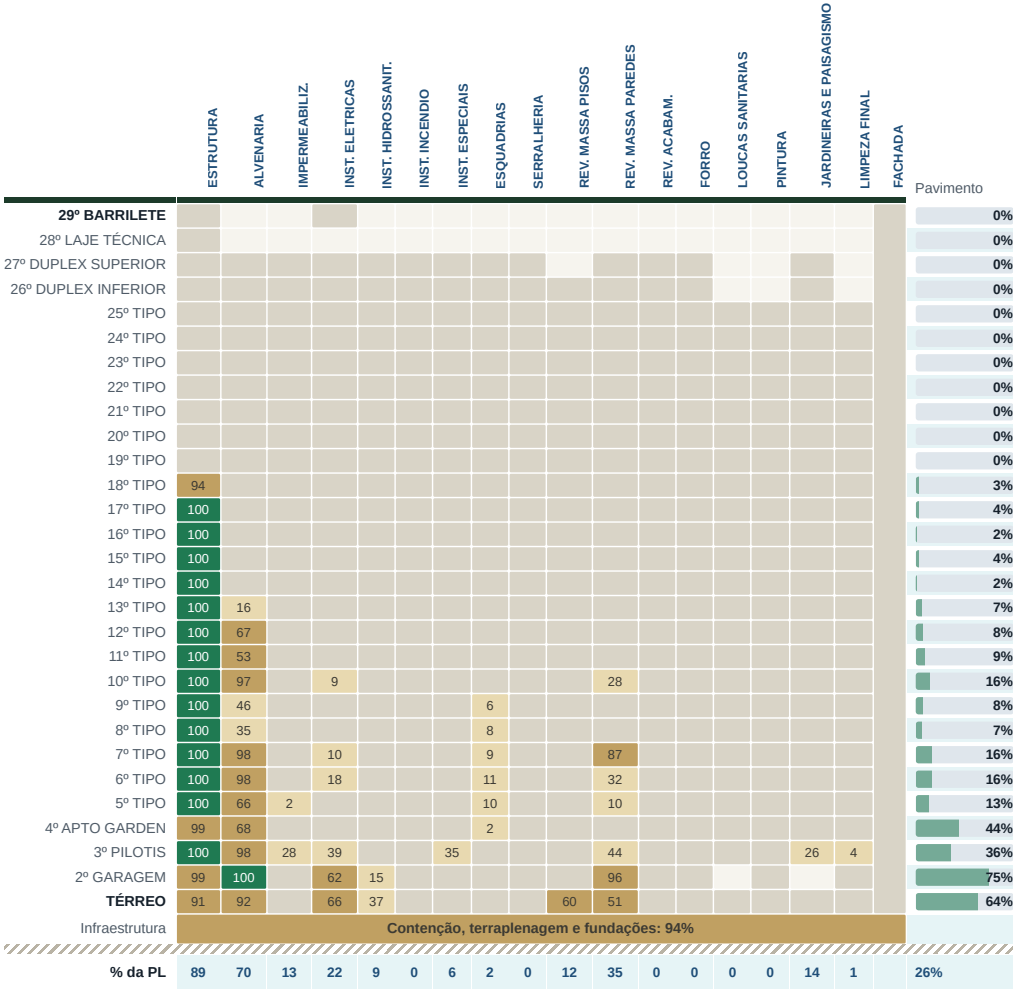

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2026

Pavimentos 34% Infraestrutura 96% Fachada 18%

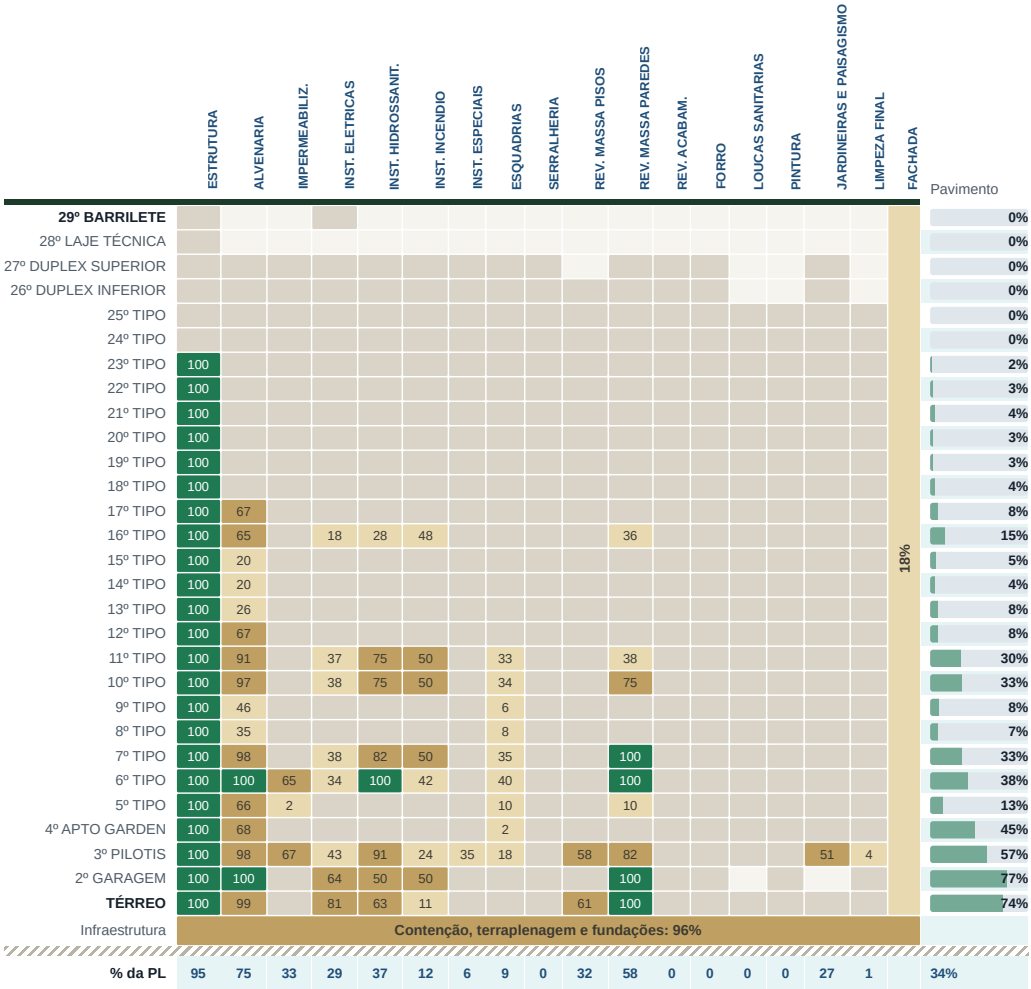

RETRATO: PREVISÃO PARA 31/12/2027

Pavimentos 76% Infraestrutura 100% Fachada 86%

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELÉTRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. ACABAM.	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100															100%
28º LAJE TÉCNICA	100																		100%
27º DUPLEX SUPERIOR	100	97		79	100	46		36			57								52%
26º DUPLEX INFERIOR	100	97		79	77	48		100			100								52%
25º TIPO	100	97	48	38	100	46		35			100								34%
24º TIPO	100	100	85	40	100	48		37		63	100								40%
23º TIPO	100	100	100	51	100	42	55	37		100	100								43%
22º TIPO	100	100	100	49	100	48	43	35		100	100	31							47%
21º TIPO	100	100	100	51	100	48	45	33		100	100	47							50%
20º TIPO	100	100	100	72	100	46	61	36		100	100	49	55			42			60%
19º TIPO	100	100	100	73	100	50	63	31		100	100	47	50			44			60%
18º TIPO	100	100	100	74	100	44	63	36		100	100	45	48			44			61%
17º TIPO	100	100	100	70	100	48	56	30		100	100	48	51			42			59%
16º TIPO	100	100	100	76	100	48	68	35		100	100	45	50			43			62%
15º TIPO	100	100	100	67	100	52	59	49		100	100	48							56%
14º TIPO	100	100	100	72	100	46	59	72		100	100	46	44						59%
13º TIPO	100	100	100	50	100	52	43	74		100	100	43							54%
12º TIPO	100	100	100	71	100	50	59	76		100	100	48	51			49			64%
11º TIPO	100	100	100	86	100	50	100	100		100	100	77	100			40	85		80%
10º TIPO	100	100	100	86	100	50	100	100		100	100	96	100			40	100		83%
9º TIPO	100	100	100	70	100	44	59	74		100	100	64	51			41			65%
8º TIPO	100	100	100	71	100	44	59	100		100	100	70	95			40			72%
7º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	71	98%
6º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
5º TIPO	100	100	100	85	100	44	94	100		100	100	77	100			41			78%
4º APTO GARDEN	100	100	100	86	100	44	100	100		100	100	83	100			40	100		88%
3º PILOTIS	100	100	100	93	100	74	97	100		100	100	90	100	42		82	100	56	95%
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	50	100	35		100	100	88	35			61		29	94%
TÉRREO	100	99	100	88	94	38	59	11		90	100	63	50	77	11	82			88%
Infraestrutura	Contenção, terraplenagem e fundações: 100%																		
% da PL	100	100	95	78	98	53	69	66	8	93	99	61	53	15	41	72	17		76%

Pavimentos: nº na coluna N da aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (lote do Prevision). PLs com atividades em pelo menos 3 pavimentos; infraestrutura = contenção, terraplenagem, fundação profunda, fundação superficial; fachada = revestimento diversos fachada (lotes sem pavimento). Previsão: o saldo de cada tarefa segue linear da data da situação (ou do início planejado) até o término planejado. Esquema ilustrativo, sem escala, não substitui o levantamento em campo.
