
# Botânico · Gantt do cronograma


2.387 atividades do Prevision (situação em 24/09/26) · PL → pacote de trabalho → pavimento/tarefa · clique na seta para abrir

Planejado (início → término) · Realizado (% do Prevision) · Concluído · **Não descrito de forma expressa na curva do Prevision** (notas na última página) · Previsto para a data (atraso > 5 p.p.) · Situação 24/09/26 · 31/12/2027


| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▼ SERVIÇOS INICIAIS | 23/06/25 | 25/07/25 | 100% |
| ► LOCAÇÃO DE OBRA | 23/06/25 | 04/07/25 | 100% |
| ► DEMOLIÇÃO | 07/07/25 | 25/07/25 | 100% |
| ▼ CONTENÇÃO | 21/07/25 | 23/12/26 | 50% |
| ► CONTENÇÕES EM ESTACAS | 21/07/25 | 14/08/25 | 97% |
| ► CONTENÇÃO - BLOCO DO ELEVADOR | 27/04/26 | 26/06/26 | 100% |
| ► FECHAMENTO DE CORTINA - CONTENÇÕES | 19/10/26 | 30/11/26 | 0% |
| ► TRATAMENTO DE CONTENÇÕES | 13/11/26 | 23/12/26 | 0% |
| ▼ FUNDAÇÃO PROFUNDA (7 inferidos) | 01/09/25 | 03/03/26 | 100% |
| ► VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - CENTR… ⓘ | 01/09/25 | 18/09/25 | 100% |
| ► VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA M… ⓘ | 08/09/25 | 03/10/25 | 100% |
| ► VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA M… ⓘ | 15/09/25 | 06/10/25 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO PROFUNDA | 18/09/25 | 02/03/26 | 100% |
| ► VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IP… ⓘ | 22/09/25 | 13/10/25 | 100% |
| ► VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IP… ⓘ | 06/10/25 | 17/10/25 | 100% |
| ► VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA B… ⓘ | 13/10/25 | 27/10/25 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO PROFUNDA - MEDIÇÃO | 13/10/25 | 03/03/26 | 100% |
| ► VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IP… ⓘ | 21/10/25 | 03/11/25 | 100% |
| ▼ TERRAPLENAGEM | 03/03/26 | 16/10/26 | 59% |
| ► TERRAPLENAGEM (FASE 1) | 03/03/26 | 27/04/26 | 100% |
| ► TERRAPLENAGEM (FASE 2) | 08/09/26 | 16/10/26 | 0% |

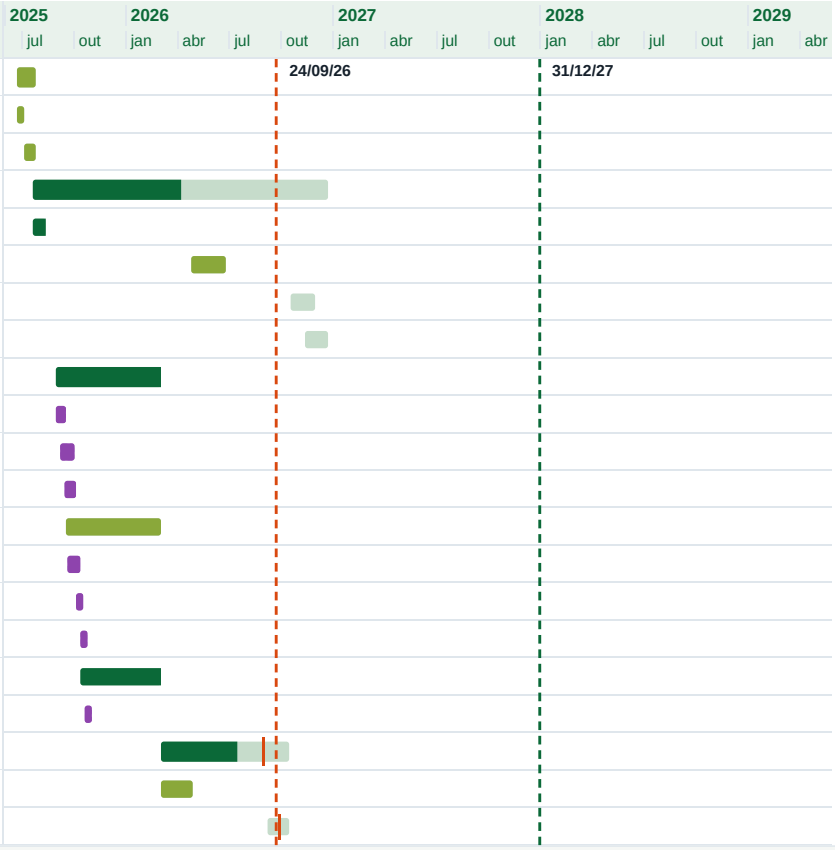

| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▼ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | 13/04/26 | 09/04/27 | 83% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | 13/04/26 | 07/08/26 | 99% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 1 | 13/04/26 | 27/04/26 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2 | 22/04/26 | 15/05/26 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3 | 08/05/26 | 10/07/26 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - NUCLEO | 25/05/26 | 03/07/26 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 4 | 01/06/26 | 10/07/26 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5 | 16/06/26 | 17/07/26 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 6 | 03/07/26 | 17/07/26 | 100% |
| ► CINTAS FASE 1 | 21/09/26 | 01/10/26 | 0% |
| ► CINTAS FASE 2 | 02/10/26 | 16/10/26 | 0% |
| ► CINTAS FASE 3 | 19/10/26 | 30/10/26 | 0% |
| ► CINTAS FASE 4 | 19/10/26 | 30/10/26 | 0% |
| ► FUNDAÇÃO - PROJEÇÃO IGREJA | 15/03/27 | 25/03/27 | 0% |
| ► BLOCOS E CINTAS - IGREJA | 29/03/27 | 09/04/27 | 0% |
| ▼ ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 15/06/26 | 11/02/28 | 25% |
| ► ESTRUTURA | 15/06/26 | 11/02/28 | 16% |
| ► Estrutura Térreo - Fase 2 | 13/07/26 | 17/08/26 | 100% |
| ► Estrutura Térreo - Fase 3 | 21/07/26 | 07/08/26 | 100% |
| ► Estrutura Térreo - Fase 4 | 04/08/26 | 26/08/26 | 100% |
| ► Estrutura Mezanino | 04/08/26 | 28/08/26 | 100% |
| ► Estrutura 2º Pav - Fase 1 | 17/08/26 | 28/09/26 | 60% |
| ► ESTRUTURA IGREJA | 18/01/27 | 03/05/27 | 0% |
| ► ESTRUTURA - PISO ARMADO | 08/02/27 | 11/03/27 | 0% |
| ▼ PINTURA 5 inferidos | 19/10/26 | 02/04/29 | 0% |
| ► TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO | 19/10/26 | 10/05/27 | 0% |
| ► MASSA CORRIDA | 24/11/27 | 01/12/28 | 0% |
| ► PINTURA 1º DEMÃO | 11/01/28 | 05/01/29 | 0% |
| ► PINTURA 2º DEMÃO | 27/03/28 | 27/02/29 | 0% |
| ► TEXTURA - 1º DEMÃO | 17/04/28 | 26/01/29 | 0% |

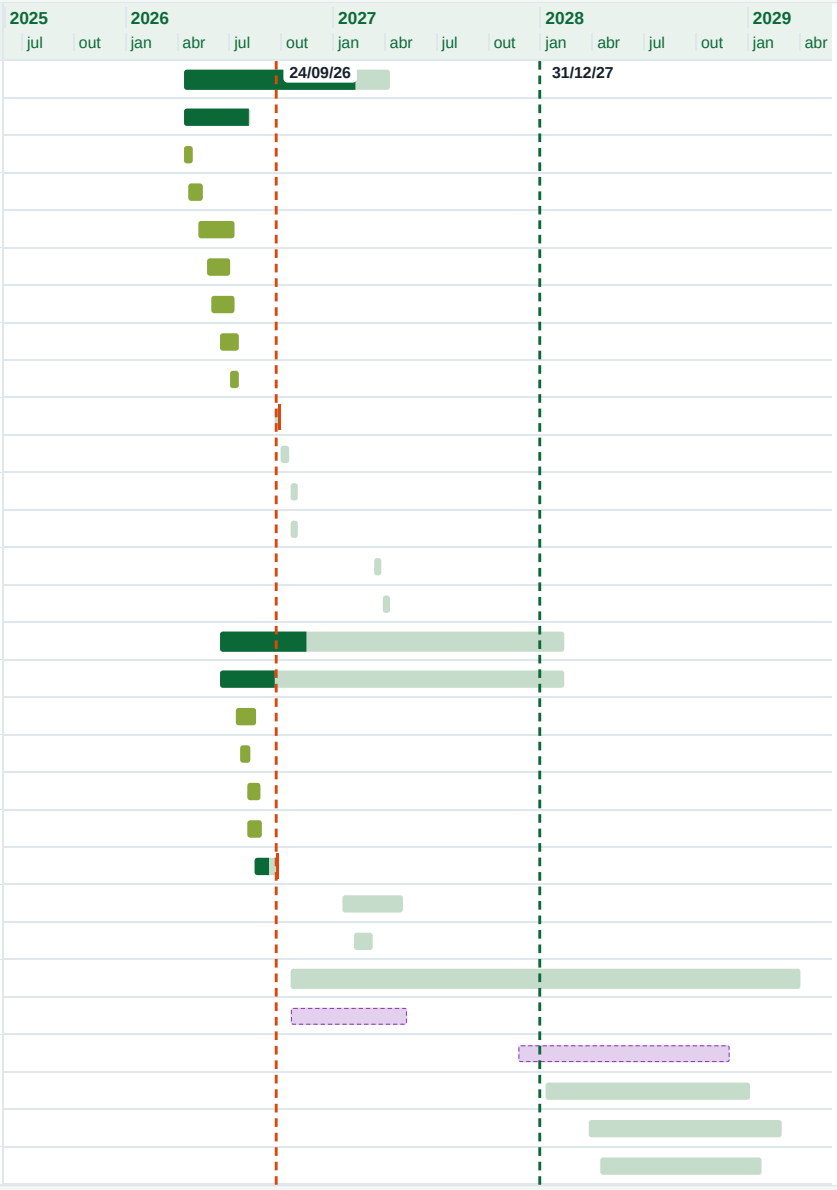

| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| PINTURA DE TUBULAÇÕES (PARED E TETO) | 17/04/28 | 15/01/29 | 0% |
| PINTURA 3º DEMÃO | 02/05/28 | 02/04/29 | 0% |
| PINTURA - CORRIMÃO | 05/05/28 | 01/06/28 | 0% |
| TEXTURA - 2º E 3º DEMÃO | 09/06/28 | 09/03/29 | 0% |
| TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE -... | 22/06/28 | 19/07/28 | 0% |
| TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE -... | 03/08/28 | 31/08/28 | 0% |
| TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE -... | 09/10/28 | 07/11/28 | 0% |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (3 inferidos) | 11/01/27 | 23/08/28 | 0% |
| DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - INFRAS ENTERR... | 11/01/27 | 05/02/27 | 0% |
| PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | 05/04/27 | 26/05/28 | 0% |
| DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 30/04/27 | 22/05/28 | 0% |
| DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | 30/04/27 | 22/05/28 | 0% |
| SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | 09/06/27 | 29/06/28 | 0% |
| DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA | 28/06/27 | 23/02/28 | 0% |
| DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL | 16/07/27 | 07/08/28 | 0% |
| DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL | 16/07/27 | 07/08/28 | 0% |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 24/09/27 | 30/05/28 | 0% |
| RESERVATÓRIO | 19/10/27 | 21/07/28 | 0% |
| PRESSURIZAÇÃO (HIDRÁULICA) | 22/06/28 | 12/07/28 | 0% |
| MONTAGEM - BOILERS E AQUECEDORES | 24/07/28 | 23/08/28 | 0% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (3 inferidos) | 18/01/27 | 12/03/29 | 0% |
| ENTRADA DE ENERGIA | 18/01/27 | 05/02/27 | 0% |
| INFRA ELÉTRICA - TETO | 03/02/27 | 15/10/27 | 0% |
| DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | 30/04/27 | 22/05/28 | 0% |
| PRUMADA ELÉTRICA - INFRA | 09/06/27 | 30/06/28 | 0% |
| DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL | 16/07/27 | 07/08/28 | 0% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 24/09/27 | 30/05/28 | 0% |
| FIAÇÃO ELÉTRICA | 01/10/27 | 24/10/28 | 0% |
| PRUMADA ELÉTRICA - CABOS | 01/10/27 | 25/10/28 | 0% |
| FIAÇÃO TELECOM/DADOS | 01/10/27 | 26/10/28 | 0% |

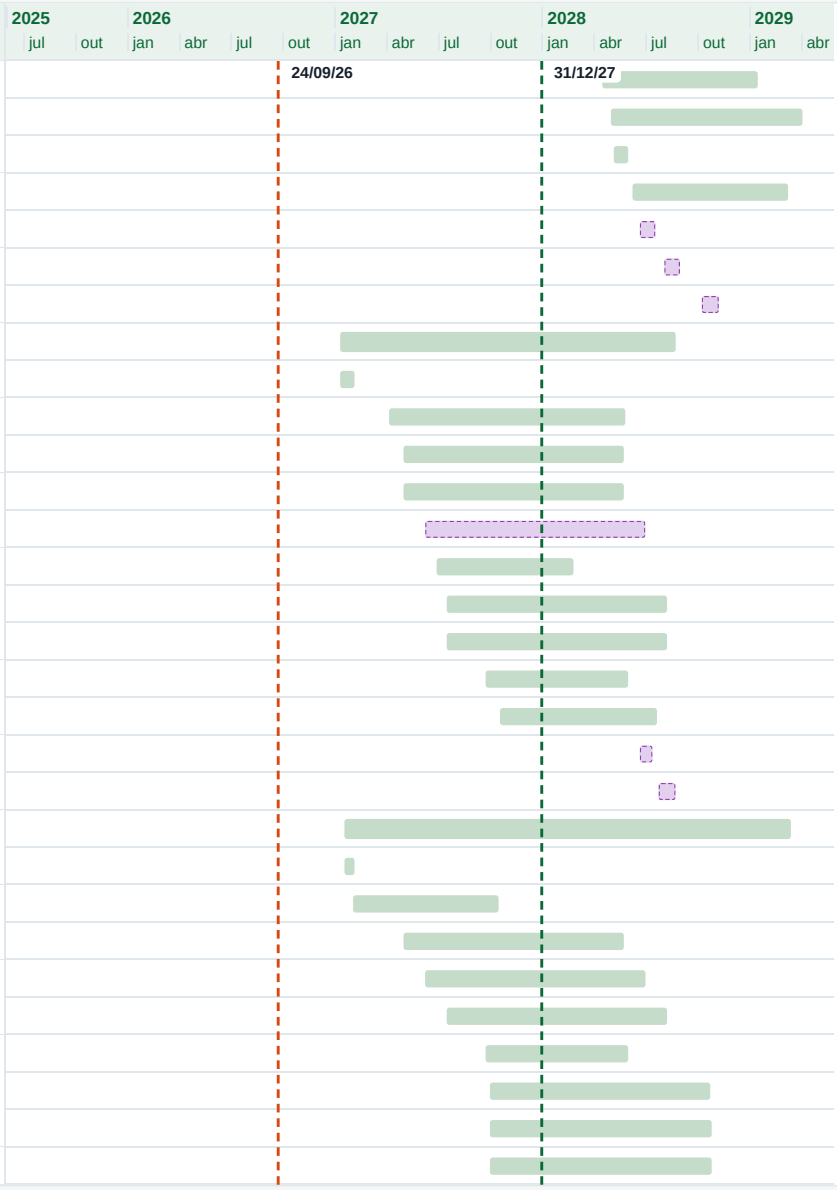


| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ► GERADOR/TRANSFORMADOR | 17/01/28 | 01/03/28 | 0% |
| ► DISJUNTORES / MIOLOS | 21/01/28 | 05/02/29 | 0% |
| ► INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SENSORES | 21/01/28 | 28/08/28 | 0% |
| ► INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | 11/02/28 | 25/01/29 | 0% |
| ► ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 07/04/28 | 12/03/29 | 0% |
| ► INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS | 19/05/28 | 09/02/29 | 0% |
| ► SPDA | 03/08/28 | 21/08/28 | 0% |
| ▼ ALVENARIA | 16/03/27 | 21/08/28 | 0% |
| ► ALVENARIA | 16/03/27 | 04/05/28 | 0% |
| ► ENCUNHAMENTO | 07/04/27 | 27/04/28 | 0% |
| ► ALVENARIA - ISOLAMENTO DE CONTENÇÕES | 09/04/27 | 11/05/27 | 0% |
| ► DRYWALL 1º FACE | 05/07/27 | 25/07/28 | 0% |
| ► DRYWALL 2º FACE | 29/07/27 | 21/08/28 | 0% |
| ► DRYWALL | 10/09/27 | 02/03/28 | 0% |
| ► SHAFT | 19/10/27 | 26/06/28 | 0% |
| ▼ INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO (1 inferido) | 30/03/27 | 14/09/28 | 0% |
| ► PRUMADA DE INCÊNDIO | 30/03/27 | 18/04/28 | 0% |
| ► INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | 04/10/27 | 26/05/28 | 0% |
| ► INSTALAÇÕES INCÊNDIO | 31/01/28 | 18/02/28 | 0% |
| ► PRESSURIZAÇÃO (INCÊNDIO) | 24/08/28 | 14/09/28 | 0% |
| ▼ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES | 16/04/27 | 21/06/28 | 0% |
| ► TALISCAMENTO | 16/04/27 | 09/05/28 | 0% |
| ► REBOCO INTERNO | 26/05/27 | 21/06/28 | 0% |
| ▼ ESQUADRIAS (3 inferidos) | 13/05/27 | 25/01/29 | 0% |
| ► CONTRAMARCO | 13/05/27 | 02/06/28 | 0% |
| ► ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | 07/12/27 | 17/11/28 | 0% |
| ► ESQUADRIA MADEIRA | 04/02/28 | 12/01/29 | 0% |
| ► INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISE - F… | 10/05/28 | 21/06/28 | 0% |
| ► INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - … | 22/06/28 | 02/08/28 | 0% |
| ► BRISE | 26/07/28 | 25/01/29 | 0% |




| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▸ INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - … | 18/08/28 | 06/10/28 | 0% |
| ▾ SERRALHERIA (1 inferido) | 14/06/27 | 16/01/29 | 0% |
| ▸ CHUMBAMENTO DE PCF | 14/06/27 | 12/01/28 | 0% |
| ▸ SERRALHERIA | 02/08/27 | 29/06/28 | 0% |
| ▸ INSTALAÇÃO DE PCF (FOLHA) | 14/02/28 | 16/01/29 | 0% |
| ▸ INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO (SERRALHERIA) | 22/02/28 | 04/05/28 | 0% |
| ▸ PONTOS DE ANCORAGEM INOX | 29/03/28 | 04/04/28 | 0% |
| ▾ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS | 22/06/27 | 07/08/28 | 0% |
| ▸ CONTRAPISO | 22/06/27 | 07/08/28 | 0% |
| ▾ INSTALAÇÕES ESPECIAIS (4 inferidos) | 16/07/27 | 05/02/29 | 0% |
| ▸ INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | 16/07/27 | 07/08/28 | 0% |
| ▸ PRESSURIZAÇÃO (VENTILAÇÃO) | 19/10/27 | 06/12/27 | 0% |
| ▸ INST. MÓDULOS CHURRASQUEIRA | 31/01/28 | 04/02/28 | 0% |
| ▸ COMUNICAÇÃO E ALARME | 01/03/28 | 05/02/29 | 0% |
| ▸ AQUECEDOR (SAUNA) | 01/06/28 | 14/06/28 | 0% |
| ▸ EQUIPAMENTOS - PISCINA | 02/08/28 | 01/09/28 | 0% |
| ▾ IMPERMEABILIZAÇÃO | 11/08/27 | 01/09/28 | 0% |
| ▸ IMPERMEABILIZAÇÃO | 11/08/27 | 01/09/28 | 0% |
| ▾ REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHA… (7 inferidos) | 18/08/27 | 27/02/29 | 0% |
| ▸ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F1 +… | 18/08/27 | 08/09/27 | 0% |
| ▸ FACHADA LOJA | 26/08/27 | 18/01/28 | 0% |
| ▸ FACHADA AERADA - F1 + F2 (1º ETAPA) | 09/09/27 | 05/11/27 | 0% |
| ▸ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F3 +… | 14/10/27 | 04/11/27 | 0% |
| ▸ FACHADA AERADA - F3 + F4 (1º ETAPA) | 08/11/27 | 12/01/28 | 0% |
| ▸ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F… | 08/11/27 | 06/12/27 | 0% |
| ▸ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F5 (… | 14/12/27 | 11/01/28 | 0% |
| ▸ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F… | 05/01/28 | 01/02/28 | 0% |
| ▸ FACHADA AERADA - F5 (1º ETAPA) | 13/01/28 | 22/03/28 | 0% |
| ▸ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F1 +… | 14/02/28 | 10/03/28 | 0% |
| ▸ REBOCO EXTERNO | 03/03/28 | 25/05/28 | 0% |



| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▸ FACHADA AERADA - F1 + F2 (2º ETAPA) | 13/03/28 | 25/04/28 | 0% |
| ▸ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F… ⓘ | 15/03/28 | 19/04/28 | 0% |
| ▸ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F3 +… | 24/03/28 | 24/04/28 | 0% |
| ▸ TEXTURA - EXTERNA ⓘ | 27/03/28 | 27/02/29 | 0% |
| ▸ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F… ⓘ | 17/04/28 | 09/05/28 | 0% |
| ▸ FACHADA AERADA - F3 + F4 (2º ETAPA) | 26/04/28 | 07/06/28 | 0% |
| ▸ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F5 (… | 10/05/28 | 06/06/28 | 0% |
| ▸ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F… ⓘ | 31/05/28 | 21/06/28 | 0% |
| ▸ FACHADA AERADA - F5 (2º ETAPA) | 08/06/28 | 27/07/28 | 0% |
| ▸ FACHADA | 16/06/28 | 19/09/28 | 0% |
| ▸ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F… ⓘ | 20/07/28 | 17/08/28 | 0% |
| ▸ FACHADA EMBASAMENTO | 18/08/28 | 04/01/29 | 0% |
| ▾ REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO 1 inferido | 24/08/27 | 15/02/29 | 0% |
| ▸ REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | 24/08/27 | 15/09/28 | 0% |
| ▸ REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | 06/09/27 | 28/09/28 | 0% |
| ▸ REVESTIMENTO DE GRANITO PISO | 20/09/27 | 04/08/28 | 0% |
| ▸ BANCADAS | 20/09/27 | 11/10/28 | 0% |
| ▸ PISO VINÍLICO / LAMINADO | 24/01/28 | 03/01/29 | 0% |
| ▸ RODAPÉ MADEIRA / PVC | 17/02/28 | 23/01/29 | 0% |
| ▸ POLIMENTO DE PISO ⓘ | 24/03/28 | 15/12/28 | 0% |
| ▸ PISO EMBORRACHADO | 18/05/28 | 31/05/28 | 0% |
| ▸ REVESTIMENTO ACABAMENTO | 31/05/28 | 15/02/29 | 0% |
| ▸ PISO ELEVADO | 11/09/28 | 26/10/28 | 0% |
| ▾ ELEVADORES 1 inferido | 20/09/27 | 09/10/28 | 0% |
| ▸ INSTALAÇÃO DE ADUELAS (ELEVADORES) ⓘ | 20/09/27 | 13/07/28 | 0% |
| ▸ PREPARAÇÃO - POÇO DE ELEVADOR | 14/02/28 | 18/05/28 | 0% |
| ▸ MONTAGEM - ELEVADOR 1 | 19/05/28 | 05/07/28 | 0% |
| ▸ MONTAGEM - ELEVADOR 2 | 06/07/28 | 22/08/28 | 0% |
| ▸ MONTAGEM - ELEVADOR 3 | 23/08/28 | 09/10/28 | 0% |
| ▾ FORRO | 15/10/27 | 03/11/28 | 0% |

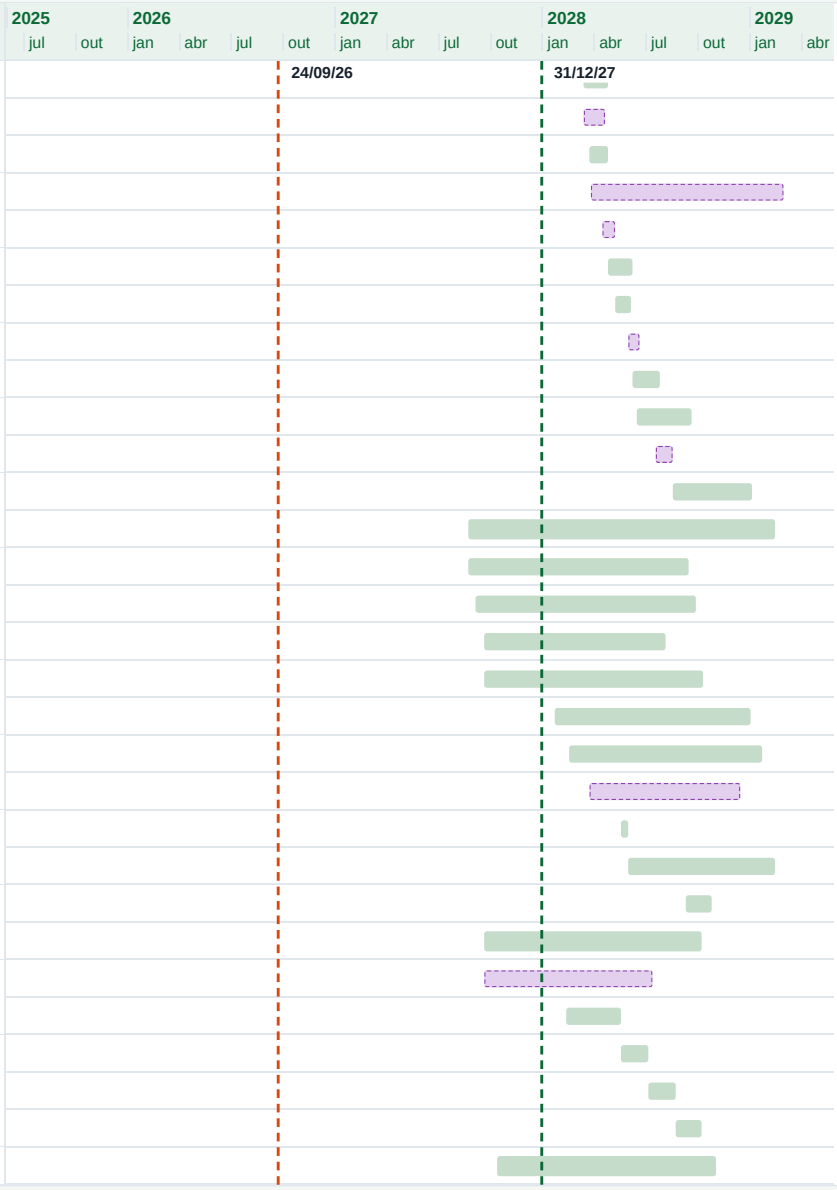

| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ► FORRO | 15/10/27 | 03/11/28 | 0% |
| ▼ PAVIMENTAÇÃO (2 inferidos) | 30/11/27 | 01/03/29 | 0% |
| ► PASSEIOS, MURETAS E RAMPAS | 30/11/27 | 09/03/28 | 0% |
| ► DEMARCAÇÃO DE VAGAS | 19/05/28 | 01/03/29 | 0% |
| ► QUADRA DE RECREAÇÃO | 08/08/28 | 10/10/28 | 0% |
| ▼ SEM PL (gestão / entrega) (7 inferidos) | 11/02/28 | 30/04/29 | 0% |
| ► PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS | 11/02/28 | 09/02/29 | 0% |
| ► CHECKLIST | 24/04/28 | 19/03/29 | 0% |
| ► CHECKLIST FINAL | 31/10/28 | 13/04/29 | 0% |
| ► ENXOVAL | 17/11/28 | 02/04/29 | 0% |
| ► VISTORIA APTOS | 08/01/29 | 18/04/29 | 0% |
| ► HABITE-SE | 01/03/29 | 02/04/29 | 0% |
| ► ENTREGA SÍNDICO | 03/04/29 | 30/04/29 | 0% |
| ▼ MARCENARIA | 14/02/28 | 16/01/29 | 0% |
| ► MARCENARIA - SHAFTS | 14/02/28 | 16/01/29 | 0% |
| ▼ LOUÇAS SANITÁRIAS | 01/03/28 | 09/02/29 | 0% |
| ► LOUÇAS | 01/03/28 | 05/02/29 | 0% |
| ► METAIS | 01/03/28 | 05/02/29 | 0% |
| ► INSTALAÇÃO DE METAIS | 19/05/28 | 09/02/29 | 0% |
| ▼ LIMPEZA FINAL DE OBRA | 14/03/28 | 13/04/29 | 0% |
| ► LIMPEZA GROSSA | 14/03/28 | 14/02/29 | 0% |
| ► LIMPEZA FINA | 15/05/28 | 13/04/29 | 0% |
| ► LIMPEZA | 26/06/28 | 02/04/29 | 0% |
| ▼ PAISAGISMO | 08/06/28 | 06/12/28 | 0% |
| ► IRRIGAÇÃO | 08/06/28 | 25/10/28 | 0% |
| ► PAISAGISMO | 16/06/28 | 06/12/28 | 0% |

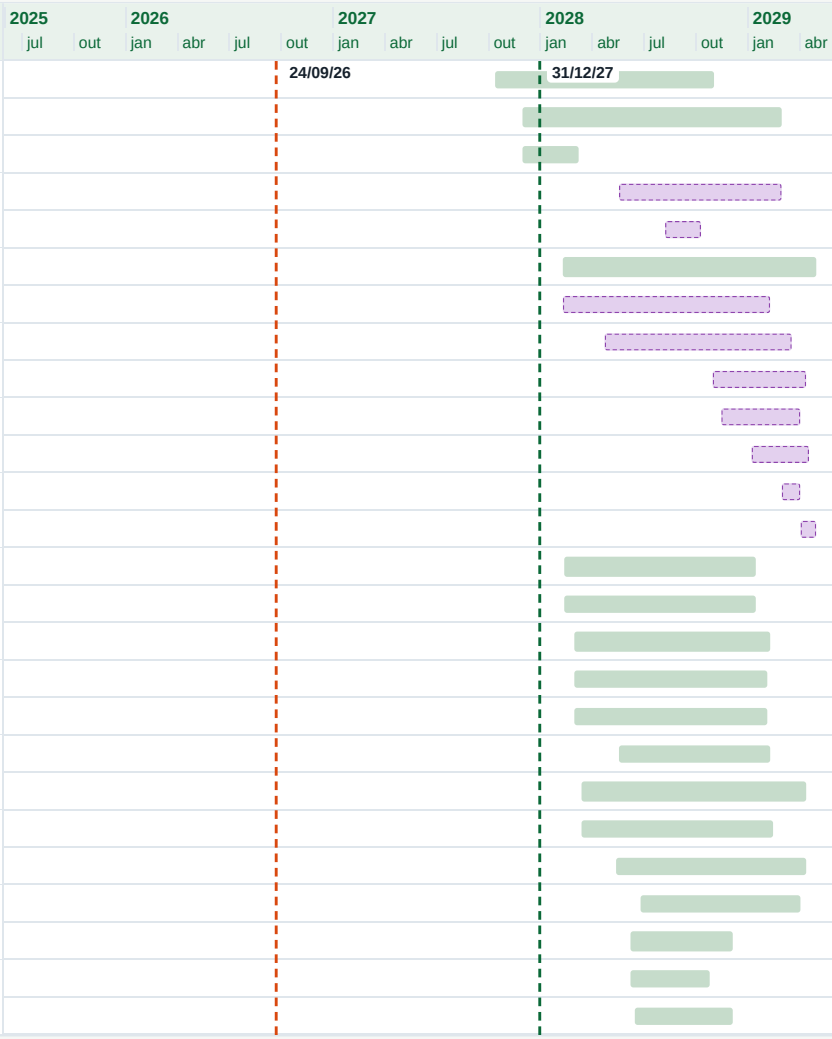

## PACOTES NÃO DESCRITOS DE FORMA EXPRESSA NA CURVA DO PREVISION (45)

| PL | Pacote | Nota |
|---|---|---|
| FUNDAÇÃO PROFUNDA | **VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - CENTRAL DE POLÍMEROS)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES. |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA | **VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 1º ETAPA)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES. |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA | **VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 2º ETAPA)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES. |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA | **VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 1º ETAPA)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES. |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA | **VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 2º ETAPA)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES. |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA | **VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA BOM JESUS)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES. |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA | **VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 3º ETAPA)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES. |
| PINTURA | **TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |
| PINTURA | **MASSA CORRIDA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: massa, corrida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 28 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES. |
| PINTURA | **TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F1 + F2** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |
| PINTURA | **TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F3 + F4** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |
| PINTURA | **TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F5** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: shaft). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 18 – ALVENARIA; 27 – MARCENARIA. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **PRESSURIZAÇÃO (HIDRÁULICA)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: pressurizacao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 34 – LOUÇAS E METAIS. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **MONTAGEM - BOILERS E AQUECEDORES** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: boilers). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | **GERADOR/TRANSFORMADOR** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: gerador). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | **DISJUNTORES / MIOLOS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: disjuntores, miolos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |

| PL | Pacote | Nota |
|---|---|---|
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | **INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: carregador, veiculos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS. |
| INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO | **PRESSURIZAÇÃO (INCÊNDIO)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO (termo sem correspondência: pressurizacao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 34 – LOUÇAS E METAIS. |
| ESQUADRIAS | **INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISE - F1 + F2** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 25 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: shadowbox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| ESQUADRIAS | **INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - F3 + F4** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 25 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: shadowbox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| ESQUADRIAS | **INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - F5** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 25 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: shadowbox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| SERRALHERIA | **PONTOS DE ANCORAGEM INOX** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 26 – SERRALHERIA (termo sem correspondência: pontos, ancoragem, inox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS. |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS | **INST. MÓDULOS CHURRASQUEIRA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: modulos, churrasqueira). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS | **COMUNICAÇÃO E ALARME** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: comunicacao, alarme). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 09 – CONSULTORIAS (OBRAS); 22 – INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA. |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS | **AQUECEDOR (SAUNA)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: aquecedor). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS. |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS | **EQUIPAMENTOS - PISCINA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: equipamentos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 10 – MÃO DE OBRA PRÓPRIA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO. |
| REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | **PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F1 + F2 (1º ETAPA)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO. |
| REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | **PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F3 + F4 (1º ETAPA)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO. |
| REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | **PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F5 (1º ETAPA)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO. |
| REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | **TEXTURA - EXTERNA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: textura). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS. |
| REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | **PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F1 + F2 (2º ETAPA)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO. |
| REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | **PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F3 + F4 (2º ETAPA)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO. |
| REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | **PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F5 (2º ETAPA)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO. |

| PL | Pacote | Nota |
|---|---|---|
| REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO | **POLIMENTO DE PISO** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO (termo sem correspondência: polimento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO. |
| ELEVADORES | **INSTALAÇÃO DE ADUELAS (ELEVADORES)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – ELEVADORES (termo sem correspondência: aduelas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO. |
| PAVIMENTAÇÃO | **DEMARCAÇÃO DE VAGAS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTÇÃO (termo sem correspondência: demarcacao, vagas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 18 – ALVENARIA; 35 – PINTURAS. |
| PAVIMENTAÇÃO | **QUADRA DE RECREAÇÃO** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTÇÃO (termo sem correspondência: quadra, recreacao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **CHECKLIST** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **CHECKLIST FINAL** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **ENXOVAL** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **VISTORIA APTOS** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **HABITE-SE** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **ENTREGA SÍNDICO** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |

Fonte: aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (export do Prevision). Datas de início e término e % realizado vêm do Prevision; nos níveis PL e pacote o % é a média dos itens ponderada pela duração. O cronograma é o mesmo nos três cenários (os cenários mudam as curvas financeiras, não as datas das atividades).
