# Torre Catharina · Gantt do cronograma


4.059 atividades do Prevision (situação em 28/09/26) · PL → pacote de trabalho → pavimento/tarefa · clique na seta para abrir

Planejado (início → término) · Realizado (% do Prevision) · Concluído · **Não descrito de forma expressa na curva do Prevision** (notas na última página) · Previsto para a data (atraso > 5 p.p.) · Situação 28/09/26 · 31/12/2027


| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▼ CONTENÇÃO | 05/03/25 | 21/09/26 | 100% |
| ► CONTENÇÕES TRECHO 2 | 05/03/25 | 13/05/25 | 100% |
| ► CONTENÇÃO TRECHO 6 | 10/03/25 | 21/05/25 | 100% |
| ► CONTENÇÕES - ESTACAS EM TRADO 1º FASE | 01/04/25 | 30/04/25 | 100% |
| ► CONTENÇÃO TRECHO 7 | 28/04/25 | 07/11/25 | 100% |
| ► CONTENÇÃO TRECHO 4 | 05/05/25 | 12/06/25 | 100% |
| ► CONTENÇÕES - GERAL | 12/05/25 | 10/12/25 | 100% |
| ► CONTENÇÃO TRECHO 3 | 02/06/25 | 24/06/25 | 100% |
| ► CONTENÇÕES EM ESTACAS | 26/06/25 | 06/08/25 | 100% |
| ► CONTENÇÃO TRECHO 5 | 09/07/25 | 07/08/25 | 100% |
| ► TIRANTES | 23/07/25 | 11/09/25 | 100% |
| ► VIGA DE COROAMENTO | 22/08/25 | 10/12/25 | 100% |
| ► CONTENÇÃO - BLOCO DO ELEVADOR | 28/08/25 | 01/12/25 | 100% |
| ► CONCRETO PROJETADO (CONTENÇÕES) | 12/09/25 | 19/06/26 | 100% |
| ► CONTENÇÃO - SUBESTAÇÃO | 21/10/25 | 28/10/25 | 100% |
| ► CONTENÇÃO - CORTINA 3 | 08/01/26 | 20/07/26 | 100% |
| ► CONCRETO PROJETADO - LOOKAHEAD | 18/05/26 | 17/06/26 | 100% |
| ► CONTENÇÃO - CORTINA 1 | 28/05/26 | 19/06/26 | 100% |
| ► CONTENÇÃO - CORTINA 2 | 05/06/26 | 08/07/26 | 100% |
| ► FECHAMENTO ABAIXO DAS VIGAS DE COROA… | 04/08/26 | 21/09/26 | 93% |
| ▼ FUNDAÇÃO PROFUNDA 1 inferido | 15/04/25 | 12/09/25 | 100% |




| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▸ PRIMEIRA PRAÇA DE TRABALHO - TUBUL… | 15/04/25 | 11/06/25 | 100% |
| ▸ FUNDAÇÕES PROFUNDAS - GERAL | 24/04/25 | 12/09/25 | 100% |
| ▸ FUNDAÇÕES ACESSO FRONTAL | 28/04/25 | 09/05/25 | 100% |
| ▸ FUNDAÇÕES PRIMEIRA PRAÇA DE TRABALHO | 12/05/25 | 21/05/25 | 100% |
| ▸ FUNDAÇÕES SEGUNDA PRAÇA DE TRABALHO | 27/05/25 | 02/07/25 | 100% |
| ▸ FUNDAÇÕES CHOPP DA FÁBRICA | 09/06/25 | 17/06/25 | 100% |
| ▸ FUNDAÇÕES 1125 PRÉDIO | 18/07/25 | 05/09/25 | 100% |
| ▸ ÚLTIMA FASE DE FUNDAÇÕES - PRÉDIO | 21/08/25 | 12/09/25 | 100% |
| ▾ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | 12/05/25 | 03/08/26 | 100% |
| ▸ BLOCOS E CINTAS - PERIFERIA ALAMEDA | 12/05/25 | 02/09/25 | 100% |
| ▸ BLOCOS E CINTAS - MEDIÇÃO | 16/05/25 | 12/05/26 | 100% |
| ▸ BLOCOS E CINTAS - TORRE | 30/07/25 | 14/11/25 | 100% |
| ▸ BLOCOS E CINTAS - LOOKAHEAD | 11/03/26 | 03/08/26 | 100% |
| ▾ SERVIÇOS INICIAIS | 12/05/25 | 30/05/25 | 100% |
| ▸ SERVIÇOS INICIAIS - ADEQUAÇÃO PARA INÍCI… | 12/05/25 | 30/05/25 | 100% |
| ▾ ESTRUTURA EM CONCRETO ARMA… 16 inferidos | 04/06/25 | 13/07/27 | 79% |
| ▸ ESTRUTURA - AFASTAMENTO FRONTAL - MED… | 04/06/25 | 14/07/25 | 100% |
| ▸ ESTRUTURA - PROJEÇÃO ALAMEDA - MEDIÇÃO | 04/08/25 | 19/10/26 | 84% |
| ▸ ESTRUTURA - PROJEÇÃO ALAMEDA (2º ETAP… | 17/09/25 | 13/11/25 | 100% |
| ▸ ESTRUTURA - PROJEÇÃO CONCORDIA - MEDI… | 21/10/25 | 30/09/26 | 93% |
| ▸ ESTRUTURA TORRE - MEDIÇÃO | 10/11/25 | 13/07/27 | 52% |
| ▸ ESTRUTURA ALAMEDA - LOOKAHEAD | 19/11/25 | 09/10/26 | 69% |
| ▸ ESTRUTURA- PROJEÇÃO OLYMPUS - MEDIÇÃO | 24/11/25 | 11/12/26 | 77% |
| ▸ ESTRUTURA TORRE - LOOKAHEAD | 26/11/25 | 18/09/26 | 100% |
| ▸ OBRA CIVIL CÂMARA | 10/12/25 | 05/01/26 | 100% |
| ▸ ESTRUTURA OLYMPUS - LOOKAHEAD | 05/01/26 | 16/12/26 | 65% |
| ▸ ESTRUTURA TORRE - ESCADA | 07/01/26 | 15/07/26 | 100% |
| ▸ ESTRUTURA - TRIPINHA - LOOKAHEAD | 07/01/26 | 01/07/26 | 100% |
| ▸ ESTRUTURA CONCORDIA - LOOKAHEAD | 19/01/26 | 19/08/26 | 100% |
| ▸ RESERVATÓRIO - LOOKAHEAD | 02/02/26 | 02/03/26 | 100% |

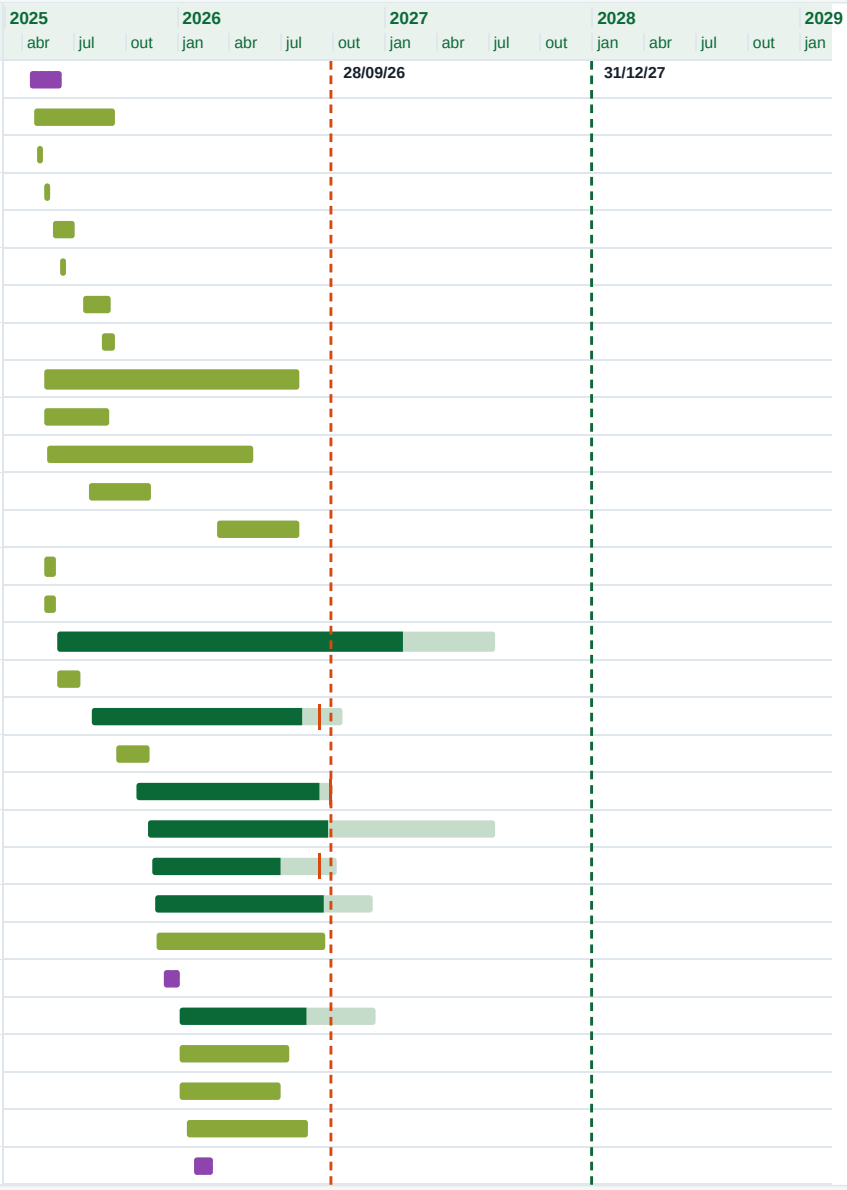


| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▸ ESTRUTURA - ESCADA DA TORRE | 03/03/26 | 23/06/26 | 100% |
| ▸ ESTRUTURA LOOKAHEAD TAMPA RESERVAT… | 03/03/26 | 06/03/26 | 100% |
| ▸ ESTRUTURA RAMPA 6° AO 5° SUBSOLO | 30/03/26 | 16/04/26 | 100% |
| ▸ RAMPA PROJEÇÃO DA TORRE LOOKAHEAD | 10/04/26 | 22/04/26 | 100% |
| ▸ PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO CONCOR… | 16/04/26 | 01/06/26 | 100% |
| ▸ ESTRUTURA PROJEÇÃO RAMPA OLIMPUS | 20/04/26 | 14/10/26 | 68% |
| ▸ ESTRUTURA TORRE LOOKAHEAD | 04/05/26 | 27/05/26 | 100% |
| ▸ PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO TORRE L… | 11/05/26 | 03/07/26 | 100% |
| ▸ VIGA DE FECHAMENTO LATERAL CHOPP … | 18/05/26 | 22/05/26 | 100% |
| ▸ ESTRUTURA - OLIMPUS LOOKAHEAD | 21/05/26 | 15/06/26 | 100% |
| ▸ ESTRUTURA - CONCORDIA LOOKAHEAD | 25/05/26 | 30/09/26 | 68% |
| ▸ VIGA DE TRAVAMENTO VM1/VM2 LOOKAH… | 28/05/26 | 08/06/26 | 100% |
| ▸ PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS… | 02/06/26 | 21/08/26 | 100% |
| ▸ PISO EM CONCRETO E INSTALAÇÕES CHO… | 02/06/26 | 03/07/26 | 100% |
| ▸ ESTRUTURA TORRE INTERMEDIÁRIO 3 LOOK… | 02/06/26 | 10/06/26 | 100% |
| ▸ VIGAS DA LAJE DE SOLIDARIZAÇÃO DO 1° PA… | 08/06/26 | 18/06/26 | 100% |
| ▸ PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS… | 09/06/26 | 15/07/26 | 100% |
| ▸ LAJE CONTRAPISO - PISO ARMADO | 10/06/26 | 30/09/26 | 95% |
| ▸ TRIPÃO 2° ETAPA ESTRUTURA LOOKAHEAD | 30/06/26 | 15/07/26 | 100% |
| ▸ RAMPA DE VEÍCULOS - 5º AO 6º SS. (TERR… | 14/09/26 | 04/11/26 | 3% |
| ▸ ESTRUTURA DA RAMPA ALAMEDA LOOKAHEAD | 13/10/26 | 13/11/26 | 0% |
| ▸ RESERVATÓRIO OLYMPUS INTER 4 LOOKA… | 23/10/26 | 06/11/26 | 0% |
| ▸ LAJE DE COBERTURA DO PILOTIS (CONC… | 17/12/26 | 20/01/27 | 0% |
| ▸ LAJE COBERTURA PILOTIS (OLYMPUS) | 17/12/26 | 20/01/27 | 0% |
| ▾ TERRAPLENAGEM | 07/07/25 | 13/08/26 | 100% |
| ▸ TERRAPLENAGEM - LIBERAÇÃO DOS TIRANTES | 07/07/25 | 11/07/25 | 100% |
| ▸ TERRAPLENAGEM GERAL | 16/07/25 | 13/08/26 | 100% |
| ▸ TERRAPLENAGEM - PÓS TIRANTE | 12/09/25 | 18/09/25 | 100% |
| ▸ RETIRADA/ESCAVAÇÃO DO TALUDE DA CONT… | 08/04/26 | 10/04/26 | 100% |
| ▾ PINTURA 1 inferido | 24/04/26 | 06/12/28 | 9% |

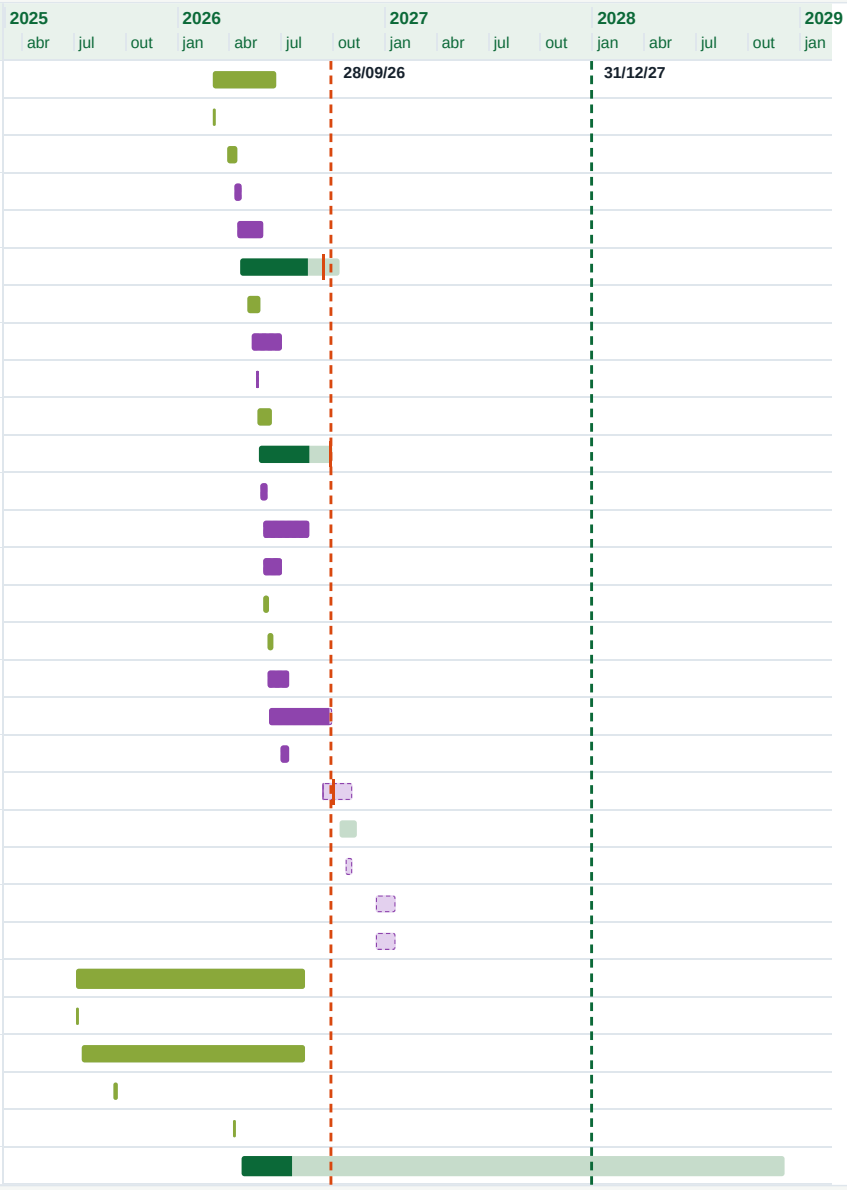


| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▸ TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE | 24/04/26 | 28/09/27 | 55% |
| ▸ PINTURA | 24/02/27 | 07/11/28 | 0% |
| ▸ MASSA CORRIDA | 23/03/27 | 23/08/28 | 0% |
| ▸ PINTURA 1º DEMÃO | 03/05/27 | 01/09/28 | 0% |
| ▸ PINTURA 2º DEMÃO | 09/07/27 | 14/11/28 | 0% |
| ▸ PINTURA 3º DEMÃO | 19/08/27 | 06/12/28 | 0% |
| ▾ ALVENARIA (4 inferidos) | 27/04/26 | 13/12/28 | 6% |
| ▸ ALVENARIA | 27/04/26 | 25/11/27 | 19% |
| ▸ ALVENARIA FACHADA LATERAL CHOPP DA FÁ… | 14/08/26 | 11/09/26 | 100% |
| ▸ ALVENARIA FACHADA FUNDOS CHOPP DA FÁ… | 04/09/26 | 02/10/26 | 80% |
| ▸ PLANO DE AÇÃO ALVENARIA FACHADA ACÁCIA | 01/10/26 | 13/11/26 | 0% |
| ▸ ENCUNHAMENTO | 09/10/26 | 23/08/27 | 0% |
| ▸ ALVENARIA PLANO DE AÇÃO FACHADA CONC… | 22/10/26 | 12/11/26 | 0% |
| ▸ PLANO DE AÇÃO ALVENARIA FACHADA OLYM… | 26/10/26 | 24/11/26 | 0% |
| ▸ MONTANTES DO DRYWALL | 15/12/26 | 13/01/28 | 0% |
| ▸ DRYWALL 1º FACE | 06/01/27 | 11/11/27 | 0% |
| ▸ DRYWALL 2º FACE | 28/01/27 | 13/12/27 | 0% |
| ▸ DRYWALL | 26/02/27 | 20/04/28 | 0% |
| ▸ EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE MURO | 01/08/28 | 13/12/28 | 0% |
| ▾ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (3 inferidos) | 26/05/26 | 27/11/28 | 4% |
| ▸ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS(INFR… | 26/05/26 | 30/10/26 | 92% |
| ▸ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 03/09/26 | 18/09/28 | 5% |
| ▸ PRUMADA ELÉTRICA (INFRA) | 07/10/26 | 24/01/28 | 0% |
| ▸ INSTALAÇÕES EMBUTIDAS NA ALVENARIA | 20/10/26 | 14/09/27 | 0% |
| ▸ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO | 18/01/27 | 26/11/27 | 0% |
| ▸ ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 03/03/27 | 27/11/28 | 0% |
| ▸ FIAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO | 30/03/27 | 31/07/28 | 0% |
| ▸ PRUMADA ELÉTRICA (CABOS) | 30/03/27 | 01/08/28 | 0% |
| ▸ INFRA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS | 14/04/27 | 20/03/28 | 0% |
| ▸ FIAÇÃO ELÉTRICA | 20/05/27 | 26/05/28 | 0% |

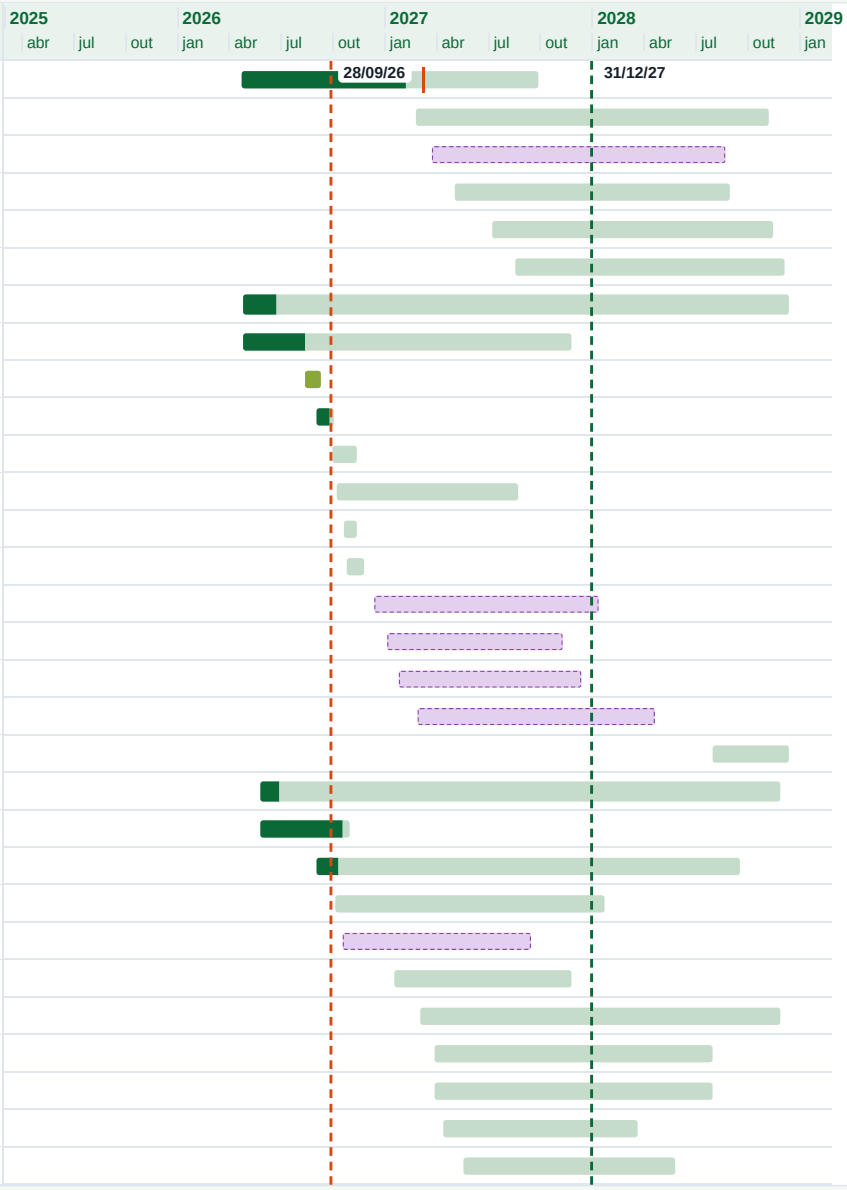


| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▸ GERADOR | 31/08/27 | 14/09/27 | 0% |
| ▸ OBRA CIVIL SUBESTAÇÃO/TRANSFORMA… | 22/12/27 | 10/04/28 | 0% |
| ▸ DISJUNTORES / MIOLOS | 27/01/28 | 24/10/28 | 0% |
| ▸ ENTRADA DE ENERGIA | 04/02/28 | 10/04/28 | 0% |
| ▸ SUBESTAÇÃO | 11/04/28 | 23/05/28 | 0% |
| ▾ INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (7 inferidos) | 08/06/26 | 24/10/28 | 6% |
| ▸ INFRA DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 08/06/26 | 20/03/28 | 9% |
| ▸ INFRA HIDROSSANITÁRIA - CHOPP DA FÁBRICA | 06/07/26 | 17/07/26 | 100% |
| ▸ INFRA HIDRÁULICA PAREDES | 10/08/26 | 30/10/26 | 87% |
| ▸ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 12/08/26 | 22/08/28 | 14% |
| ▸ EXECUÇÃO DA ESCADA HIDRÁULICA LAT… | 14/09/26 | 02/10/26 | 0% |
| ▸ DRENAGEM PLUVIAL TALUDES | 28/09/26 | 01/12/26 | 0% |
| ▸ PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | 07/10/26 | 22/11/27 | 0% |
| ▸ GÁS PISO | 24/11/26 | 06/10/27 | 0% |
| ▸ DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 18/01/27 | 30/11/27 | 0% |
| ▸ GÁS PAREDE | 18/01/27 | 24/11/27 | 0% |
| ▸ REDE HIDROSSANITÁRIA | 18/01/27 | 24/11/27 | 0% |
| ▸ GÁS | 01/03/27 | 26/11/27 | 0% |
| ▸ SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | 17/03/27 | 13/12/27 | 0% |
| ▸ AQUECIMENTO SOLAR | 04/08/28 | 24/10/28 | 0% |
| ▸ RESERVATÓRIOS / BOILERS | 07/08/28 | 04/09/28 | 0% |
| ▾ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES | 06/07/26 | 16/03/28 | 2% |
| ▸ REBOCO INTERNO | 06/07/26 | 16/03/28 | 3% |
| ▸ TALISCAMENTO | 20/10/26 | 30/08/27 | 0% |
| ▾ BARRACAO DE OBRA (1 inferido) | 08/07/26 | 04/09/26 | 100% |
| ▸ EXECUÇÃO DO CANTEIRO (ENGENHARIA) | 08/07/26 | 31/08/26 | 100% |
| ▸ MUDANÇA DO ALMOXARIFADO | 22/07/26 | 05/08/26 | 100% |
| ▸ EXECUÇÃO DO CANTEIRO (REFEITÓRIO) | 06/08/26 | 04/09/26 | 100% |
| ▾ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS | 16/07/26 | 10/04/28 | 2% |
| ▸ CONTRAPISO | 16/07/26 | 10/04/28 | 2% |

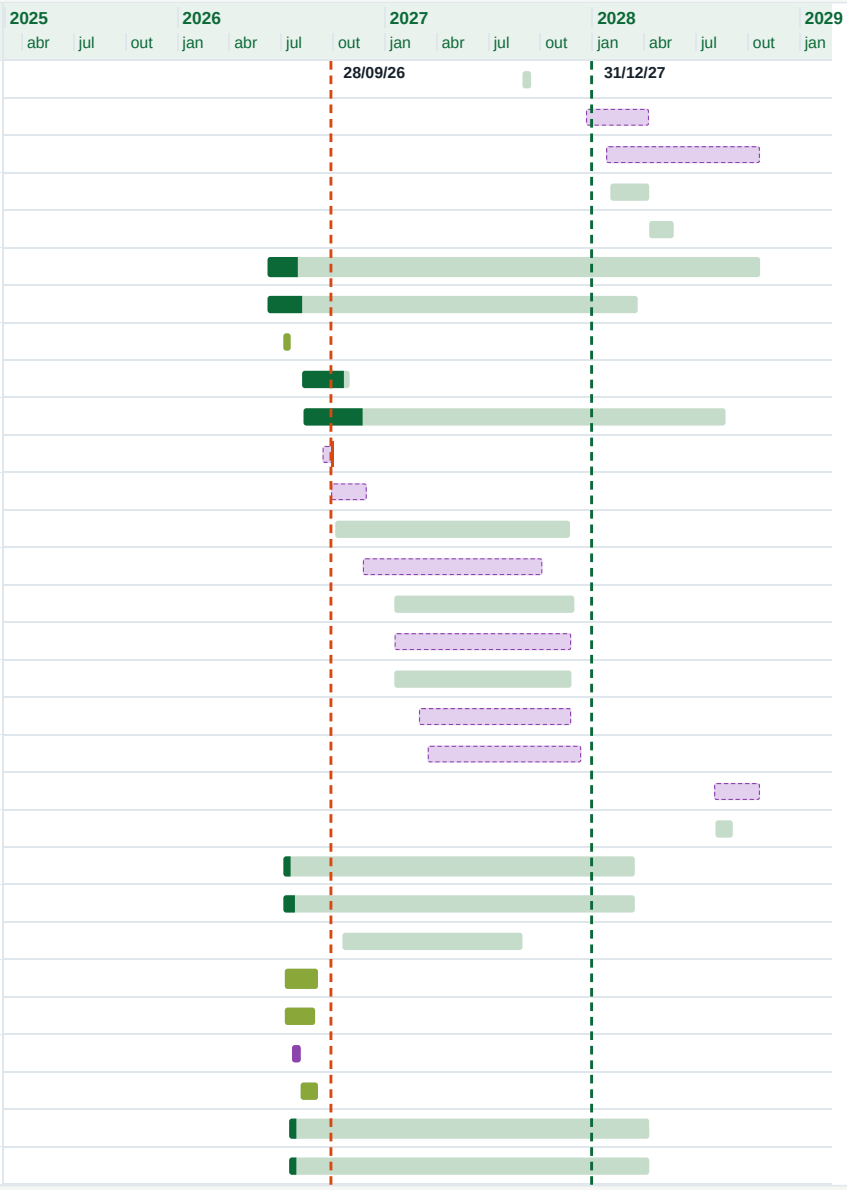


| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▼ IMPERMEABILIZAÇÃO | 21/08/26 | 14/06/28 | 2% |
| ► IMPERMEABILIZAÇÃO CORTINA 1 E 2 LOOKA… | 21/08/26 | 11/09/26 | 87% |
| ► IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO PL… | 28/09/26 | 14/10/26 | 0% |
| ► IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA | 26/10/26 | 14/06/28 | 0% |
| ► IMPERMEABILIZAÇÃO | 09/02/27 | 08/05/28 | 0% |
| ▼ REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO | 01/09/26 | 27/11/28 | 1% |
| ► POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO LOOKAH… | 01/09/26 | 19/10/26 | 39% |
| ► REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | 20/01/27 | 11/07/28 | 0% |
| ► REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | 27/01/27 | 30/06/28 | 0% |
| ► BANCADAS | 17/03/27 | 20/07/28 | 0% |
| ► REVESTIMENTO ACABAMENTO | 02/07/27 | 03/08/28 | 0% |
| ► POLIMENTO DE PISO | 06/07/27 | 03/02/28 | 0% |
| ► PISO ELEVADO | 02/09/27 | 15/09/28 | 0% |
| ► DECK | 05/10/27 | 04/01/28 | 0% |
| ► PISO VINÍLICO / LAMINADO | 20/12/27 | 22/09/28 | 0% |
| ► RODAPÉ MADEIRA / PVC | 18/01/28 | 13/10/28 | 0% |
| ► PISO EMBORRACHADO | 10/11/28 | 27/11/28 | 0% |
| ▼ INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 02/09/26 | 24/10/28 | 3% |
| ► INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 02/09/26 | 27/10/27 | 11% |
| ► INFRA DE AR CONDICIONADO | 18/01/27 | 20/03/28 | 0% |
| ► INFRA DE SISTEMAS - CFTV | 14/04/27 | 20/03/28 | 0% |
| ► COMUNICAÇÃO E ALARME | 18/06/27 | 24/10/28 | 0% |
| ► PISCINA | 26/01/28 | 29/03/28 | 0% |
| ► EQUIPAMENTOS | 13/07/28 | 19/07/28 | 0% |
| ▼ SERRALHERIA 1 inferido | 08/09/26 | 14/09/28 | 0% |
| ► INSTALAÇÃO DE PCF (MARCO) | 08/09/26 | 17/09/27 | 0% |
| ► INSTALAÇÃO DE PCF (FOLHAS) | 26/08/27 | 09/08/28 | 0% |
| ► PONTOS DE ANCORAGEM INOX | 14/09/27 | 04/10/27 | 0% |
| ► GUARDA- CORPO | 04/10/27 | 14/09/28 | 0% |
| ► SERRALHERIA | 31/07/28 | 21/08/28 | 0% |

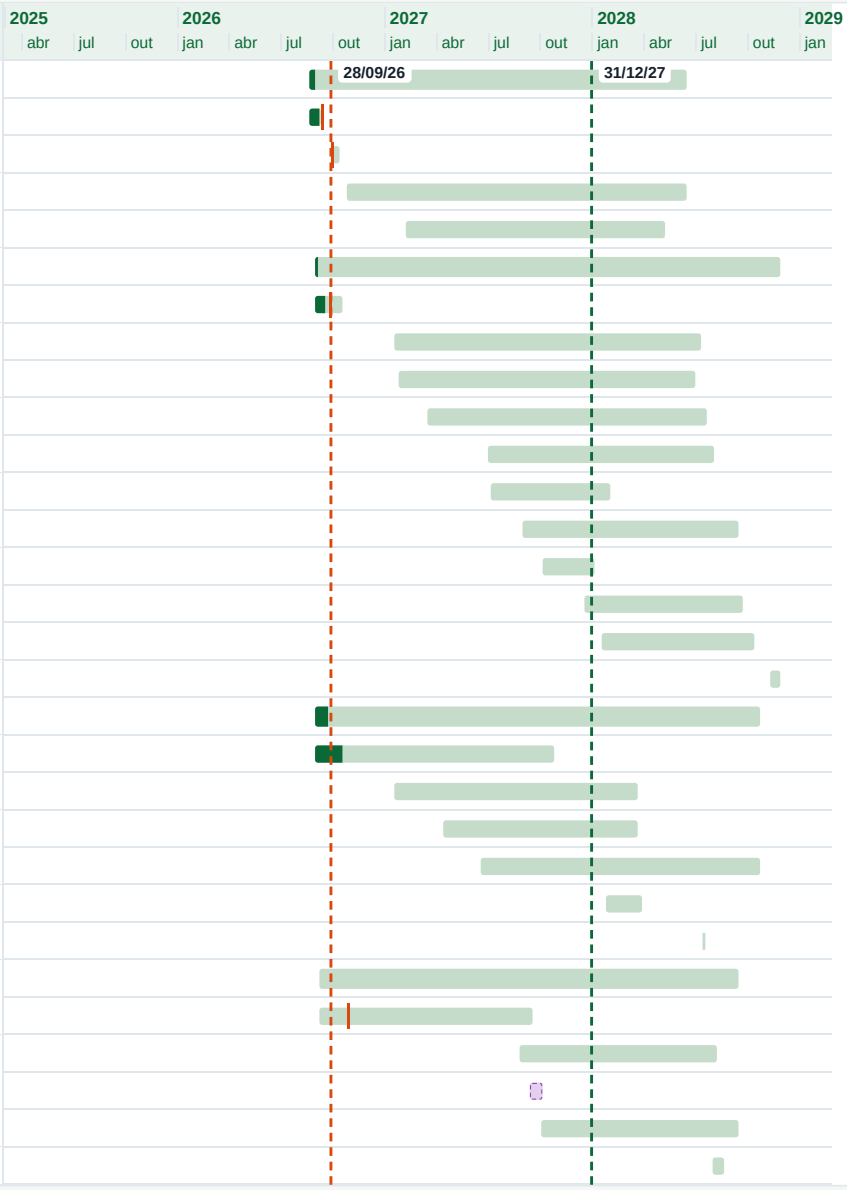

| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▼ SEM PL (gestão / entrega) 11 inferidos | 14/09/26 | 19/01/29 | 0% |
| ► PLANO DE AÇÃO ENTREGA DO MEZANINO… | 14/09/26 | 19/10/26 | 8% |
| ► APARTAMENTO PROTÓTIPO 01 ( 52,54 m²) … | 01/10/26 | 18/01/27 | 0% |
| ► APARTAMENTO PROTÓTIPO 06 ( 54,39 m² ) | 01/10/26 | 15/01/27 | 0% |
| ► APARTAMENTO PROTÓTIPO 05 ( 85,07 m² ) | 01/10/26 | 18/01/27 | 0% |
| ► CHECKLIST | 13/08/27 | 10/01/29 | 0% |
| ► VISTORIA APTOS | 07/04/28 | 19/01/29 | 0% |
| ENXOVAL | 09/08/28 | 19/12/28 | 0% |
| MANUAL DE USO E OPERAÇÃO | 11/08/28 | 09/10/28 | 0% |
| AVCB | 14/08/28 | 10/10/28 | 0% |
| HABITE-SE | 11/10/28 | 18/12/28 | 0% |
| ENTREGA SÍNDICO | 05/12/28 | 18/01/29 | 0% |
| ▼ REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | 28/09/26 | 03/10/28 | 0% |
| ► REBOCO EXTERNO (FACHADA LATERAL CHO… | 28/09/26 | 29/10/26 | 0% |
| ► REBOCO EXTERNO (FACHADA FUNDO CHOPP… | 05/10/26 | 09/11/26 | 0% |
| ► REBOCO PLANO DE AÇÃO FACHADA CONCO… | 05/10/26 | 26/10/26 | 0% |
| ► PLANO DE AÇÃO REBOCO FACHADA ACÁCIA | 19/10/26 | 01/12/26 | 0% |
| ► PLANO DE AÇÃO REBOCO FACHADA OLYMPUS | 03/11/26 | 01/12/26 | 0% |
| ► TEXTURA | 17/02/27 | 13/06/28 | 0% |
| ► REBOCO DE FACHADA - FASE 1 | 05/03/27 | 03/01/28 | 0% |
| ► PINTURA ESPALA FECHADA - FASE 1 | 10/05/27 | 13/01/28 | 0% |
| ► REBOCO DE FACHADA - FASE 2 | 21/06/27 | 20/07/28 | 0% |
| ► PINTURA ESPALA FECHADA - FASE 2 | 29/07/27 | 26/04/28 | 0% |
| ► GRANITO FACHADA | 25/08/27 | 20/07/28 | 0% |
| ► PINTURA/TEXTURA DA FACHADA | 13/12/27 | 03/10/28 | 0% |
| ► REBOCO EXTERNO | 14/12/27 | 19/01/28 | 0% |
| ▼ INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO | 01/10/26 | 20/03/28 | 0% |
| ► PRUMADA DE INCÊNDIO | 01/10/26 | 16/11/27 | 0% |
| ► INSTALAÇÕES INCÊNDIO | 22/10/26 | 20/03/28 | 0% |
| ▼ ESQUADRIAS | 29/10/26 | 06/10/28 | 0% |

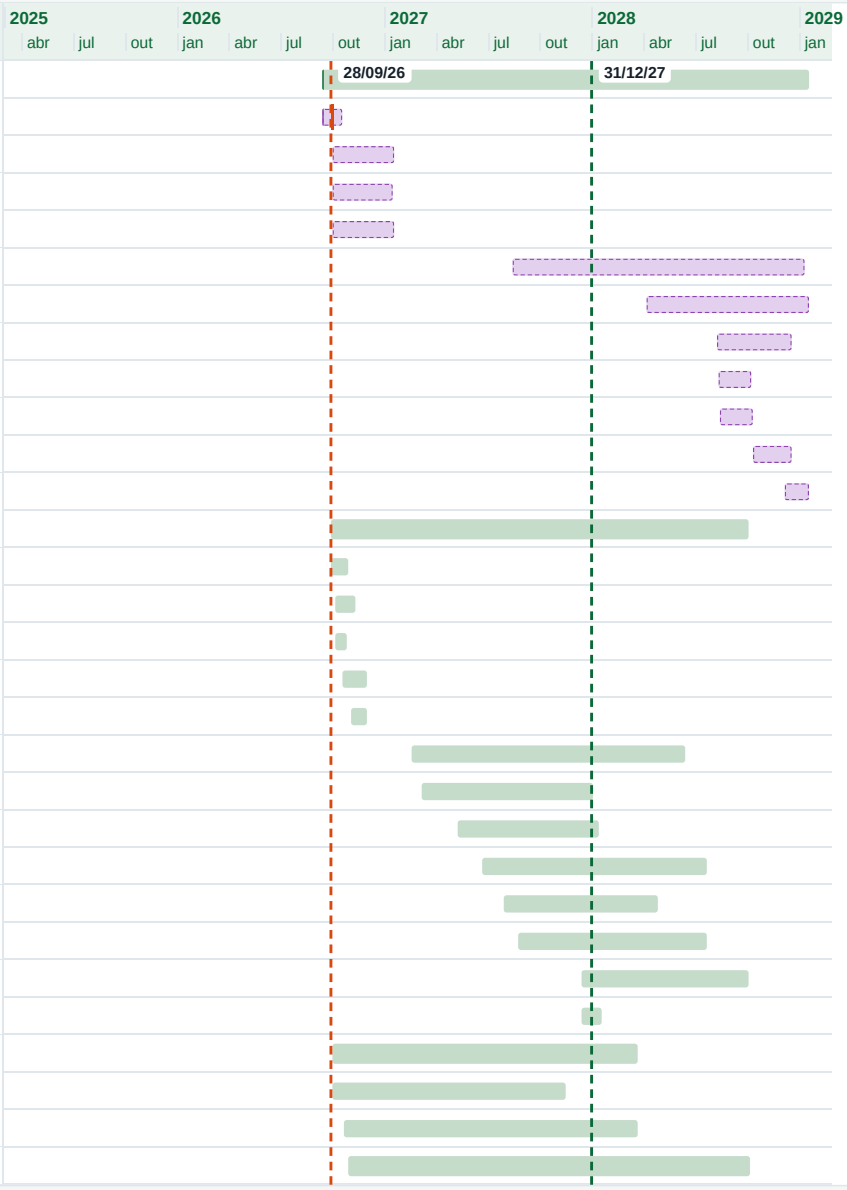

| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▸ CONTRAMARCO | 29/10/26 | 12/01/28 | 0% |
| ▸ ESQUADRIA DE ALUMINIO | 10/02/27 | 07/08/28 | 0% |
| ▸ ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 28/09/27 | 06/10/28 | 0% |
| ▸ ESQUADRIA MADEIRA | 07/01/28 | 03/10/28 | 0% |
| ▾ FORRO | 03/02/27 | 10/08/28 | 0% |
| ▸ FORRO | 03/02/27 | 10/08/28 | 0% |
| ▾ LOUÇAS SANITÁRIAS 1 inferido | 03/03/27 | 27/11/28 | 0% |
| ▸ LOUÇAS | 03/03/27 | 24/10/28 | 0% |
| ▸ METAIS ⓘ | 09/02/28 | 27/11/28 | 0% |
| ▾ LIMPEZA FINAL DE OBRA | 12/03/27 | 18/12/28 | 0% |
| ▸ LIMPEZA FINA | 12/03/27 | 18/12/28 | 0% |
| ▸ LIMPEZA GROSSA | 18/06/27 | 03/11/28 | 0% |
| ▾ PAVIMENTAÇÃO 2 inferidos | 29/04/27 | 09/11/28 | 0% |
| ▸ PASSEIOS | 29/04/27 | 22/12/27 | 0% |
| ▸ PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS ⓘ | 18/10/27 | 22/05/28 | 0% |
| ▸ QUADRA ⓘ | 04/08/28 | 09/11/28 | 0% |
| ▾ MARCENARIA | 16/07/27 | 23/08/28 | 0% |
| ▸ MARCENARIA | 16/07/27 | 23/08/28 | 0% |
| ▾ ELEVADORES | 15/09/27 | 17/11/28 | 0% |
| ▸ ELEVADORES SOCIAL - 01 | 15/09/27 | 15/10/27 | 0% |
| ▸ ELEVADORES SOCIAL - 02 | 15/09/27 | 15/10/27 | 0% |
| ▸ ELEVADOR COMERCIAL - 01 | 25/05/28 | 26/06/28 | 0% |
| ▸ ELEVADOR COMERCIAL - 02 | 25/05/28 | 26/06/28 | 0% |
| ▸ ELEVADOR DE SERVIÇO | 17/10/28 | 17/11/28 | 0% |
| ▸ ELEVADORES SOCIAL - 03 | 17/10/28 | 17/11/28 | 0% |
| ▾ PAISAGISMO | 14/12/27 | 23/10/28 | 0% |
| ▸ PAISAGISMO | 14/12/27 | 23/10/28 | 0% |

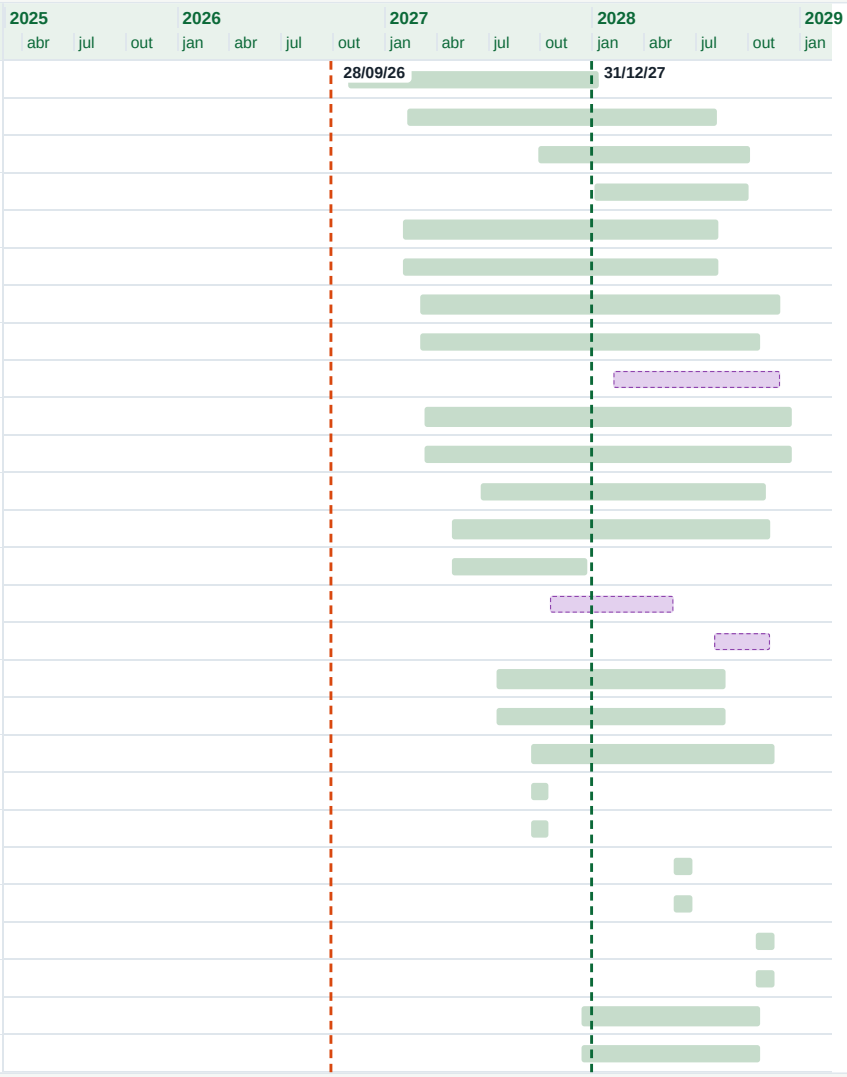

## PACOTES NÃO DESCRITOS DE FORMA EXPRESSA NA CURVA DO PREVISION (48)

| PL | Pacote | Nota |
|---|---|---|
| FUNDAÇÃO PROFUNDA | **PRIMEIRA PRAÇA DE TRABALHO - TUBULÕES** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: tubuloes). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO; 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 26 – SERRALHERIA. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **OBRA CIVIL CÂMARA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: civil, camara). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **RESERVATÓRIO - LOOKAHEAD** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: reservatorio). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **RAMPA PROJEÇÃO DA TORRE LOOKAHEAD** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: rampa, projecao, torre). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 31 – PAVIMENTAÇÃO. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO CONCORDIA LOOKAHEAD** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO TORRE LOOKAHEAD** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **VIGA DE FECHAMENTO LATERAL CHOPP DA FÁBRICA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: viga, fechamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **VIGA DE TRAVAMENTO VM1/VM2 LOOKAHEAD** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: viga, travamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS 2° ETAPA LOOKAHEAD** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **PISO EM CONCRETO E INSTALAÇÕES CHOPP DA FÁBRICA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS 1° ETAPA LOOKAHEAD** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **LAJE CONTRAPISO - PISO ARMADO** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: laje, contrapiso, piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 35 – PINTURA. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **TRIPÃO 2° ETAPA ESTRUTURA LOOKAHEAD** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: tripao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **RAMPA DE VEÍCULOS - 5º AO 6º SS. (TERRENO) LOOKAHEAD** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: veiculos, terreno). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **RESERVATÓRIO OLYMPUS INTER 4 LOOKAHEAD** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: reservatorio). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA. |

| PL | Pacote | Nota |
|---|---|---|
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **LAJE DE COBERTURA DO PILOTIS (CONCÓRDIA)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: laje). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 35 – PINTURA. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **LAJE COBERTURA PILOTIS (OLYMPUS)** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: laje). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 35 – PINTURA. |
| PINTURA | **MASSA CORRIDA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURA (termo sem correspondência: massa, corrida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 28 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS. |
| ALVENARIA | **MONTANTES DO DRYWALL** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: montantes, drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| ALVENARIA | **DRYWALL 1º FACE** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 35 – PINTURA. |
| ALVENARIA | **DRYWALL 2º FACE** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 35 – PINTURA. |
| ALVENARIA | **DRYWALL** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 35 – PINTURA. |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | **INSTALAÇÕES EMBUTIDAS NA ALVENARIA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: embutidas, alvenaria). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 27 – MARCENARIA; 34 – LOUÇAS SANITÁRIAS. |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | **OBRA CIVIL SUBESTAÇÃO/TRANSFORMADORES** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: civil, transformadores). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL. |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | **DISJUNTORES / MIOLOS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: disjuntores, miolos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **EXECUÇÃO DA ESCADA HIDRÁULICA LATERAL CHOPP DA FÁBRICA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: escada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 25 – ESQUADRIAS; 26 – SERRALHERIA. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **DRENAGEM PLUVIAL TALUDES** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: drenagem, taludes). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **GÁS PISO** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: gas, piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **GÁS PAREDE** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: gas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **GÁS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: gas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: shaft). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **AQUECIMENTO SOLAR** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: aquecimento, solar). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 25 – ESQUADRIAS. |

| PL | Pacote | Nota |
|---|---|---|
| BARRACAO DE OBRA | **MUDANÇA DO ALMOXARIFADO** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 04 – BARRACAO DE OBRA (termo sem correspondência: mudanca). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| SERRALHERIA | **PONTOS DE ANCORAGEM INOX** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 26 – SERRALHERIA (termo sem correspondência: pontos, ancoragem, inox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **PLANO DE AÇÃO ENTREGA DO MEZANINO PARA ESTACIONAMENTO** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **APARTAMENTO PROTÓTIPO 01 ( 52,54 m²) LOOKAREAD** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **APARTAMENTO PROTÓTIPO 06 ( 54,39 m² )** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **APARTAMENTO PROTÓTIPO 05 ( 85,07 m² )** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **CHECKLIST** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **VISTORIA APTOS** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **ENXOVAL** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **MANUAL DE USO E OPERAÇÃO** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **AVCB** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **HABITE-SE** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **ENTREGA SÍNDICO** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| LOUÇAS SANITÁRIAS | **METAIS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 34 – LOUÇAS SANITÁRIAS (termo sem correspondência: metais). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| PAVIMENTAÇÃO | **PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTAÇÃO (termo sem correspondência: pintura, demarcacao, vagas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS. |
| PAVIMENTAÇÃO | **QUADRA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTAÇÃO (termo sem correspondência: quadra). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. |

Fonte: aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (export do Prevision). Datas de início e término e % realizado vêm do Prevision; nos níveis PL e pacote o % é a média dos itens ponderada pela duração. O cronograma é o mesmo nos três cenários (os cenários mudam as curvas financeiras, não as datas das atividades).
