
Ed. Jardim

Fachada · pavimentos 4º ao 28º · elevação por período de execução

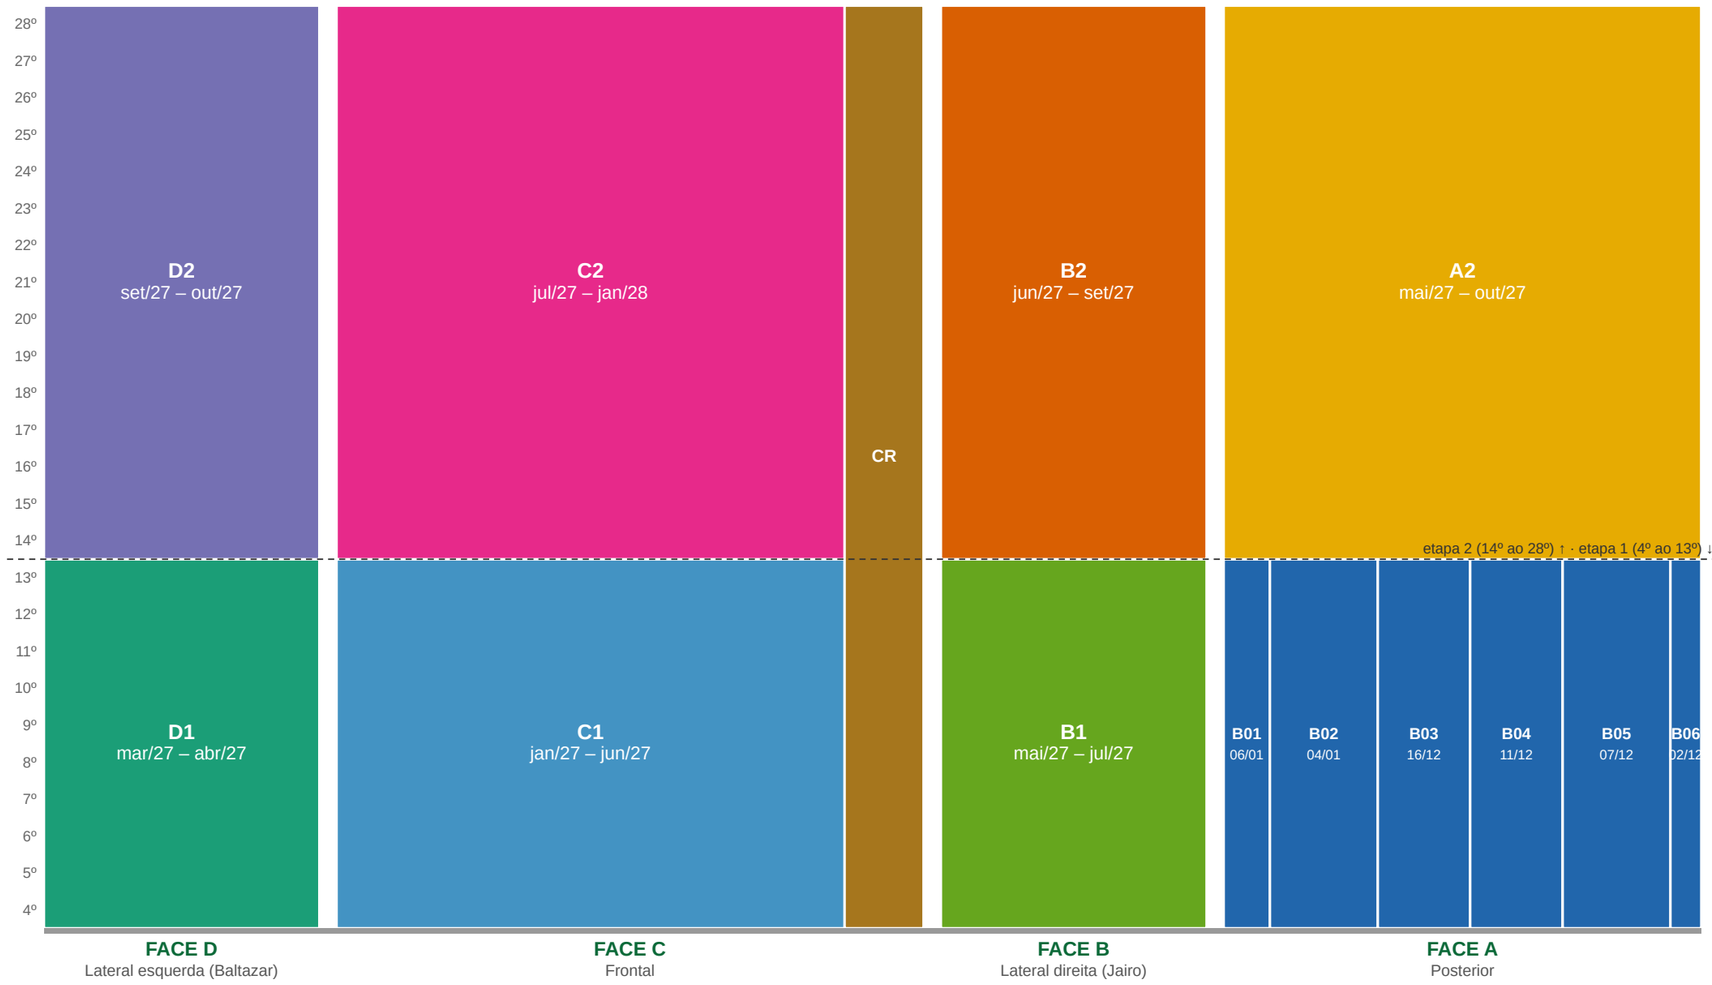

Embasamento (até o 3º pavimento) fora deste cronograma; limpeza final em todas as faces

PERÍODOS DE EXECUÇÃO

24/09/26 → 06/01/27
Face A · Posterior · 4º ao 13º · 5% realizado
6 balancins

14/01/27 → 02/06/27
Face C · Frontal · 4º ao 13º

18/03/27 → 22/04/27
Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 4º ao 13º

07/05/27 → 05/07/27
Face B · Lateral direita (Jairo) · 4º ao 13º

24/05/27 → 08/10/27
Face A · Posterior · 14º ao 28º

11/06/27 → 09/09/27
Face B · Lateral direita (Jairo) · 14º ao 28º

23/07/27 → 06/01/28
Face C · Frontal · 14º ao 28º

17/09/27 → 07/10/27
Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 14º ao 28º

20/10/27 → 17/03/28
Cremalheira (faixa da fachada frontal, 4º ao 28º)

20/03/28 → 23/05/28
Limpeza da fachada (todas as faces)

Datas de cada trecho e balancim na folha 2.

Ed. Jardim

Fachada · pavimentos 4º ao 28º · datas de execução por trecho e linha do tempo

DATAS DE EXECUÇÃO

24/09/26 → 06/01/27
Face A · Posterior · 4º ao 13º · 5% realizado

Balancim 06	14/10/26 a 02/12/26
Balancim 05	19/10/26 a 07/12/26
Balancim 04	22/10/26 a 11/12/26
Balancim 03	27/10/26 a 16/12/26
Balancim 02	30/10/26 a 04/01/27
Balancim 01	04/11/26 a 06/01/27

14/01/27 → 02/06/27
Face C · Frontal · 4º ao 13º

Frontal · 4º ao 13º	14/01/27 a 02/06/27

18/03/27 → 22/04/27
Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 4º ao 13º

Lateral esquerda (Baltazar) · 4º ao 13º	18/03/27 a 22/04/27

07/05/27 → 05/07/27
Face B · Lateral direita (Jairo) · 4º ao 13º

Lateral direita (Jairo) · 4º ao 13º	07/05/27 a 05/07/27

24/05/27 → 08/10/27
Face A · Posterior · 14º ao 28º

Posterior · 14º ao 28º	24/05/27 a 08/10/27

11/06/27 → 09/09/27
Face B · Lateral direita (Jairo) · 14º ao 28º

Lateral direita (Jairo) · 14º ao 28º	11/06/27 a 09/09/27

23/07/27 → 06/01/28
Face C · Frontal · 14º ao 28º

Frontal · 14º ao 28º	23/07/27 a 06/01/28

17/09/27 → 07/10/27
Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 14º ao 28º

Lateral esquerda (Baltazar) · 14º ao 28º	17/09/27 a 07/10/27


20/10/27 → 17/03/28
Cremalheira (faixa da fachada frontal, 4º ao 28º)

Faixa da cremalheira	20/10/27 a 17/03/28

20/03/28 → 23/05/28
Limpeza da fachada (todas as faces)

Limpeza final	20/03/28 a 23/05/28

LINHA DO TEMPO (SEMANAS)

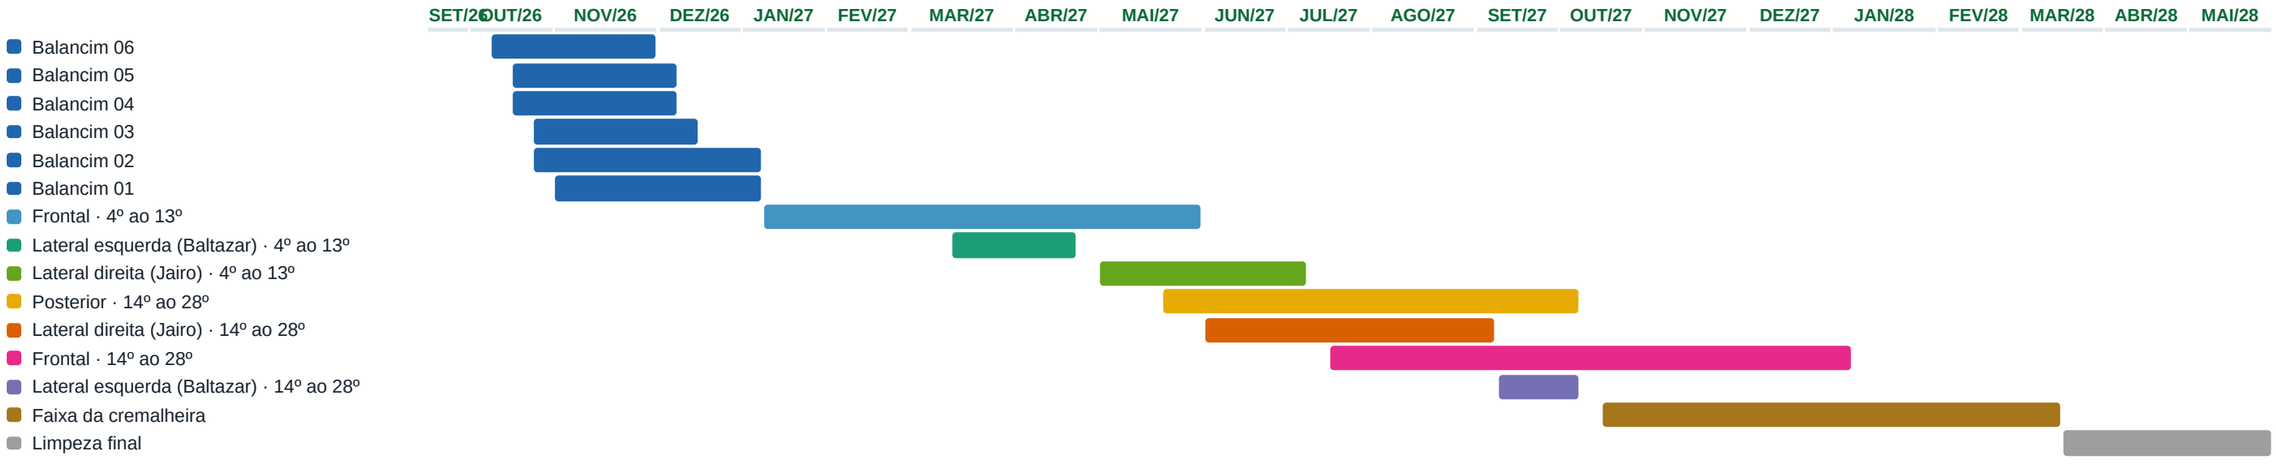

Datas pelo cronograma de atividades do Prevision (lote FACHADA, cenário Prevision Atual de 19/10/2026): cada face em duas etapas (4º ao 13º e 14º ao 28º) e a faixa da cremalheira; a face A etapa 1 é detalhada por balancim (fixação de granito). Larguras das faces proporcionais ao m² por pavimento do estudo de balancins; desenho esquemático, sem escala.
