

Ed. Jardim

Fachada · pavimentos 4º ao 28º · elevação por período de execução

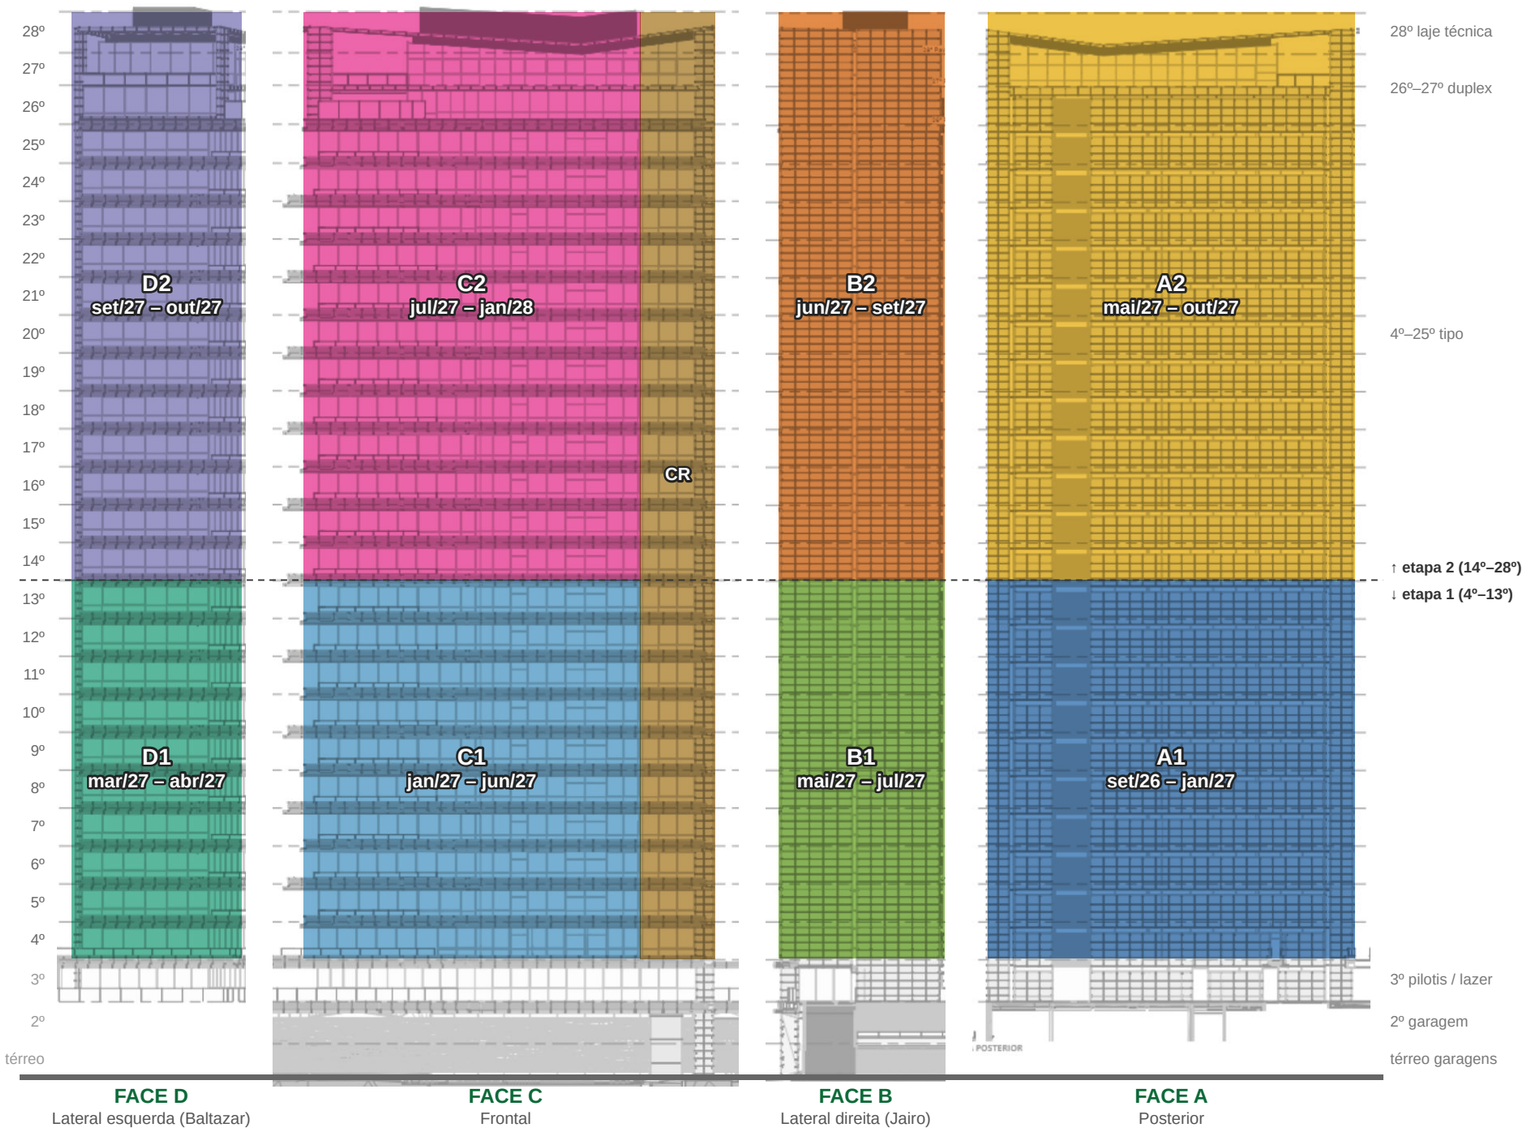

Embasamento (até o 3º pavimento) fora deste cronograma; limpeza final em todas as faces

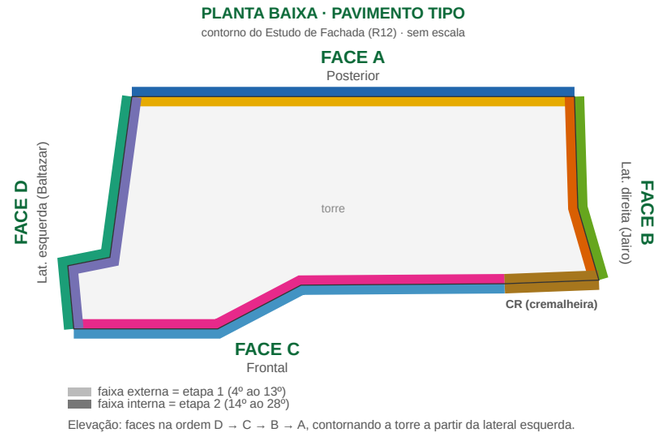

PERÍODOS DE EXECUÇÃO

24/09/26 → 06/01/27
Face A · Posterior · 4º ao 13º · 5% realizado

14/01/27 → 02/06/27
Face C · Frontal · 4º ao 13º

18/03/27 → 22/04/27
Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 4º ao 13º

07/05/27 → 05/07/27
Face B · Lateral direita (Jairo) · 4º ao 13º

24/05/27 → 08/10/27
Face A · Posterior · 14º ao 28º

11/06/27 → 09/09/27
Face B · Lateral direita (Jairo) · 14º ao 28º

23/07/27 → 06/01/28
Face C · Frontal · 14º ao 28º

17/09/27 → 07/10/27
Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 14º ao 28º

20/10/27 → 17/03/28
Cremalheira (faixa da fachada frontal, 4º ao 28º)

20/03/28 → 23/05/28
Limpeza da fachada (todas as faces)

Datas de cada face e etapa na folha 2.

Ed. Jardim

Fachada · pavimentos 4º ao 28º · datas de execução por trecho e linha do tempo

DATAS DE EXECUÇÃO

24/09/26 → 06/01/27
Face A · Posterior · 4º ao 13º · 5% realizado
Posterior · 4º ao 13º — 24/09/26 a 06/01/27

14/01/27 → 02/06/27
Face C · Frontal · 4º ao 13º
Frontal · 4º ao 13º — 14/01/27 a 02/06/27

18/03/27 → 22/04/27
Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 4º ao 13º
Lateral esquerda (Baltazar) · 4º ao 13º — 18/03/27 a 22/04/27

07/05/27 → 05/07/27
Face B · Lateral direita (Jairo) · 4º ao 13º
Lateral direita (Jairo) · 4º ao 13º — 07/05/27 a 05/07/27

24/05/27 → 08/10/27
Face A · Posterior · 14º ao 28º
Posterior · 14º ao 28º — 24/05/27 a 08/10/27

11/06/27 → 09/09/27
Face B · Lateral direita (Jairo) · 14º ao 28º
Lateral direita (Jairo) · 14º ao 28º — 11/06/27 a 09/09/27


23/07/27 → 06/01/28
Face C · Frontal · 14º ao 28º
Frontal · 14º ao 28º — 23/07/27 a 06/01/28

17/09/27 → 07/10/27
Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 14º ao 28º
Lateral esquerda (Baltazar) · 14º ao 28º — 17/09/27 a 07/10/27

20/10/27 → 17/03/28
Cremalheira (faixa da fachada frontal, 4º ao 28º)
Faixa da cremalheira — 20/10/27 a 17/03/28

20/03/28 → 23/05/28
Limpeza da fachada (todas as faces)
Limpeza final — 20/03/28 a 23/05/28

LINHA DO TEMPO (SEMANAS)

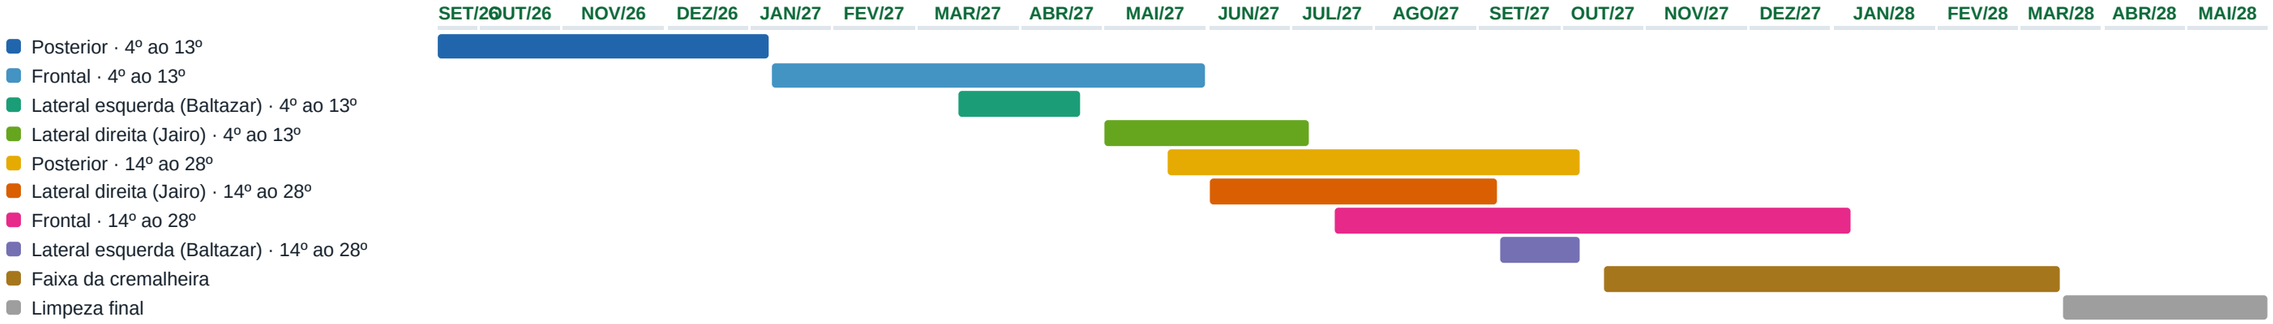

Datas pelo cronograma de atividades do Prevision (lote FACHADA, cenário Prevision Atual de 19/10/2026): cada face em duas etapas (4º ao 13º e 14º ao 28º) e a faixa da cremalheira, uma cor por face e etapa. Desenho: elevações do projeto (imagens do Estudo de fachada R12), na ordem D, C, B, A. Planta baixa: contorno do pavimento tipo da Planta de distribuição do Estudo de Fachada (R12); a cremalheira fica no trecho direito da frontal (balancim 20 do estudo).
