

Ed. Jardim

Fachada · pavimentos 4º ao 28º · elevação por período de execução

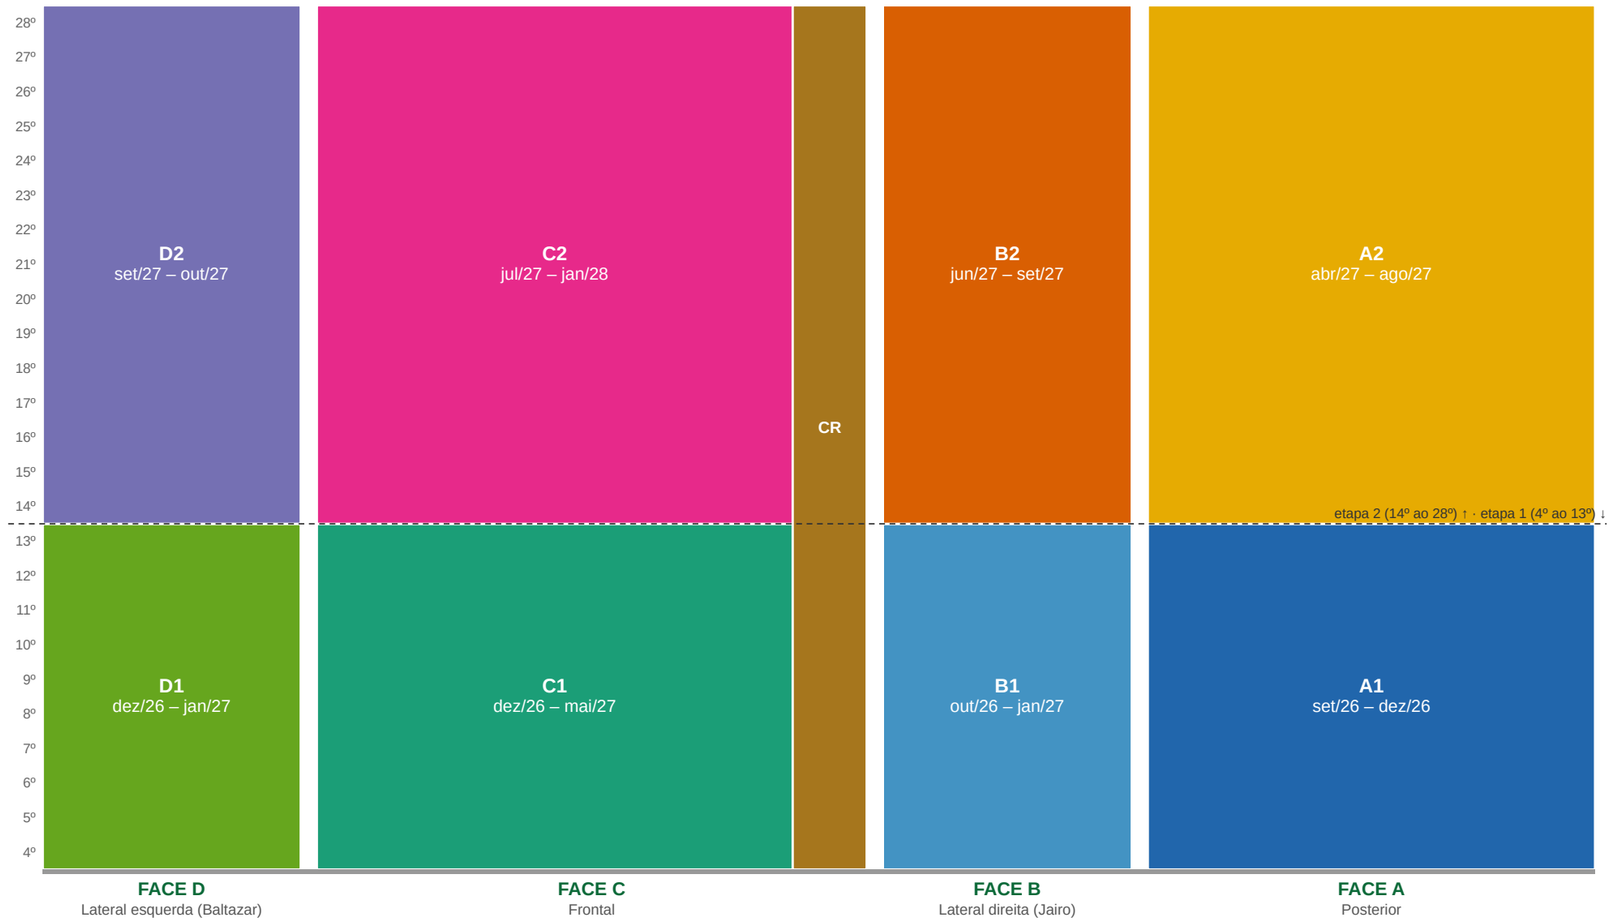

PLANTA BAIXA · PAVIMENTO TIPO

contorno do Estudo de Fachada (R12) · sem escala

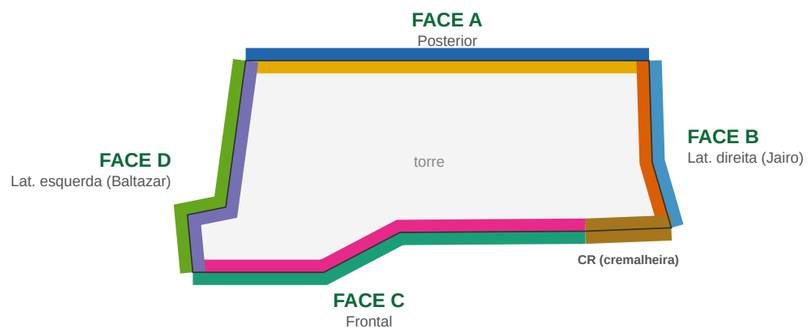

faixa externa = etapa 1 (4º ao 13º)
faixa interna = etapa 2 (14º ao 28º)

Elevação acima: faces na ordem D → C → B → A, contornando a torre a partir da lateral esquerda.

Embasamento (até o 3º pavimento) fora deste cronograma; limpeza final em todas as faces

PERÍODOS DE EXECUÇÃO

- **15/09/26 → 07/12/26**
  Face A · Posterior · 4º ao 13º
- **30/10/26 → 12/01/27**
  Face B · Lateral direita (Jairo) · 4º ao 13º
- **10/12/26 → 11/05/27**
  Face C · Frontal · 4º ao 13º
- **15/12/26 → 29/01/27**
  Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 4º ao 13º
- **01/04/27 → 18/08/27**
  Face A · Posterior · 14º ao 28º
- **11/06/27 → 09/09/27**
  Face B · Lateral direita (Jairo) · 14º ao 28º
- **23/07/27 → 06/01/28**
  Face C · Frontal · 14º ao 28º
- **17/09/27 → 07/10/27**
  Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 14º ao 28º
- **20/10/27 → 17/03/28**
  Cremalheira (faixa da fachada frontal, 4º ao 28º)
- **20/03/28 → 23/05/28**
  Limpeza da fachada (todas as faces)

Datas de cada trecho e balancim na folha 2.

Ed. Jardim

Fachada · pavimentos 4º ao 28º · datas de execução por trecho e linha do tempo

DATAS DE EXECUÇÃO

15/09/26 → 07/12/26
Face A · Posterior · 4º ao 13º
Posterior · 4º ao 13º — 15/09/26 a 07/12/26

30/10/26 → 12/01/27
Face B · Lateral direita (Jairo) · 4º ao 13º
Lateral direita (Jairo) · 4º ao 13º — 30/10/26 a 12/01/27

10/12/26 → 11/05/27
Face C · Frontal · 4º ao 13º
Frontal · 4º ao 13º — 10/12/26 a 11/05/27

15/12/26 → 29/01/27
Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 4º ao 13º
Lateral esquerda (Baltazar) · 4º ao 13º — 15/12/26 a 29/01/27

01/04/27 → 18/08/27
Face A · Posterior · 14º ao 28º
Posterior · 14º ao 28º — 01/04/27 a 18/08/27

11/06/27 → 09/09/27
Face B · Lateral direita (Jairo) · 14º ao 28º
Lateral direita (Jairo) · 14º ao 28º — 11/06/27 a 09/09/27


23/07/27 → 06/01/28
Face C · Frontal · 14º ao 28º
Frontal · 14º ao 28º — 23/07/27 a 06/01/28

17/09/27 → 07/10/27
Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 14º ao 28º
Lateral esquerda (Baltazar) · 14º ao 28º — 17/09/27 a 07/10/27

20/10/27 → 17/03/28
Cremalheira (faixa da fachada frontal, 4º ao 28º)
Faixa da cremalheira — 20/10/27 a 17/03/28

20/03/28 → 23/05/28
Limpeza da fachada (todas as faces)
Limpeza final — 20/03/28 a 23/05/28

LINHA DO TEMPO (SEMANAS)

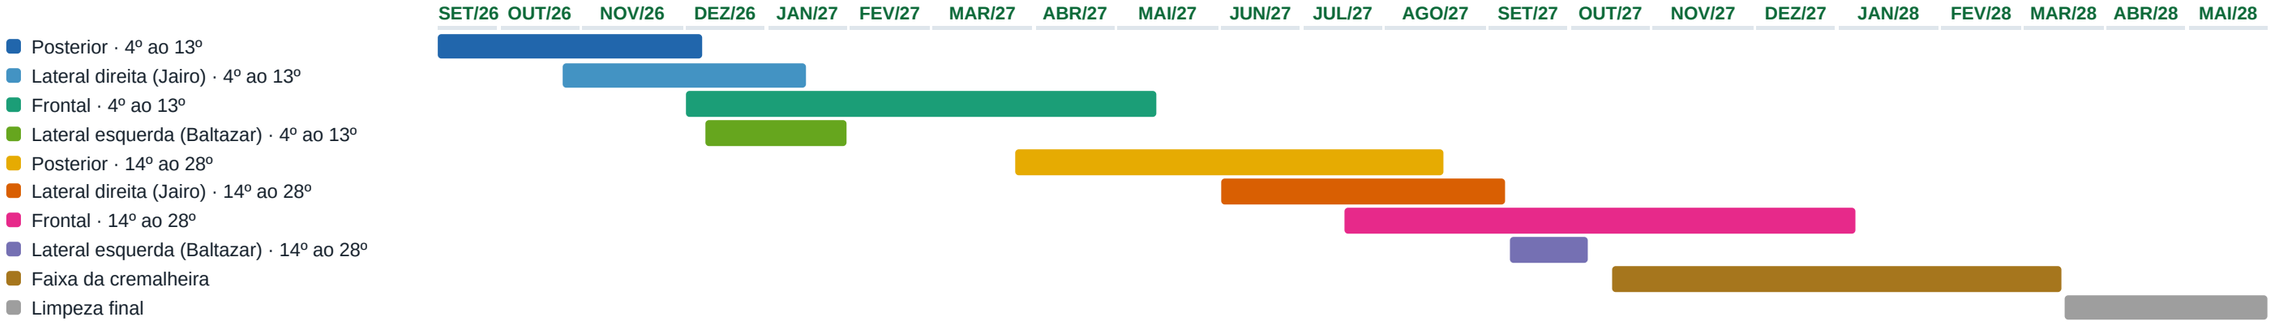

Datas pelo cronograma de atividades do Prevision (lote FACHADA, cenário Prevision Atual de 19/10/2026): cada face em duas etapas (4º ao 13º e 14º ao 28º) e a faixa da cremalheira; a face A etapa 1 é detalhada por balancim (fixação de granito). Larguras das faces proporcionais ao m² por pavimento do estudo de balancins; desenho esquemático, sem escala. Planta baixa: contorno do pavimento tipo da Planta de distribuição do Estudo de Fachada (R12); a cremalheira fica no trecho direito da frontal (balancim 20 do estudo).
