
Botânico · Curva física por cenário

Avanço físico acumulado dos itens diretos (26 PLs), ponderado pela projeção de cada PL · Corte: ago/26 · Realizado no corte: 11,80%

Curva S

Visão geral › passe o mouse no gráfico para ver o detalhamento do mês

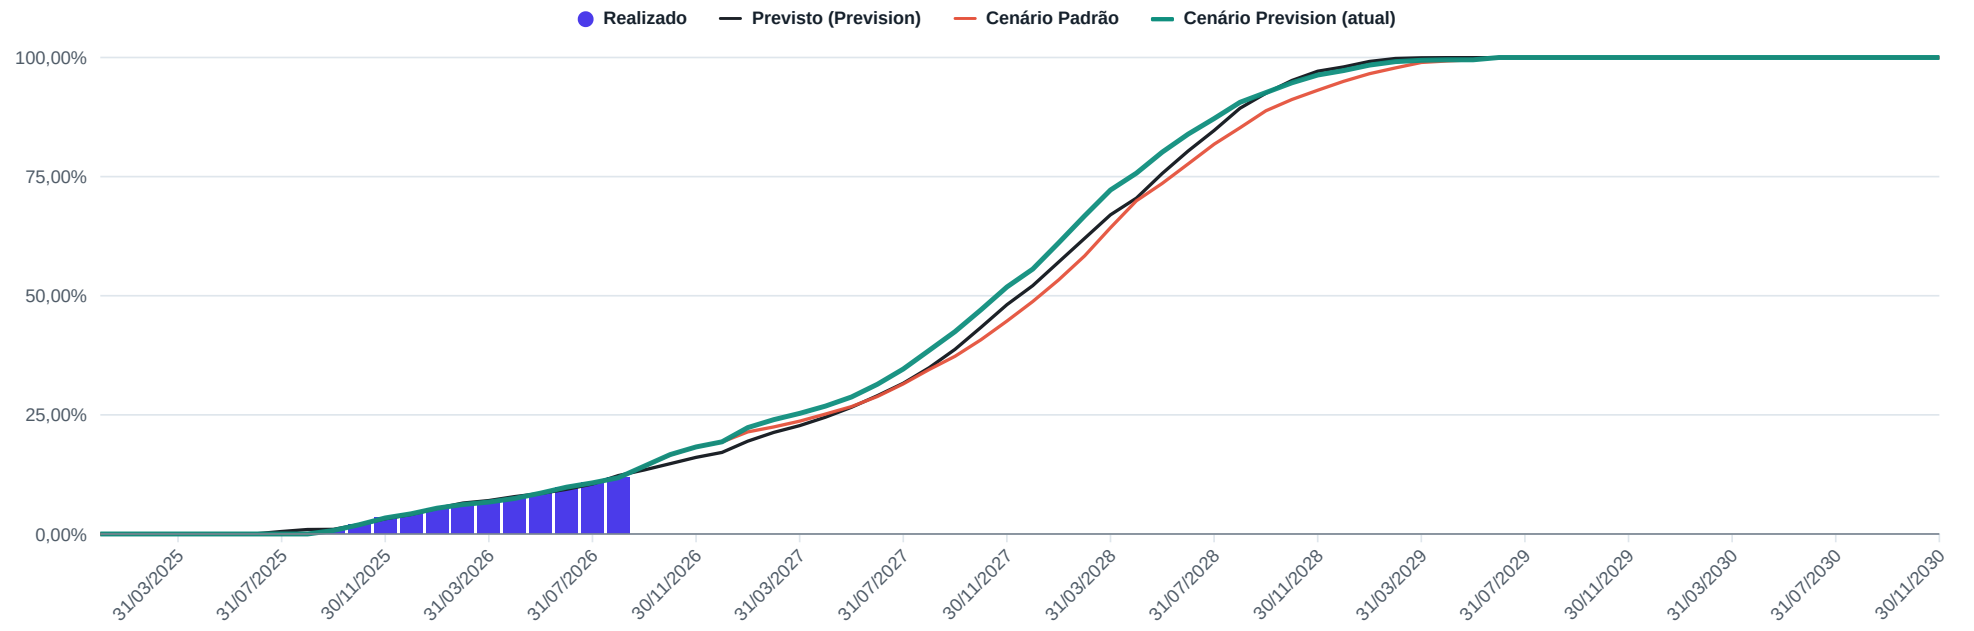

AVANÇO FÍSICO ACUMULADO NO FIM DE CADA ANO

Data	Realizado	Previsto (Previsão)	Padrão	Previsão
31/12/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
31/12/2025	4,2%	4,1%	4,2%	4,2%
31/12/2026	—	17,1%	19,3%	19,3%
31/12/2027	**—**	**52,1%**	**48,8%**	**55,6%**
31/12/2028	—	98,0%	95,0%	97,2%
31/12/2029	—	99,9%	100,0%	100,0%
Conclusão (100%)		—	jun/29	jun/29

POR PL EM 31/12/2027

PL	No corte	Prevision	Padrão	Prevision
SERVIÇOS INICIAIS	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
CONTENÇÃO	75,2%	100,0%	100,0%	100,0%
TERRAPLENAGEM	86,0%	100,0%	100,0%	100,0%
FUNDAÇÃO PROFUNDA	99,5%	100,0%	100,0%	100,0%
FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	76,7%	100,0%	95,7%	99,9%
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	8,1%	96,6%	97,5%	97,5%
ALVENARIA	0,0%	66,8%	58,5%	66,8%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,0%	30,5%	25,2%	30,5%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,0%	30,3%	18,6%	30,3%
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,0%	65,1%	24,1%	65,1%
INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	0,0%	65,9%	57,8%	65,9%
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,0%	33,6%	27,7%	33,6%
ELEVADORES	0,0%	0,0%	44,8%	44,8%
ESQUADRIAS	0,0%	4,7%	23,9%	23,9%
SERRALHERIA	0,0%	19,1%	15,9%	19,1%
MARCENARIA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	0,0%	61,5%	46,2%	61,5%
REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	0,0%	65,5%	51,6%	65,5%
REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	0,0%	23,3%	15,6%	23,3%
PAVIMENTAÇÃO	0,0%	25,8%	0,0%	25,8%
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	0,0%	41,4%	23,5%	41,4%
FORRO	0,0%	18,2%	11,3%	18,2%
LOUÇAS SANITÁRIAS	0,0%	0,0%	11,2%	11,2%
PINTURA	0,0%	15,0%	10,1%	15,2%
PAISAGISMO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Como a curva é montada. **Realizado** e **Previsto (Prevision)**: % acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision (aba CP RESUMO) de cada PL. **Cenários**: até o corte, o realizado; depois, o físico de cada PL avança na mesma proporção do desembolso que falta no cenário (curva financeira da aba da PL). PL sem desembolso futuro segue o previsto do Prevision. A obra é a média das PLs diretas ponderada pela projeção (R$ 124,5 mi). O Prevision pondera pelo custo do próprio cronograma, por isso o % dele pode ser um pouco diferente.
