Botânico

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision · cortes por apartamento


Concluído | Em andamento (50% a 99%) | Em andamento (1% a 49%) | A executar | Sem atividade da PL no pavimento

Botânico

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision

SITUAÇÃO EM 24/09/2026 (realizado do cronograma)

Pavimentos **1%** Infraestrutura **83%** Fachada **0%**

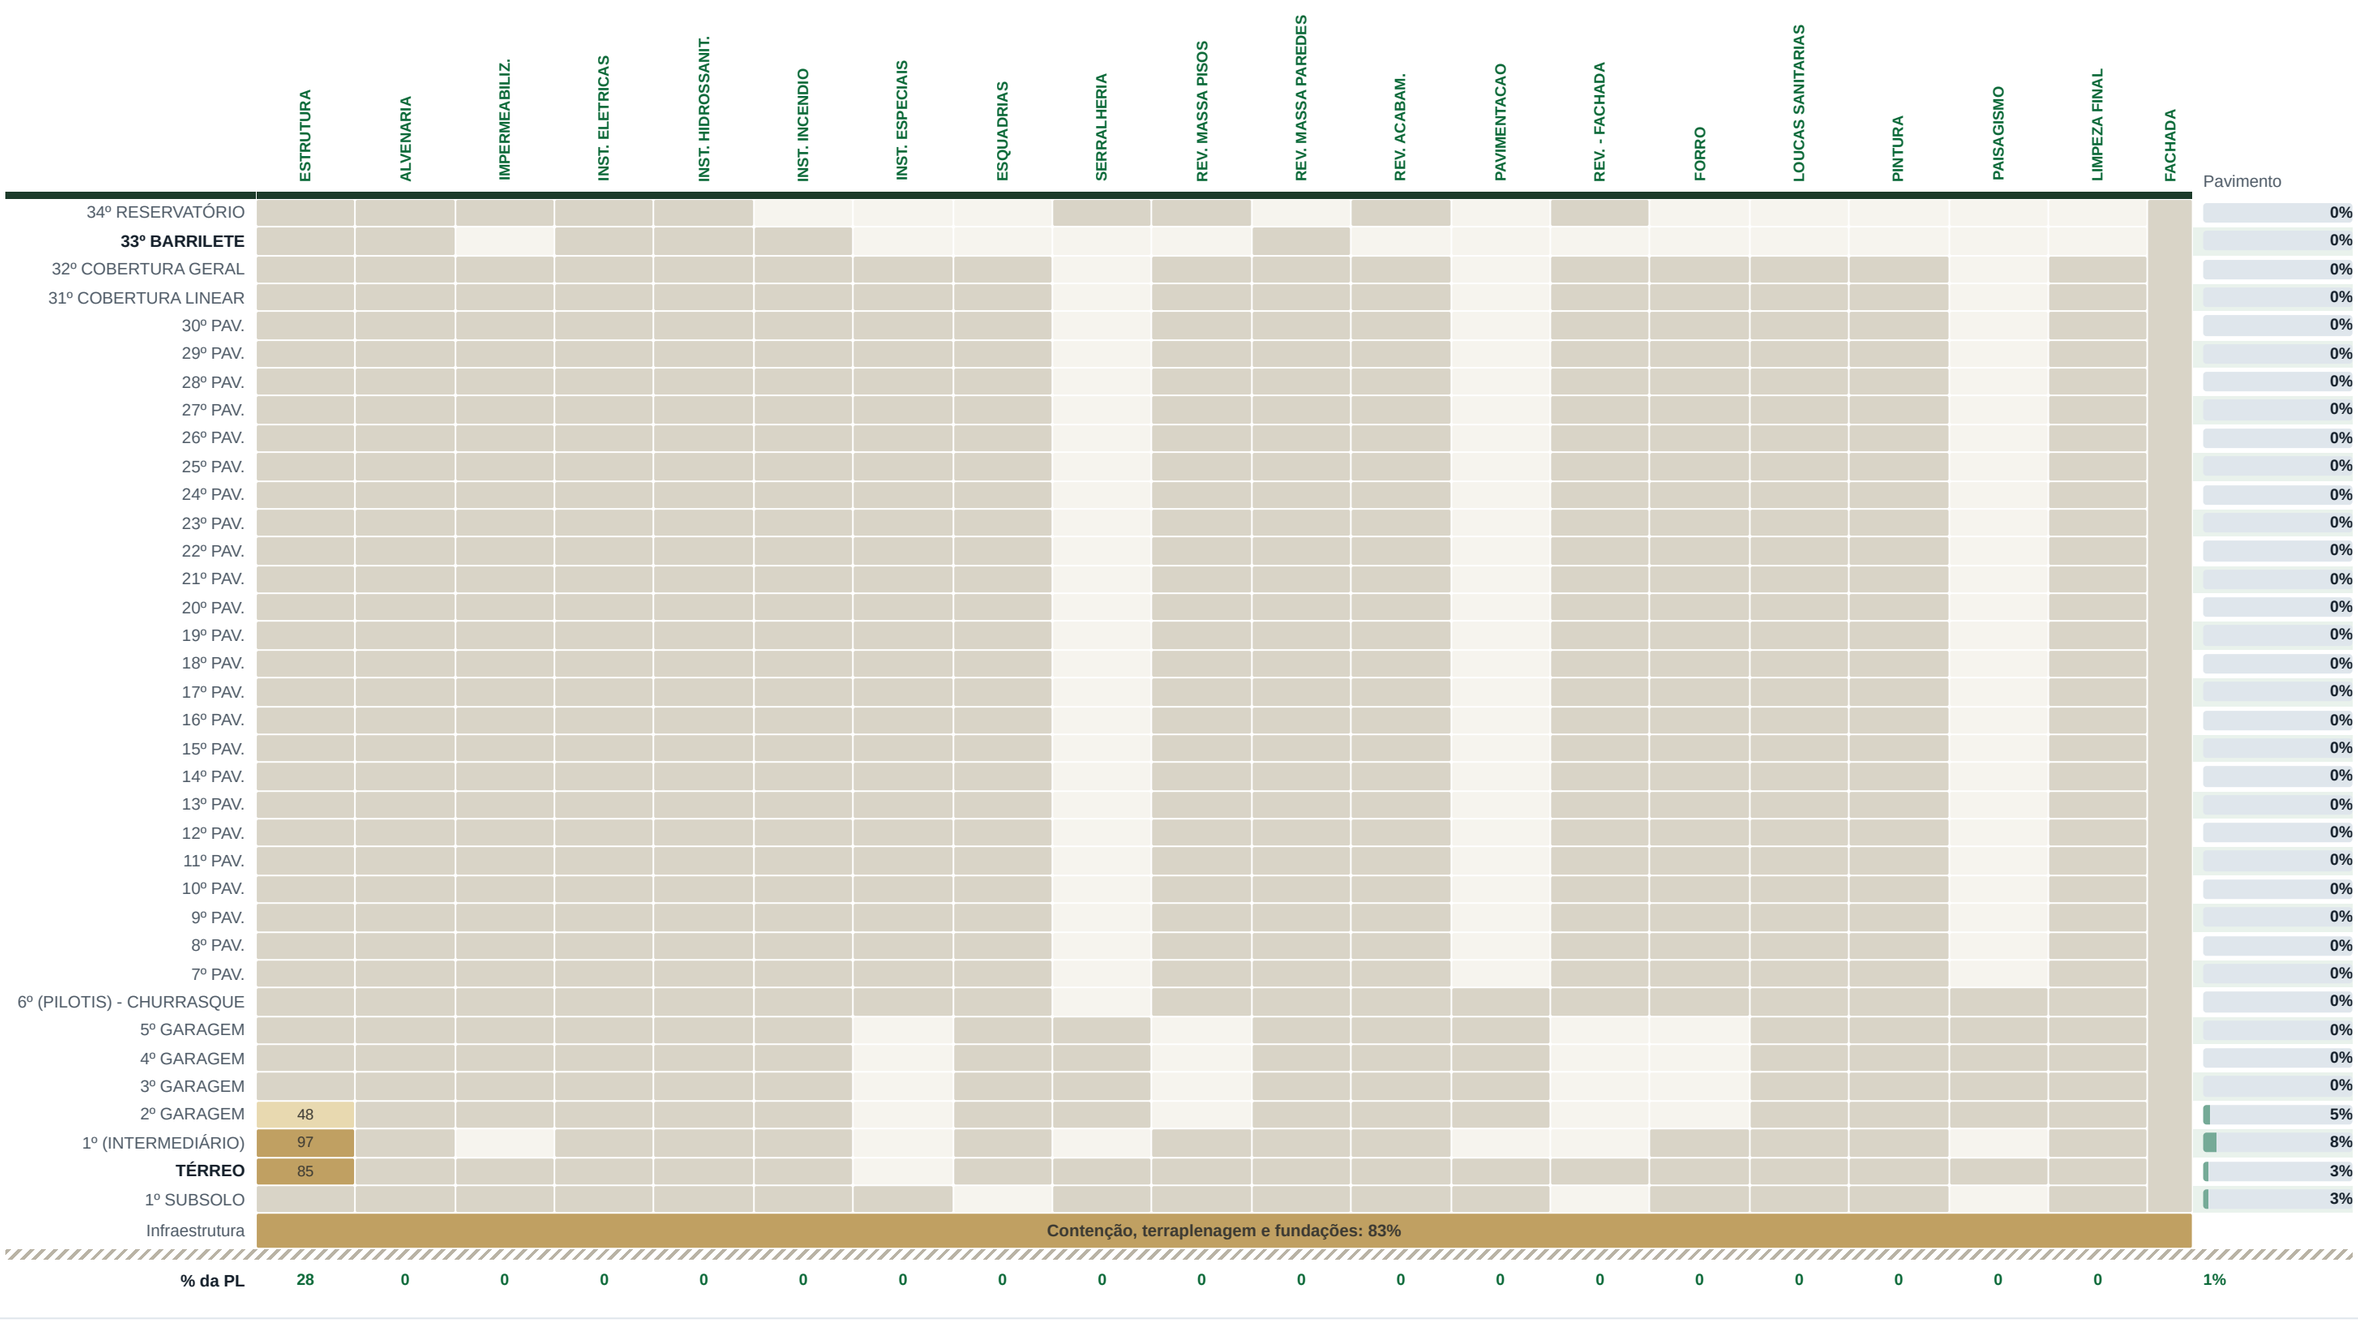

Botânico

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2026

Pavimentos **2%** Infraestrutura **98%** Fachada **0%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. ACABAM.	PAVIMENTACAO	REV. - FACHADA	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
34º RESERVATÓRIO																					0%
33º BARRILETE																					0%
32º COBERTURA GERAL																					0%
31º COBERTURA LINEAR																					0%
30º PAV.																					0%
29º PAV.																					0%
28º PAV.																					0%
27º PAV.																					0%
26º PAV.																					0%
25º PAV.																					0%
24º PAV.																					0%
23º PAV.																					0%
22º PAV.																					0%
21º PAV.																					0%
20º PAV.																					0%
19º PAV.																					0%
18º PAV.																					0%
17º PAV.																					0%
16º PAV.																					0%
15º PAV.																					0%
14º PAV.																					0%
13º PAV.																					0%
12º PAV.																					0%
11º PAV.																					0%
10º PAV.																					0%
9º PAV.																					0%
8º PAV.																					0%
7º PAV.																					0%
6º (PILOTIS) - CHURRASQUE																					0%
5º GARAGEM	63																				3%
4º GARAGEM	61																				3%
3º GARAGEM	57																				3%
2º GARAGEM	84																				8%
1º (INTERMEDIÁRIO)	100																				8%
TÉRREO	91																				3%
1º SUBSOLO																	46				9%
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 98%**																				
% da PL	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**		**2%**

Botânico

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision

RETRATO: PREVISÃO PARA 31/12/2027

Pavimentos **36%** Infraestrutura **100%** Fachada **33%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. ACABAM.	PAVIMENTACAO	REV. - FACHADA	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
34º RESERVATÓRIO																					0%
33º BARRILETE																					0%
32º COBERTURA GERAL	70																				3%
31º COBERTURA LINEAR	100																				3%
30º PAV.	100																				2%
29º PAV.	100	27																			5%
28º PAV.	100	28			11	75															9%
27º PAV.	100	46			18	100					30										12%
26º PAV.	100	52		9	35	100					55										18%
25º PAV.	100	49		13	52	100		21			50										22%
24º PAV.	100	52		13	51	100		34			67										24%
23º PAV.	100	48		20	60	100		33			100										27%
22º PAV.	100	51		24	72	100		33		45	100										31%
21º PAV.	100	62		26	66	100		37		100	100										33%
20º PAV.	100	75		32	76	100	27	35		100	100										39%
19º PAV.	100																				2%
18º PAV.	100	81		37	100	100	55	37		100	100										45%
17º PAV.	100	100	45	37	100	100	55	29		100	100										47%
16º PAV.	100	100	100	39	100	100	52	31		100	100	13									49%
15º PAV.	100	100	100	39	100	100	50	31		100	100	32									51%
14º PAV.	100	100	100	37	100	100	50	38		100	100	49									53%
13º PAV.	100	100	100	52	100	100	52	34		100	100	62									57%
12º PAV.	100	100	100	75	100	100	50	32		100	100	64			45						63%
11º PAV.	100	100	100	76	100	100	50	31		100	100	62			100						64%
10º PAV.	100	100	100	75	100	100	44	33		100	100	63			100						63%
9º PAV.	100	100	100	79	100	100	55	35		100	100	61			100						65%
8º PAV.	100	100	100	77	100	100	55	51		100	100	59			100						66%
7º PAV.	100	100	100	75	100	100	50	68		100	100	59			100		20				68%
6º (PILOTIS) - CHURRASQUE	100	17																			3%
5º GARAGEM	100	61		19					27		11						30				23%
4º GARAGEM	100	73		28	62				81		33						36				37%
3º GARAGEM	100	72	71	34	74	43			100		100						27				47%
2º GARAGEM	100	100	100	68	100	100			100		100						29				69%
1º (INTERMEDIÁRIO)	100	73		9	62	100					39										27%
TÉRREO	100	93		49	100	100				79	93	43	29	74	37		9				47%
1º SUBSOLO	100	100	100	50	100	100	100		100	100	100	42					46				64%
Infraestrutura	Contenção, terraplenagem e fundações: 100%																				
% da PL	**95**	**65**	**22**	**33**	**60**	**71**	**24**	**15**	**56**	**48**	**64**	**21**	**15**	**39**	**21**	**0**	**9**	**0**	**0**		**36%**

Pavimentos: nº na coluna N da aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (lote do Prevision). PLs com atividades em pelo menos 3 pavimentos; infraestrutura = contenção, terraplenagem, fundação profunda, fundação superficial; fachada = revestimento diversos - fachada (lotes sem pavimento). Previsão: o saldo de cada tarefa segue linear da data da situação (ou do início planejado) até o término planejado. Esquema ilustrativo, sem escala, não substitui o levantamento em campo.
