ED JARDIM · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Setembro/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: Prevision ajustado · R$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL
R$ 154,7 mi
orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE
R$ 45,9 mi
29,7% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027
R$ 53,5 mi
realizado + previsto

SALDO A REALIZAR
R$ 108,8 mi
após a data de corte

CONFERÊNCIA
✓ Tudo OK
detalhes abaixo


REALIZADO (ATUAL) — **Outubro/2026**

COMPOSIÇÃO DO ANO


Ano	Anual R$	Acumulado R$	Anual %	Acumulado %	Realizado R$	A realizar R$
2024	R$ 5.778.713,93	R$ 5.778.713,93	3,74%	3,74%	R$ 5.778.713,93	-
2025	R$ 18.489.705,84	R$ 24.268.419,77	11,95%	15,69%	R$ 18.489.705,84	-
2026	R$ 34.142.093,38	R$ 58.410.513,15	22,07%	37,76%	R$ 21.604.582,49	R$ 12.537.510,89
2027	**R$ 53.460.558,96**	**R$ 111.871.072,11**	**34,56%**	**72,31%**	**-**	**R$ 53.460.558,96**
2028	R$ 34.046.315,14	R$ 145.917.387,24	22,01%	94,32%	-	R$ 34.046.315,14
2029	R$ 6.062.842,40	R$ 151.980.229,64	3,92%	98,24%	-	R$ 6.062.842,40
2030	R$ 2.725.430,97	R$ 154.705.660,62	1,76%	100,00%	-	R$ 2.725.430,97
TOTAL	**R$ 154.705.660,62**		**100,00%**		**R$ 45.873.002,26**	**R$ 108.832.658,36**

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

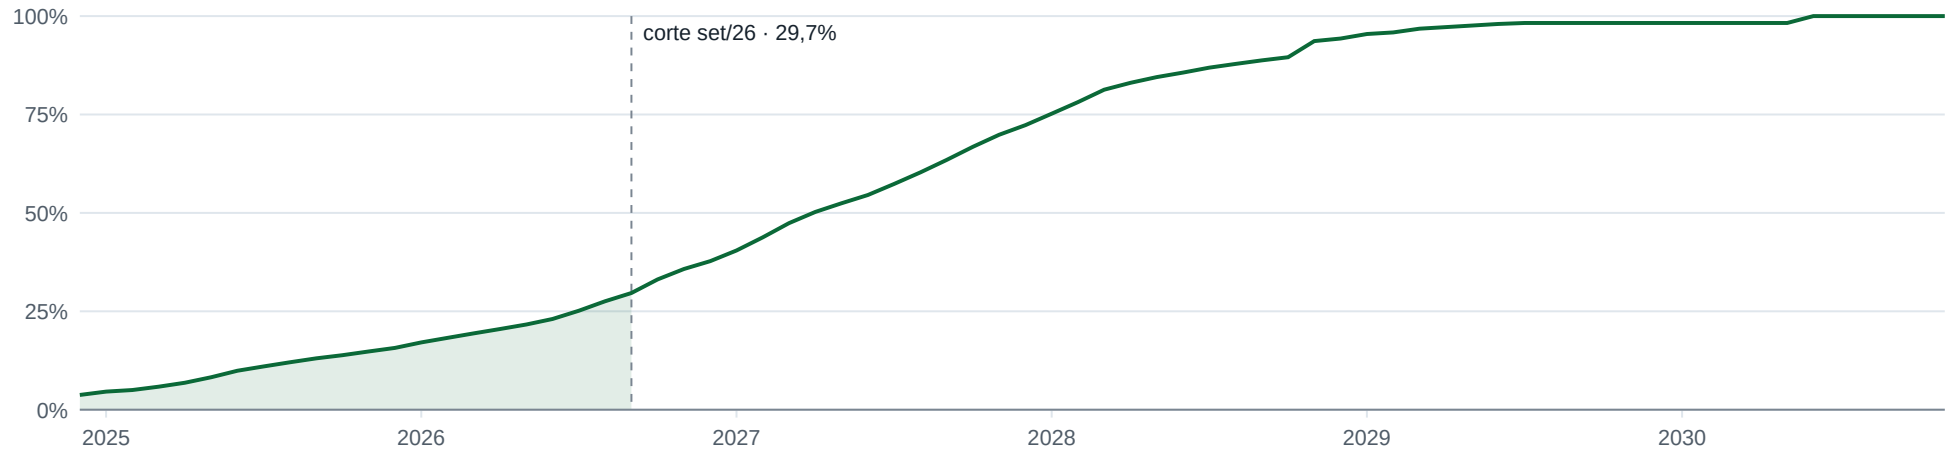

DESEMBOLSO ANUAL (R$ MILHÕES)

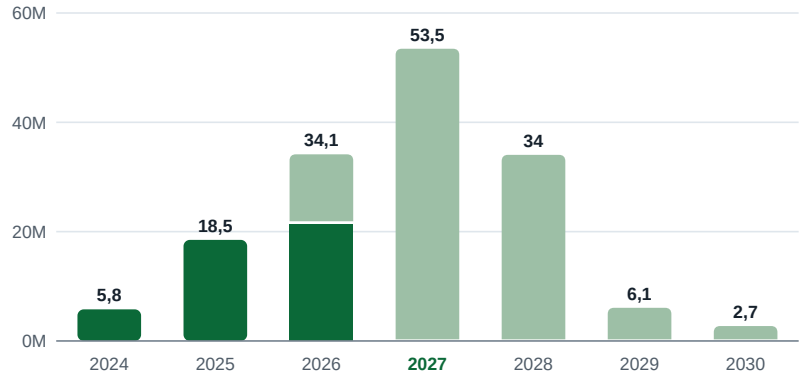

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

Grupo	R$	% do ano	Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)	R$ 7.877.670,08	14,7%	85,7%
Infraestrutura (12 a 16)	R$ 321.760,72	0,6%	99,8%
Estrutura (17)	R$ 3.895.664,26	7,3%	98,6%
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)	R$ 15.040.157,93	28,1%	70,4%
Acabamentos (25 a 37)	R$ 26.325.305,97	49,2%	53,4%
Taxa de administração	R$ 0,00	0,0%	
TOTAL	**R$ 53.460.558,96**	**100,0%**	

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.
