
# Ed. Jardim

Impermeabilização · 3º pavimento (lazer) · planta por período de execução

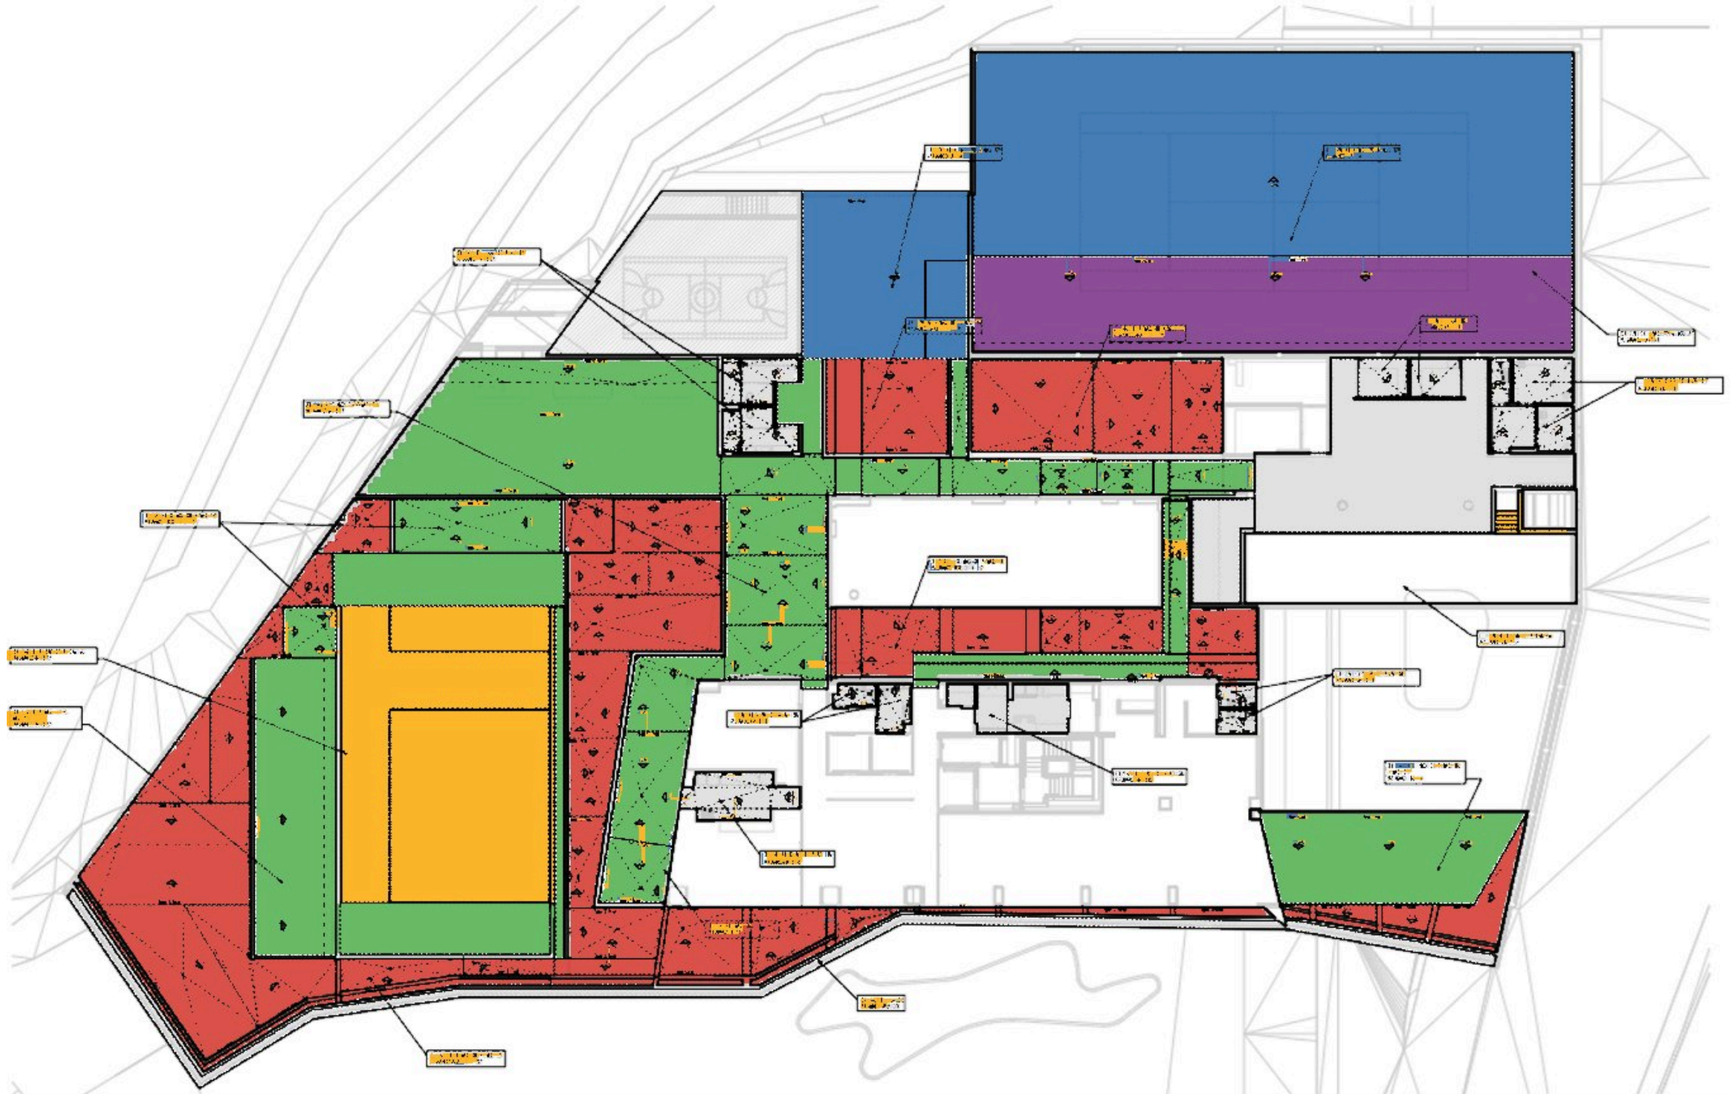

Argamassa flexível (áreas molhadas) e tratamentos com resina/cristalizante: fora deste cronograma

## PERÍODOS DE EXECUÇÃO

**4ª sem. ago/26 → 2ª sem. nov/26**
Sistema B · dupla manta asfáltica (3 + 4 mm)
8 ambientes · 810 m²

**4ª sem. out/26 → 2ª sem. dez/26**
Sistema C · piscinas (opção 01, dupla manta + antieflorescência)
2 ambientes · 482 m²

**2ª sem. nov/26 → 2ª sem. abr/27**
Sistema D · dupla manta antiraiz + drenante (jardins)
1 ambiente · 1.074 m²

**4ª sem. jan/27 → 4ª sem. fev/27**
Sistema B · dupla manta asfáltica (3 + 4 mm)
1 ambiente · 229 m²

**1ª sem. mar/27 → 2ª sem. jun/27**
Sistema A · manta asfáltica simples (4 mm)
3 ambientes · 586 m²

Período = da regularização à proteção mecânica. Datas de cada ambiente na folha 2.

# Ed. Jardim

Impermeabilização · 3º pavimento (lazer) · datas de execução por ambiente e linha do tempo

## DATAS DE EXECUÇÃO

### 4ª sem. ago/26 → 2ª sem. nov/26

Sistema B · dupla manta asfáltica (3 + 4 mm) · 810 m²

| | |
|---|---|
| Bar da piscina<br>regularização 4ª sem. ago/26 · proteção 3ª sem. set/26 (estimadas) | manta 1ª sem. set/26 a 2ª sem. set/26 |
| Deck da piscina descoberta<br>regularização 2ª sem. set/26 · proteção 4ª sem. set/26 (estimadas) | manta 3ª sem. set/26 |
| Terraço do salão de festas<br>regularização 3ª sem. set/26 · proteção 1ª sem. out/26 (estimadas) | manta 4ª sem. set/26 |
| Circulação externa e varanda do espaço kids e gourmet<br>regularização 3ª sem. set/26 · proteção 4ª sem. out/26 a 1ª sem. nov/26 (estimadas) | manta 4ª sem. set/26 a 3ª sem. out/26 |
| Circulação externa coberta/descoberta<br>regularização 2ª sem. out/26 · proteção 4ª sem. out/26 (estimadas) | manta 3ª sem. out/26 |
| Circulação interna (trecho 1)<br>regularização 3ª sem. out/26 · proteção 1ª sem. nov/26 (estimadas) | manta 4ª sem. out/26 |
| Circulação interna (trecho 2)<br>regularização 3ª sem. out/26 · proteção 1ª sem. nov/26 (estimadas) | manta 4ª sem. out/26 |
| Estar da piscina<br>regularização 4ª sem. out/26 · proteção 2ª sem. nov/26 (estimadas) | manta 1ª sem. nov/26 |

### 4ª sem. out/26 → 2ª sem. dez/26

Sistema C · piscinas (opção 01, dupla manta + antieflorescência) · 482 m²

| | |
|---|---|
| Piscina, piscina infantil e prainha (com paredes)<br>regularização 4ª sem. out/26 a 1ª sem. nov/26 · proteção 1ª sem. dez/26 a 2ª sem. dez/26 (estimadas) | manta 2ª sem. nov/26 a 4ª sem. nov/26 |
| Piscina raia, SPA e escada (com paredes)<br>regularização 3ª sem. nov/26 · proteção 2ª sem. dez/26 (estimadas) | manta 4ª sem. nov/26 a 1ª sem. dez/26 |

### 2ª sem. nov/26 → 2ª sem. abr/27

Sistema D · dupla manta antiraiz + drenante (jardins) · 1.074 m²

| | |
|---|---|
| Jardins sobre laje 01 a 06 (playground e ducha), beirais 01 e 02<br>regularização 2ª sem. nov/26 a 1ª sem. dez/26 · proteção 1ª sem. mar/27 a 2ª sem. abr/27 (estimadas) | manta 2ª sem. dez/26 a 4ª sem. fev/27 |

### 4ª sem. jan/27 → 4ª sem. fev/27

Sistema B · dupla manta asfáltica (3 + 4 mm) · 229 m²

| | |
|---|---|
| Quadra de tênis (faixa em dupla manta)<br>regularização 4ª sem. jan/27 · proteção 3ª sem. fev/27 a 4ª sem. fev/27 (estimadas) | manta 1ª sem. fev/27 a 2ª sem. fev/27 |

### 1ª sem. mar/27 → 2ª sem. jun/27


Sistema A · manta asfáltica simples (4 mm) · 586 m²

| | |
|---|---|
| Quadra de tênis | 2ª sem. abr/27 a 3ª sem. mai/27 |
| Piso de apoio das quadras | 2ª sem. abr/27 a 3ª sem. mai/27 |
| Circulação externa e varanda do espaço kids e gourmet | 2ª sem. abr/27 a 3ª sem. mai/27 |

Regularização: 1ª sem. mar/27 a 1ª sem. abr/27 · Aplicação da manta: 2ª sem. abr/27 a 3ª sem. mai/27 · Proteção mecânica: 4ª sem. mai/27 a 2ª sem. jun/27

**Replanejado: começa no 1º dia útil de março/27 (01/03/2027)**

## LINHA DO TEMPO (SEMANAS)

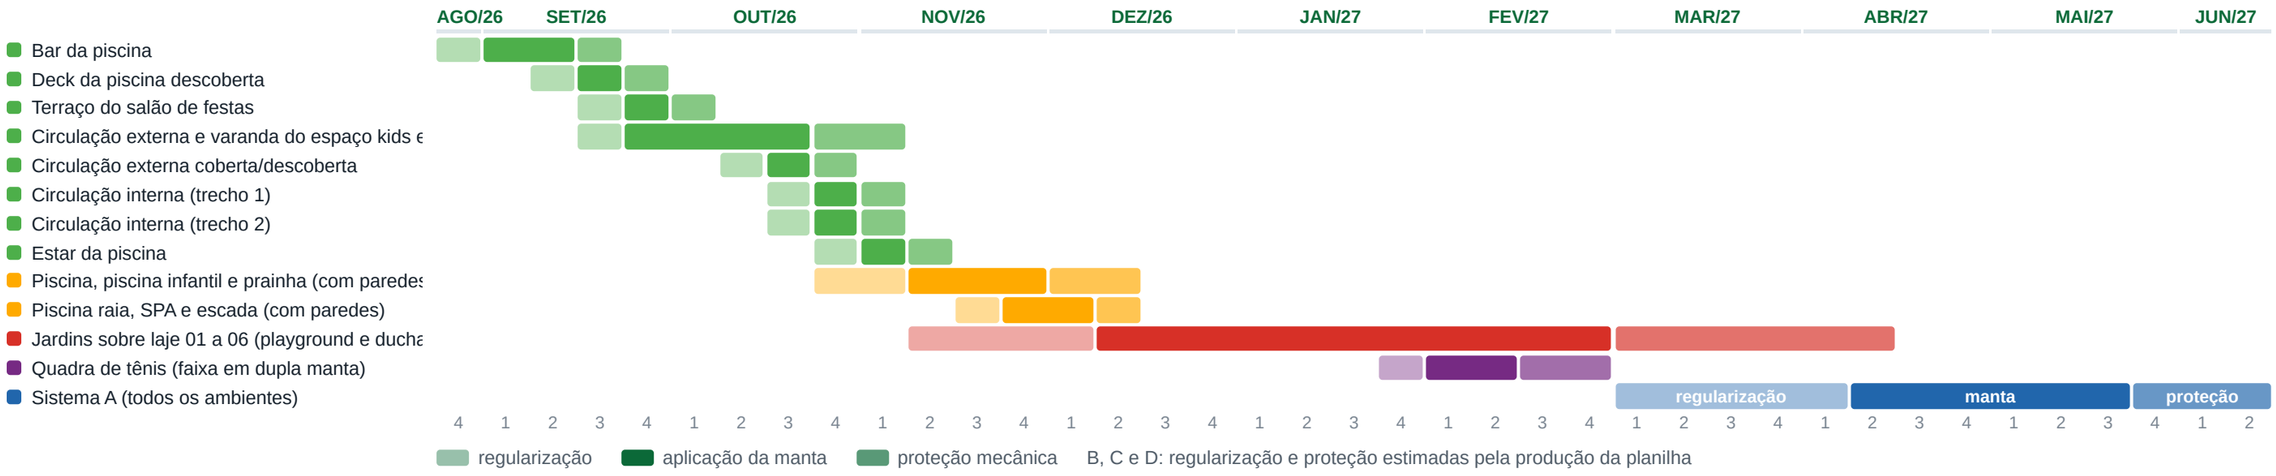


Datas = semanas de aplicação da manta em cada ambiente (no sistema A, também regularização e proteção mecânica), pelo cronograma de impermeabilização (Crono_Imper_Ed_Jardim). Cores da planta pelos sistemas do projeto de impermeabilização; no sistema B a planta mostra o período do conjunto (set–nov/26) e a legenda traz a semana de cada ambiente. Nos sistemas B, C e D a planilha só detalha a manta por ambiente: regularização (antes) e proteção mecânica (depois) são estimadas pela produção da planilha (288 e 210 m²/semana), sem nivelar as equipes entre ambientes. Sistema A replanejado em 19/10/2026: começa no 1º dia útil de março/27 (01/03/2027), com as mesmas durações do cronograma. Não considera ralos, rodapés e detalhes.
