Torre Catharina · Gantt do cronograma


4.059 atividades do Prevision (situação em 28/09/26) · PL → pacote de trabalho → pavimento/tarefa · clique na seta para abrir

Planejado (início → término) · Realizado (% do Prevision) · Concluído · **Não descrito de forma expressa na curva do Prevision** (notas na última página) · Previsto para a data (atraso > 5 p.p.) · Situação 28/09/26 · 31/12/2027


PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▼ CONTENÇÃO	05/03/25	21/09/26	100%
► CONTENÇÕES TRECHO 2	05/03/25	13/05/25	100%
► CONTENÇÃO TRECHO 6	10/03/25	21/05/25	100%
► CONTENÇÕES - ESTACAS EM TRADO 1º FASE	01/04/25	30/04/25	100%
► CONTENÇÃO TRECHO 7	28/04/25	07/11/25	100%
► CONTENÇÃO TRECHO 4	05/05/25	12/06/25	100%
► CONTENÇÕES - GERAL	12/05/25	10/12/25	100%
► CONTENÇÃO TRECHO 3	02/06/25	24/06/25	100%
► CONTENÇÕES EM ESTACAS	26/06/25	06/08/25	100%
► CONTENÇÃO TRECHO 5	09/07/25	07/08/25	100%
► TIRANTES	23/07/25	11/09/25	100%
► VIGA DE COROAMENTO	22/08/25	10/12/25	100%
► CONTENÇÃO - BLOCO DO ELEVADOR	28/08/25	01/12/25	100%
► CONCRETO PROJETADO (CONTENÇÕES)	12/09/25	19/06/26	100%
► CONTENÇÃO - SUBESTAÇÃO	21/10/25	28/10/25	100%
► CONTENÇÃO - CORTINA 3	08/01/26	20/07/26	100%
► CONCRETO PROJETADO - LOOKAHEAD	18/05/26	17/06/26	100%
► CONTENÇÃO - CORTINA 1	28/05/26	19/06/26	100%
► CONTENÇÃO - CORTINA 2	05/06/26	08/07/26	100%
► FECHAMENTO ABAIXO DAS VIGAS DE COROA…	04/08/26	21/09/26	93%
▼ FUNDAÇÃO PROFUNDA 1 inferido	15/04/25	12/09/25	100%




PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▸ PRIMEIRA PRAÇA DE TRABALHO - TUBUL…	15/04/25	11/06/25	100%
▸ FUNDAÇÕES PROFUNDAS - GERAL	24/04/25	12/09/25	100%
▸ FUNDAÇÕES ACESSO FRONTAL	28/04/25	09/05/25	100%
▸ FUNDAÇÕES PRIMEIRA PRAÇA DE TRABALHO	12/05/25	21/05/25	100%
▸ FUNDAÇÕES SEGUNDA PRAÇA DE TRABALHO	27/05/25	02/07/25	100%
▸ FUNDAÇÕES CHOPP DA FÁBRICA	09/06/25	17/06/25	100%
▸ FUNDAÇÕES 1125 PRÉDIO	18/07/25	05/09/25	100%
▸ ÚLTIMA FASE DE FUNDAÇÕES - PRÉDIO	21/08/25	12/09/25	100%
▾ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	12/05/25	03/08/26	100%
▸ BLOCOS E CINTAS - PERIFERIA ALAMEDA	12/05/25	02/09/25	100%
▸ BLOCOS E CINTAS - MEDIÇÃO	16/05/25	12/05/26	100%
▸ BLOCOS E CINTAS - TORRE	30/07/25	14/11/25	100%
▸ BLOCOS E CINTAS - LOOKAHEAD	11/03/26	03/08/26	100%
▾ SERVIÇOS INICIAIS	12/05/25	30/05/25	100%
▸ SERVIÇOS INICIAIS - ADEQUAÇÃO PARA INÍCI…	12/05/25	30/05/25	100%
▾ ESTRUTURA EM CONCRETO ARMA… 16 inferidos	04/06/25	13/07/27	79%
▸ ESTRUTURA - AFASTAMENTO FRONTAL - MED…	04/06/25	14/07/25	100%
▸ ESTRUTURA - PROJEÇÃO ALAMEDA - MEDIÇÃO	04/08/25	19/10/26	84%
▸ ESTRUTURA - PROJEÇÃO ALAMEDA (2º ETAP…	17/09/25	13/11/25	100%
▸ ESTRUTURA - PROJEÇÃO CONCORDIA - MEDI…	21/10/25	30/09/26	93%
▸ ESTRUTURA TORRE - MEDIÇÃO	10/11/25	13/07/27	52%
▸ ESTRUTURA ALAMEDA - LOOKAHEAD	19/11/25	09/10/26	69%
▸ ESTRUTURA- PROJEÇÃO OLYMPUS - MEDIÇÃO	24/11/25	11/12/26	77%
▸ ESTRUTURA TORRE - LOOKAHEAD	26/11/25	18/09/26	100%
▸ OBRA CIVIL CÂMARA	10/12/25	05/01/26	100%
▸ ESTRUTURA OLYMPUS - LOOKAHEAD	05/01/26	16/12/26	65%
▸ ESTRUTURA TORRE - ESCADA	07/01/26	15/07/26	100%
▸ ESTRUTURA - TRIPINHA - LOOKAHEAD	07/01/26	01/07/26	100%
▸ ESTRUTURA CONCORDIA - LOOKAHEAD	19/01/26	19/08/26	100%
▸ RESERVATÓRIO - LOOKAHEAD	02/02/26	02/03/26	100%

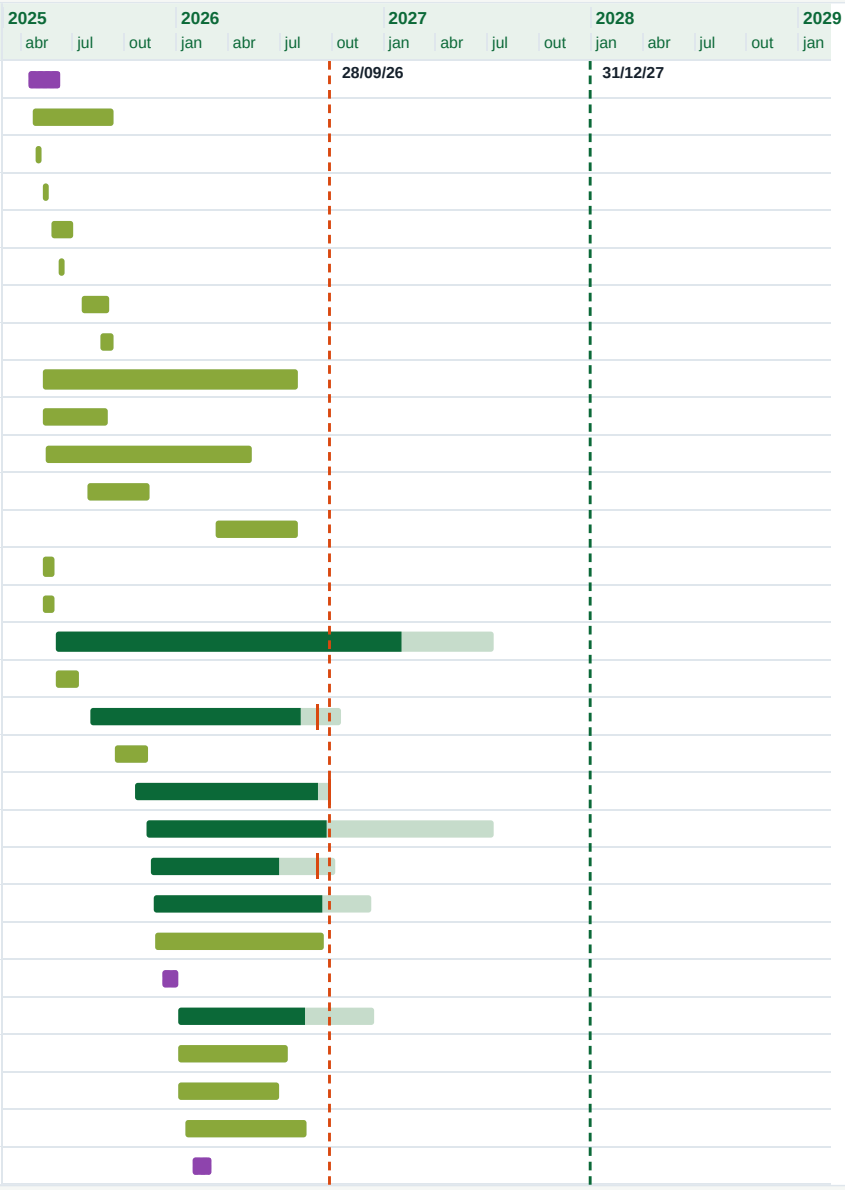


PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
ESTRUTURA - ESCADA DA TORRE	03/03/26	23/06/26	100%
ESTRUTURA LOOKAHEAD TAMPA RESERVAT…	03/03/26	06/03/26	100%
ESTRUTURA RAMPA 6° AO 5° SUBSOLO	30/03/26	16/04/26	100%
RAMPA PROJEÇÃO DA TORRE LOOKAHEAD	10/04/26	22/04/26	100%
PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO CONCOR…	16/04/26	01/06/26	100%
ESTRUTURA PROJEÇÃO RAMPA OLIMPUS	20/04/26	14/10/26	68%
ESTRUTURA TORRE LOOKAHEAD	04/05/26	27/05/26	100%
PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO TORRE L…	11/05/26	03/07/26	100%
VIGA DE FECHAMENTO LATERAL CHOPP …	18/05/26	22/05/26	100%
ESTRUTURA - OLIMPUS LOOKAHEAD	21/05/26	15/06/26	100%
ESTRUTURA - CONCORDIA LOOKAHEAD	25/05/26	30/09/26	68%
VIGA DE TRAVAMENTO VM1/VM2 LOOKAH…	28/05/26	08/06/26	100%
PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS…	02/06/26	21/08/26	100%
PISO EM CONCRETO E INSTALAÇÕES CHO…	02/06/26	03/07/26	100%
ESTRUTURA TORRE INTERMEDIÁRIO 3 LOOK…	02/06/26	10/06/26	100%
VIGAS DA LAJE DE SOLIDARIZAÇÃO DO 1° PA…	08/06/26	18/06/26	100%
PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS…	09/06/26	15/07/26	100%
LAJE CONTRAPISO - PISO ARMADO	10/06/26	30/09/26	95%
TRIPÃO 2° ETAPA ESTRUTURA LOOKAHEAD	30/06/26	15/07/26	100%
RAMPA DE VEÍCULOS - 5º AO 6º SS. (TERR…	14/09/26	04/11/26	3%
ESTRUTURA DA RAMPA ALAMEDA LOOKAHEAD	13/10/26	13/11/26	0%
RESERVATÓRIO OLYMPUS INTER 4 LOOKA…	23/10/26	06/11/26	0%
LAJE DE COBERTURA DO PILOTIS (CONC…	17/12/26	20/01/27	0%
LAJE COBERTURA PILOTIS (OLYMPUS)	17/12/26	20/01/27	0%
TERRAPLENAGEM	07/07/25	13/08/26	100%
TERRAPLENAGEM - LIBERAÇÃO DOS TIRANTES	07/07/25	11/07/25	100%
TERRAPLENAGEM GERAL	16/07/25	13/08/26	100%
TERRAPLENAGEM - PÓS TIRANTE	12/09/25	18/09/25	100%
RETIRADA/ESCAVAÇÃO DO TALUDE DA CONT…	08/04/26	10/04/26	100%
PINTURA 1 inferido	24/04/26	06/12/28	9%

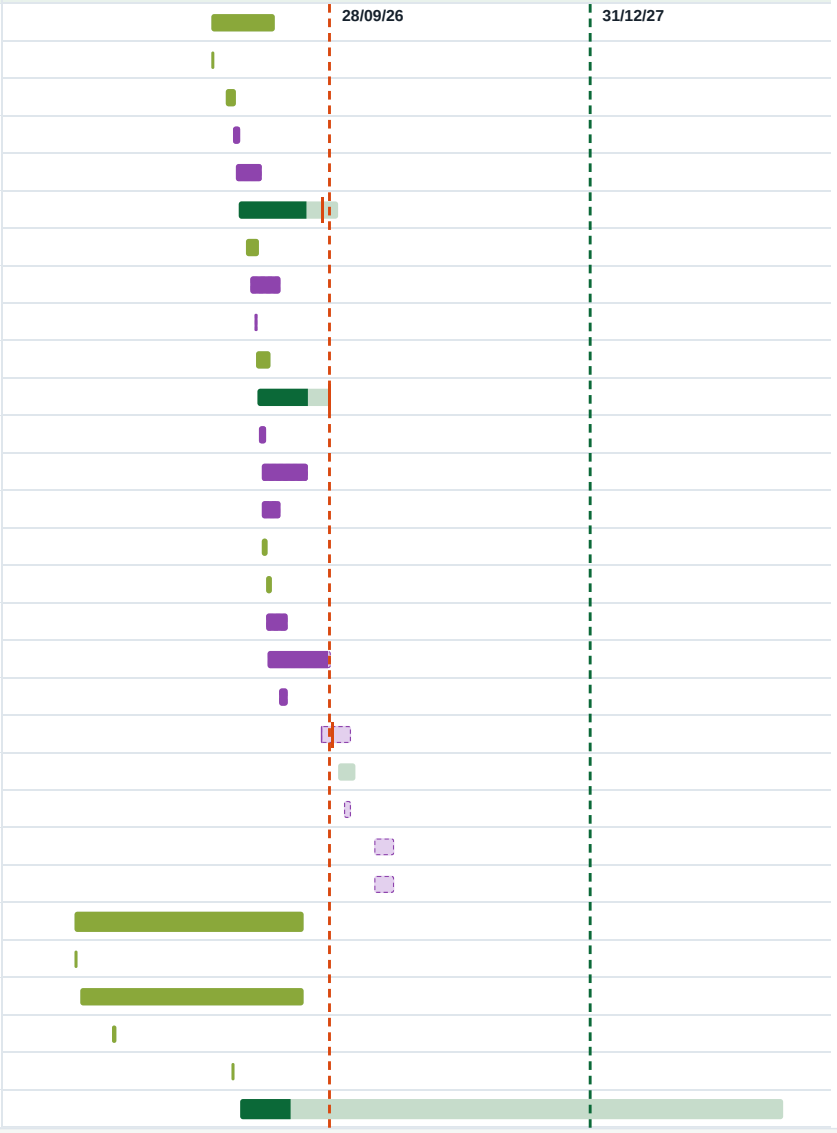


PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▸ TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE	24/04/26	28/09/27	55%
▸ PINTURA	24/02/27	07/11/28	0%
▸ MASSA CORRIDA	23/03/27	23/08/28	0%
▸ PINTURA 1º DEMÃO	03/05/27	01/09/28	0%
▸ PINTURA 2º DEMÃO	09/07/27	14/11/28	0%
▸ PINTURA 3º DEMÃO	19/08/27	06/12/28	0%
▾ ALVENARIA (4 inferidos)	27/04/26	13/12/28	6%
▸ ALVENARIA	27/04/26	25/11/27	19%
▸ ALVENARIA FACHADA LATERAL CHOPP DA FÁ…	14/08/26	11/09/26	100%
▸ ALVENARIA FACHADA FUNDOS CHOPP DA FÁ…	04/09/26	02/10/26	80%
▸ PLANO DE AÇÃO ALVENARIA FACHADA ACÁCIA	01/10/26	13/11/26	0%
▸ ENCUNHAMENTO	09/10/26	23/08/27	0%
▸ ALVENARIA PLANO DE AÇÃO FACHADA CONC…	22/10/26	12/11/26	0%
▸ PLANO DE AÇÃO ALVENARIA FACHADA OLYM…	26/10/26	24/11/26	0%
▸ MONTANTES DO DRYWALL	15/12/26	13/01/28	0%
▸ DRYWALL 1º FACE	06/01/27	11/11/27	0%
▸ DRYWALL 2º FACE	28/01/27	13/12/27	0%
▸ DRYWALL	26/02/27	20/04/28	0%
▸ EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE MURO	01/08/28	13/12/28	0%
▾ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (3 inferidos)	26/05/26	27/11/28	4%
▸ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS(INFR…	26/05/26	30/10/26	92%
▸ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	03/09/26	18/09/28	5%
▸ PRUMADA ELÉTRICA (INFRA)	07/10/26	24/01/28	0%
▸ INSTALAÇÕES EMBUTIDAS NA ALVENARIA	20/10/26	14/09/27	0%
▸ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO	18/01/27	26/11/27	0%
▸ ACABAMENTOS ELÉTRICOS	03/03/27	27/11/28	0%
▸ FIAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	30/03/27	31/07/28	0%
▸ PRUMADA ELÉTRICA (CABOS)	30/03/27	01/08/28	0%
▸ INFRA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS	14/04/27	20/03/28	0%
▸ FIAÇÃO ELÉTRICA	20/05/27	26/05/28	0%

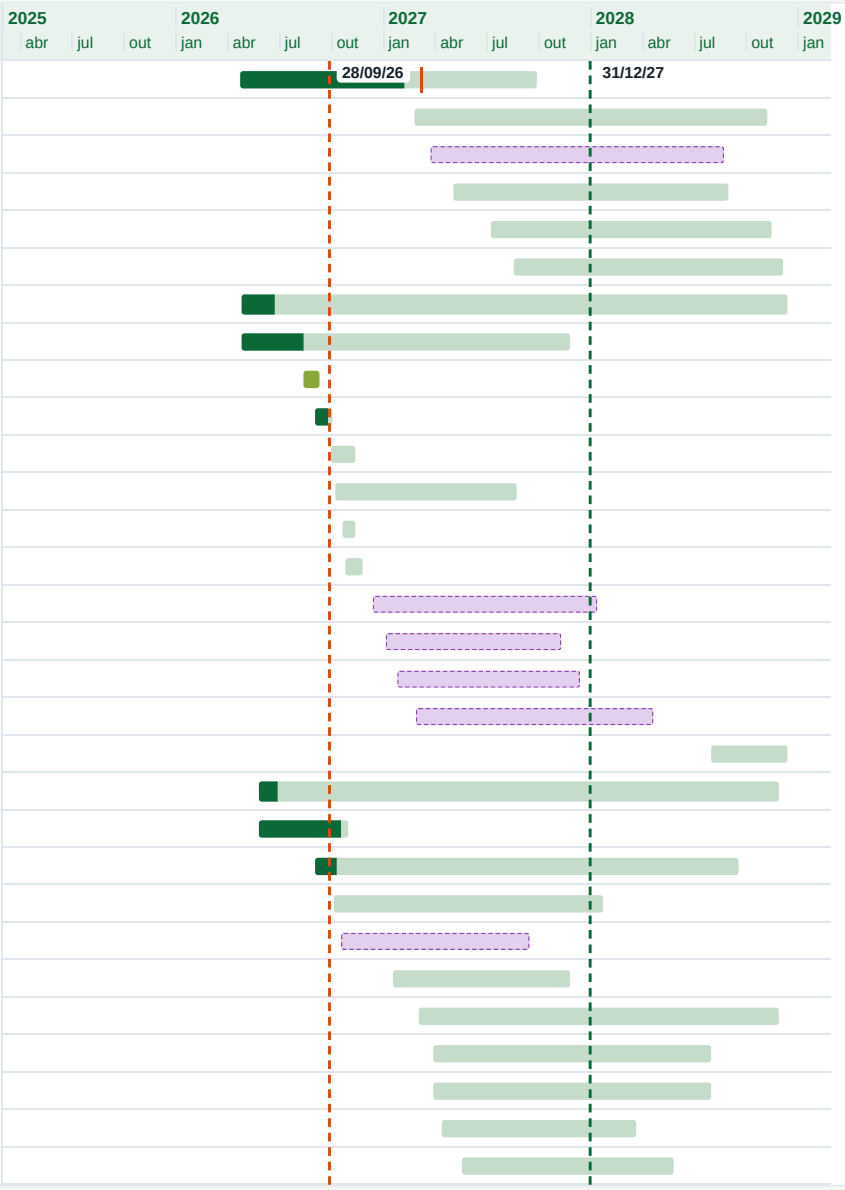


PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▸ GERADOR	31/08/27	14/09/27	0%
▸ OBRA CIVIL SUBESTAÇÃO/TRANSFORMA…	22/12/27	10/04/28	0%
▸ DISJUNTORES / MIOLOS	27/01/28	24/10/28	0%
▸ ENTRADA DE ENERGIA	04/02/28	10/04/28	0%
▸ SUBESTAÇÃO	11/04/28	23/05/28	0%
▾ INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (7 inferidos)	08/06/26	24/10/28	6%
▸ INFRA DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	08/06/26	20/03/28	9%
▸ INFRA HIDROSSANITÁRIA - CHOPP DA FÁBRICA	06/07/26	17/07/26	100%
▸ INFRA HIDRÁULICA PAREDES	10/08/26	30/10/26	87%
▸ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12/08/26	22/08/28	14%
▸ EXECUÇÃO DA ESCADA HIDRÁULICA LAT…	14/09/26	02/10/26	0%
▸ DRENAGEM PLUVIAL TALUDES	28/09/26	01/12/26	0%
▸ PRUMADA HIDROSSANITÁRIA	07/10/26	22/11/27	0%
▸ GÁS PISO	24/11/26	06/10/27	0%
▸ DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA	18/01/27	30/11/27	0%
▸ GÁS PAREDE	18/01/27	24/11/27	0%
▸ REDE HIDROSSANITÁRIA	18/01/27	24/11/27	0%
▸ GÁS	01/03/27	26/11/27	0%
▸ SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS	17/03/27	13/12/27	0%
▸ AQUECIMENTO SOLAR	04/08/28	24/10/28	0%
▸ RESERVATÓRIOS / BOILERS	07/08/28	04/09/28	0%
▾ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	06/07/26	16/03/28	2%
▸ REBOCO INTERNO	06/07/26	16/03/28	3%
▸ TALISCAMENTO	20/10/26	30/08/27	0%
▾ BARRACAO DE OBRA (1 inferido)	08/07/26	04/09/26	100%
▸ EXECUÇÃO DO CANTEIRO (ENGENHARIA)	08/07/26	31/08/26	100%
▸ MUDANÇA DO ALMOXARIFADO	22/07/26	05/08/26	100%
▸ EXECUÇÃO DO CANTEIRO (REFEITÓRIO)	06/08/26	04/09/26	100%
▾ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	16/07/26	10/04/28	2%
▸ CONTRAPISO	16/07/26	10/04/28	2%

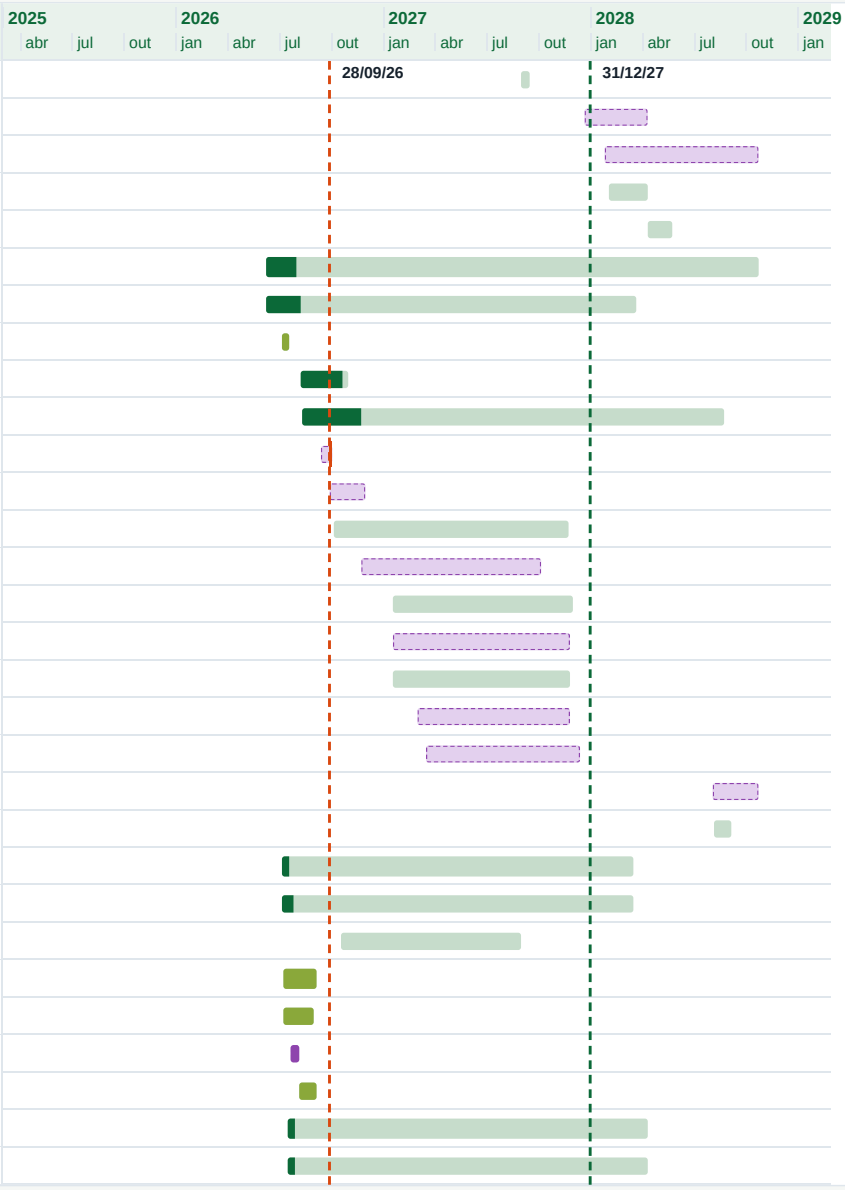


PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▼ IMPERMEABILIZAÇÃO	21/08/26	14/06/28	2%
► IMPERMEABILIZAÇÃO CORTINA 1 E 2 LOOKA…	21/08/26	11/09/26	87%
► IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO PL…	28/09/26	14/10/26	0%
► IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA	26/10/26	14/06/28	0%
► IMPERMEABILIZAÇÃO	09/02/27	08/05/28	0%
▼ REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	01/09/26	27/11/28	1%
► POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO LOOKAH…	01/09/26	19/10/26	39%
► REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO	20/01/27	11/07/28	0%
► REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE	27/01/27	30/06/28	0%
► BANCADAS	17/03/27	20/07/28	0%
► REVESTIMENTO ACABAMENTO	02/07/27	03/08/28	0%
► POLIMENTO DE PISO	06/07/27	03/02/28	0%
► PISO ELEVADO	02/09/27	15/09/28	0%
► DECK	05/10/27	04/01/28	0%
► PISO VINÍLICO / LAMINADO	20/12/27	22/09/28	0%
► RODAPÉ MADEIRA / PVC	18/01/28	13/10/28	0%
► PISO EMBORRACHADO	10/11/28	27/11/28	0%
▼ INSTALAÇÕES ESPECIAIS	02/09/26	24/10/28	3%
► INSTALAÇÕES ESPECIAIS	02/09/26	27/10/27	11%
► INFRA DE AR CONDICIONADO	18/01/27	20/03/28	0%
► INFRA DE SISTEMAS - CFTV	14/04/27	20/03/28	0%
► COMUNICAÇÃO E ALARME	18/06/27	24/10/28	0%
► PISCINA	26/01/28	29/03/28	0%
► EQUIPAMENTOS	13/07/28	19/07/28	0%
▼ SERRALHERIA 1 inferido	08/09/26	14/09/28	0%
► INSTALAÇÃO DE PCF (MARCO)	08/09/26	17/09/27	0%
► INSTALAÇÃO DE PCF (FOLHAS)	26/08/27	09/08/28	0%
► PONTOS DE ANCORAGEM INOX	14/09/27	04/10/27	0%
► GUARDA- CORPO	04/10/27	14/09/28	0%
► SERRALHERIA	31/07/28	21/08/28	0%

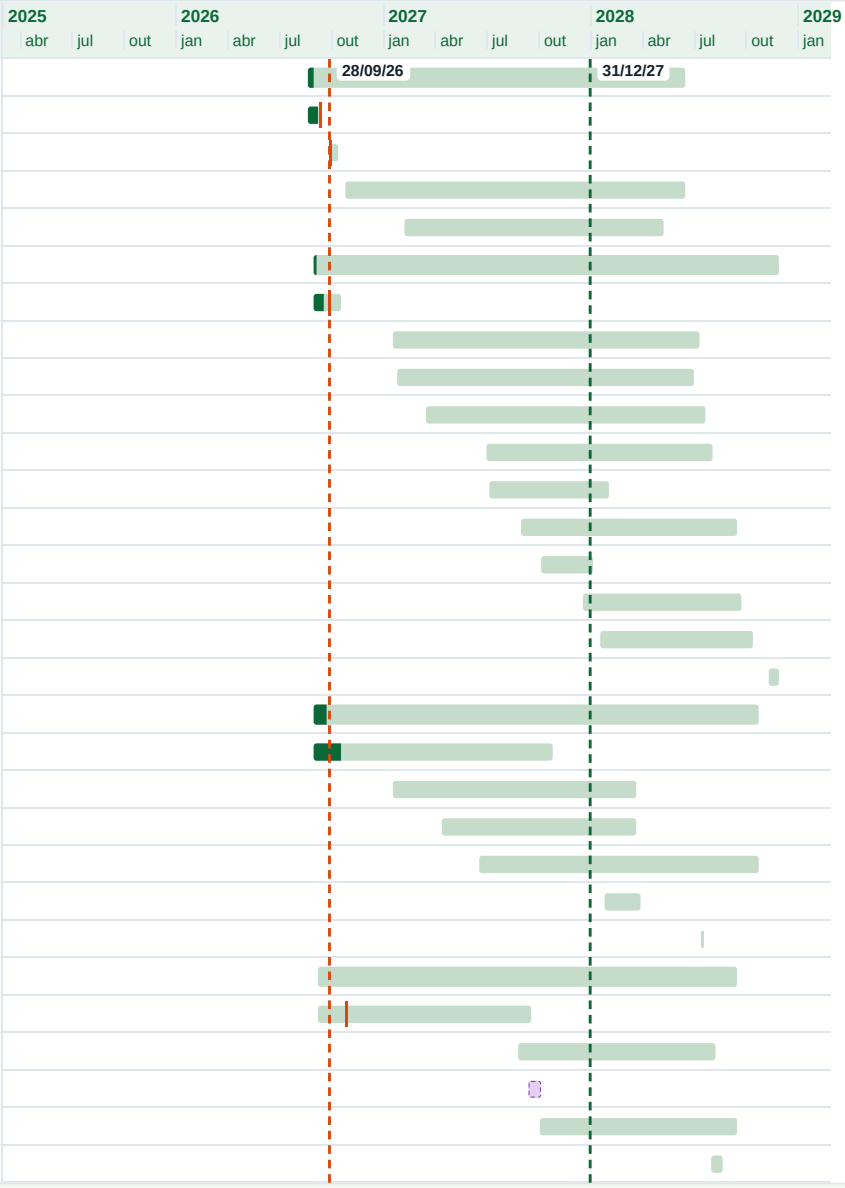

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▼ SEM PL (gestão / entrega) 11 inferidos	14/09/26	19/01/29	0%
► PLANO DE AÇÃO ENTREGA DO MEZANINO…	14/09/26	19/10/26	8%
► APARTAMENTO PROTÓTIPO 01 (52,54 m²) …	01/10/26	18/01/27	0%
► APARTAMENTO PROTÓTIPO 06 (54,39 m²)	01/10/26	15/01/27	0%
► APARTAMENTO PROTÓTIPO 05 (85,07 m²)	01/10/26	18/01/27	0%
► CHECKLIST	13/08/27	10/01/29	0%
► VISTORIA APTOS	07/04/28	19/01/29	0%
ENXOVAL	09/08/28	19/12/28	0%
MANUAL DE USO E OPERAÇÃO	11/08/28	09/10/28	0%
AVCB	14/08/28	10/10/28	0%
HABITE-SE	11/10/28	18/12/28	0%
ENTREGA SÍNDICO	05/12/28	18/01/29	0%
▼ REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	28/09/26	03/10/28	0%
► REBOCO EXTERNO (FACHADA LATERAL CHO…	28/09/26	29/10/26	0%
► REBOCO EXTERNO (FACHADA FUNDO CHOPP…	05/10/26	09/11/26	0%
► REBOCO PLANO DE AÇÃO FACHADA CONCO…	05/10/26	26/10/26	0%
► PLANO DE AÇÃO REBOCO FACHADA ACÁCIA	19/10/26	01/12/26	0%
► PLANO DE AÇÃO REBOCO FACHADA OLYMPUS	03/11/26	01/12/26	0%
► TEXTURA	17/02/27	13/06/28	0%
► REBOCO DE FACHADA - FASE 1	05/03/27	03/01/28	0%
► PINTURA ESPALA FECHADA - FASE 1	10/05/27	13/01/28	0%
► REBOCO DE FACHADA - FASE 2	21/06/27	20/07/28	0%
► PINTURA ESPALA FECHADA - FASE 2	29/07/27	26/04/28	0%
► GRANITO FACHADA	25/08/27	20/07/28	0%
► PINTURA/TEXTURA DA FACHADA	13/12/27	03/10/28	0%
► REBOCO EXTERNO	14/12/27	19/01/28	0%
▼ INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	01/10/26	20/03/28	0%
► PRUMADA DE INCÊNDIO	01/10/26	16/11/27	0%
► INSTALAÇÕES INCÊNDIO	22/10/26	20/03/28	0%
▼ ESQUADRIAS	29/10/26	06/10/28	0%

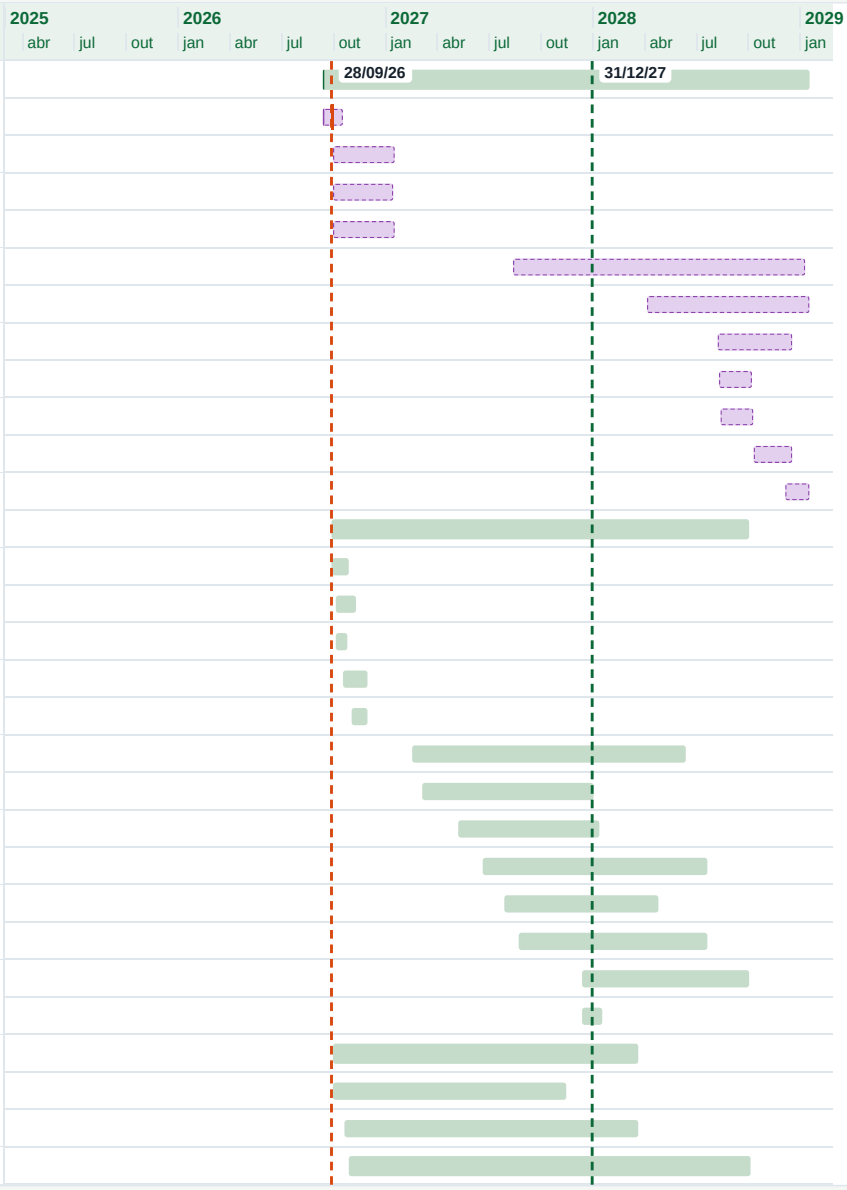

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▸ CONTRAMARCO	29/10/26	12/01/28	0%
▸ ESQUADRIA DE ALUMINIO	10/02/27	07/08/28	0%
▸ ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	28/09/27	06/10/28	0%
▸ ESQUADRIA MADEIRA	07/01/28	03/10/28	0%
▾ FORRO	03/02/27	10/08/28	0%
▸ FORRO	03/02/27	10/08/28	0%
▾ LOUÇAS SANITÁRIAS 1 inferido	03/03/27	27/11/28	0%
▸ LOUÇAS	03/03/27	24/10/28	0%
▸ METAIS ⓘ	09/02/28	27/11/28	0%
▾ LIMPEZA FINAL DE OBRA	12/03/27	18/12/28	0%
▸ LIMPEZA FINA	12/03/27	18/12/28	0%
▸ LIMPEZA GROSSA	18/06/27	03/11/28	0%
▾ PAVIMENTAÇÃO 2 inferidos	29/04/27	09/11/28	0%
▸ PASSEIOS	29/04/27	22/12/27	0%
▸ PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS ⓘ	18/10/27	22/05/28	0%
▸ QUADRA ⓘ	04/08/28	09/11/28	0%
▾ MARCENARIA	16/07/27	23/08/28	0%
▸ MARCENARIA	16/07/27	23/08/28	0%
▾ ELEVADORES	15/09/27	17/11/28	0%
▸ ELEVADORES SOCIAL - 01	15/09/27	15/10/27	0%
▸ ELEVADORES SOCIAL - 02	15/09/27	15/10/27	0%
▸ ELEVADOR COMERCIAL - 01	25/05/28	26/06/28	0%
▸ ELEVADOR COMERCIAL - 02	25/05/28	26/06/28	0%
▸ ELEVADOR DE SERVIÇO	17/10/28	17/11/28	0%
▸ ELEVADORES SOCIAL - 03	17/10/28	17/11/28	0%
▾ PAISAGISMO	14/12/27	23/10/28	0%
▸ PAISAGISMO	14/12/27	23/10/28	0%

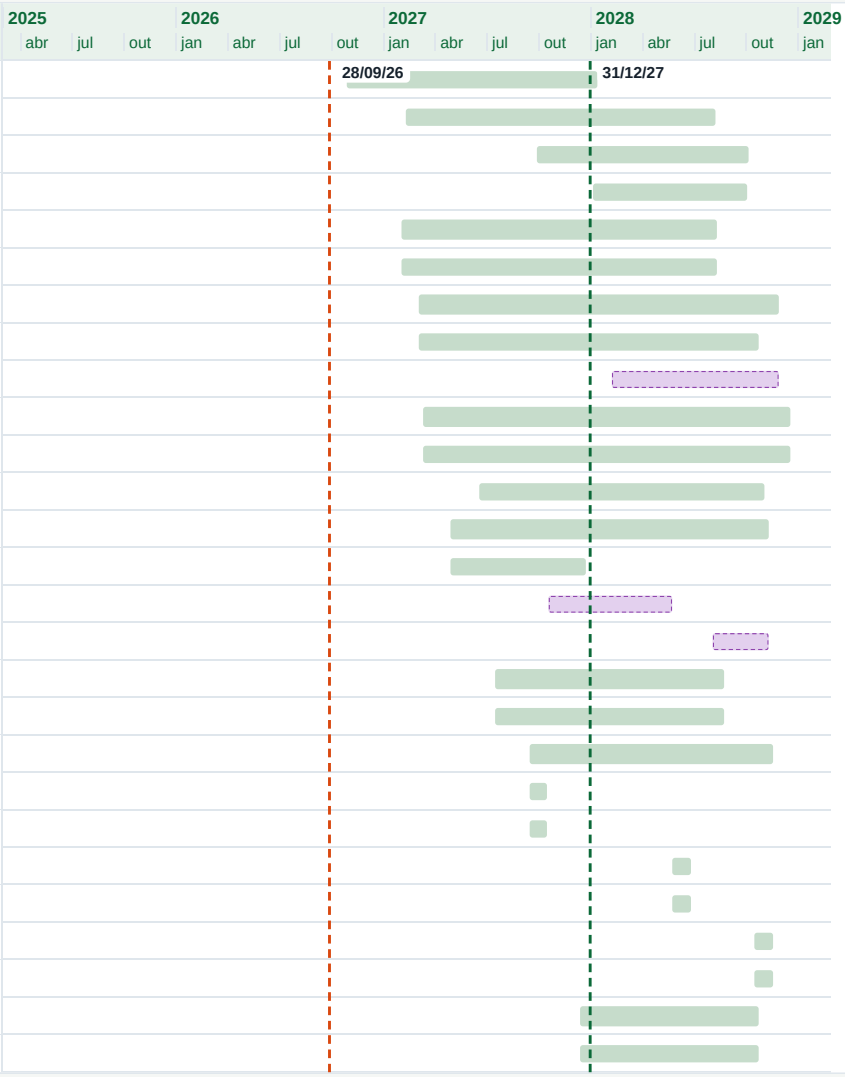

PACOTES NÃO DESCRITOS DE FORMA EXPRESSA NA CURVA DO PREVISION (48)

PL	Pacote	Nota
FUNDAÇÃO PROFUNDA	**PRIMEIRA PRAÇA DE TRABALHO - TUBULÕES**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: tubuloes). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO; 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 26 – SERRALHERIA.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**OBRA CIVIL CÂMARA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: civil, camara). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**RESERVATÓRIO - LOOKAHEAD**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: reservatorio). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**RAMPA PROJEÇÃO DA TORRE LOOKAHEAD**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: rampa, projecao, torre). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 31 – PAVIMENTAÇÃO.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO CONCORDIA LOOKAHEAD**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**PISO EM CONCRETO PROJEÇÃO TORRE LOOKAHEAD**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**VIGA DE FECHAMENTO LATERAL CHOPP DA FÁBRICA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: viga, fechamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**VIGA DE TRAVAMENTO VM1/VM2 LOOKAHEAD**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: viga, travamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS 2° ETAPA LOOKAHEAD**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**PISO EM CONCRETO E INSTALAÇÕES CHOPP DA FÁBRICA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**PISO DE CONCRETO PROJEÇÃO OLIMPUS 1° ETAPA LOOKAHEAD**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**LAJE CONTRAPISO - PISO ARMADO**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: laje, contrapiso, piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 35 – PINTURA.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**TRIPÃO 2° ETAPA ESTRUTURA LOOKAHEAD**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: tripao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**RAMPA DE VEÍCULOS - 5º AO 6º SS. (TERRENO) LOOKAHEAD**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: veiculos, terreno). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**RESERVATÓRIO OLYMPUS INTER 4 LOOKAHEAD**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: reservatorio). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA.

PL	Pacote	Nota
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**LAJE DE COBERTURA DO PILOTIS (CONCÓRDIA)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: laje). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 35 – PINTURA.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**LAJE COBERTURA PILOTIS (OLYMPUS)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (termo sem correspondência: laje). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 35 – PINTURA.
PINTURA	**MASSA CORRIDA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURA (termo sem correspondência: massa, corrida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 28 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS.
ALVENARIA	**MONTANTES DO DRYWALL**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: montantes, drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
ALVENARIA	**DRYWALL 1º FACE**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 35 – PINTURA.
ALVENARIA	**DRYWALL 2º FACE**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 35 – PINTURA.
ALVENARIA	**DRYWALL**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 18 – ALVENARIA (termo sem correspondência: drywall). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO; 35 – PINTURA.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**INSTALAÇÕES EMBUTIDAS NA ALVENARIA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: embutidas, alvenaria). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 27 – MARCENARIA; 34 – LOUÇAS SANITÁRIAS.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**OBRA CIVIL SUBESTAÇÃO/TRANSFORMADORES**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: civil, transformadores). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**DISJUNTORES / MIOLOS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: disjuntores, miolos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**EXECUÇÃO DA ESCADA HIDRÁULICA LATERAL CHOPP DA FÁBRICA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: escada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 25 – ESQUADRIAS; 26 – SERRALHERIA.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**DRENAGEM PLUVIAL TALUDES**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: drenagem, taludes). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**GÁS PISO**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: gas, piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**GÁS PAREDE**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: gas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**GÁS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: gas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 13 – CONTENÇÃO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: shaft). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**AQUECIMENTO SOLAR**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: aquecimento, solar). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 25 – ESQUADRIAS.

PL	Pacote	Nota
BARRACAO DE OBRA	**MUDANÇA DO ALMOXARIFADO**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 04 – BARRACAO DE OBRA (termo sem correspondência: mudanca). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
SERRALHERIA	**PONTOS DE ANCORAGEM INOX**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 26 – SERRALHERIA (termo sem correspondência: pontos, ancoragem, inox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.
SEM PL (gestão / entrega)	**PLANO DE AÇÃO ENTREGA DO MEZANINO PARA ESTACIONAMENTO**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**APARTAMENTO PROTÓTIPO 01 (52,54 m²) LOOKAREAD**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**APARTAMENTO PROTÓTIPO 06 (54,39 m²)**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**APARTAMENTO PROTÓTIPO 05 (85,07 m²)**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**CHECKLIST**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**VISTORIA APTOS**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**ENXOVAL**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**MANUAL DE USO E OPERAÇÃO**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**AVCB**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**HABITE-SE**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**ENTREGA SÍNDICO**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
LOUÇAS SANITÁRIAS	**METAIS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 34 – LOUÇAS SANITÁRIAS (termo sem correspondência: metais). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
PAVIMENTAÇÃO	**PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTAÇÃO (termo sem correspondência: pintura, demarcacao, vagas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
PAVIMENTAÇÃO	**QUADRA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTAÇÃO (termo sem correspondência: quadra). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

Fonte: aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (export do Prevision). Datas de início e término e % realizado vêm do Prevision; nos níveis PL e pacote o % é a média dos itens ponderada pela duração. O cronograma é o mesmo nos três cenários (os cenários mudam as curvas financeiras, não as datas das atividades).
