BOTÂNICO · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Agosto/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: padrão (curvas digitadas) · R$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL
R$ 160,4 mi
orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE
R$ 21,3 mi
13,3% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027
R$ 47,6 mi
realizado + previsto

SALDO A REALIZAR
R$ 139,1 mi
após a data de corte

CONFERÊNCIA
✓ Tudo OK
detalhes abaixo


REALIZADO (ATUAL)
Setembro/2026

COMPOSIÇÃO DO ANO


Ano	Anual R$	Acumulado R$	Anual %	Acumulado %	Realizado R$	A realizar R$
2024	R$ 1.055.724,07	R$ 1.055.724,07	0,66%	0,66%	R$ 1.055.724,07	-
2025	R$ 7.679.641,61	R$ 8.735.365,68	4,79%	5,45%	R$ 7.679.641,61	-
2026	R$ 25.567.560,42	R$ 34.302.926,10	15,94%	21,38%	R$ 12.548.975,13	R$ 13.018.585,28
2027	**R$ 47.604.449,83**	**R$ 81.907.375,93**	**29,67%**	**51,06%**	**-**	**R$ 47.604.449,83**
2028	R$ 66.701.794,01	R$ 148.609.169,93	41,58%	92,64%	-	R$ 66.701.794,01
2029	R$ 11.811.809,47	R$ 160.420.979,40	7,36%	100,00%	-	R$ 11.811.809,47
2030	-	R$ 160.420.979,40	0,00%	100,00%	-	-
TOTAL	**R$ 160.420.979,40**		**100,00%**		**R$ 21.284.340,81**	**R$ 139.136.638,59**

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

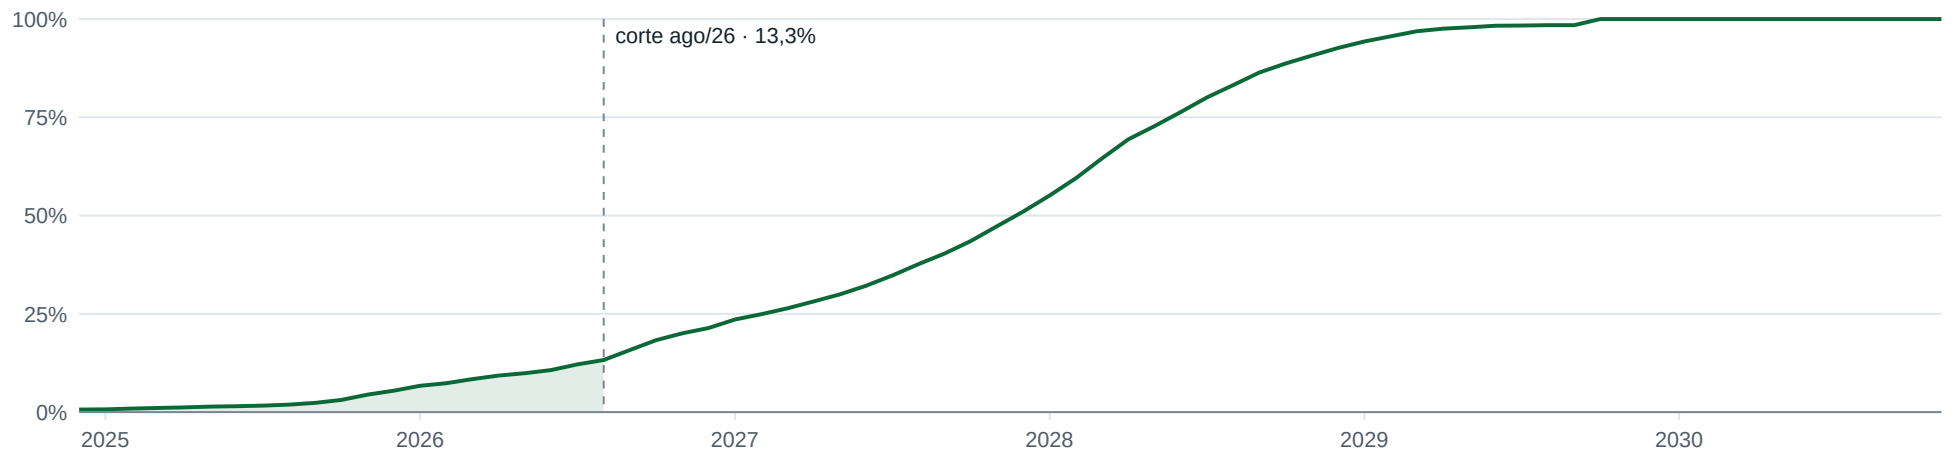

DESEMBOLSO ANUAL (R$ MILHÕES)

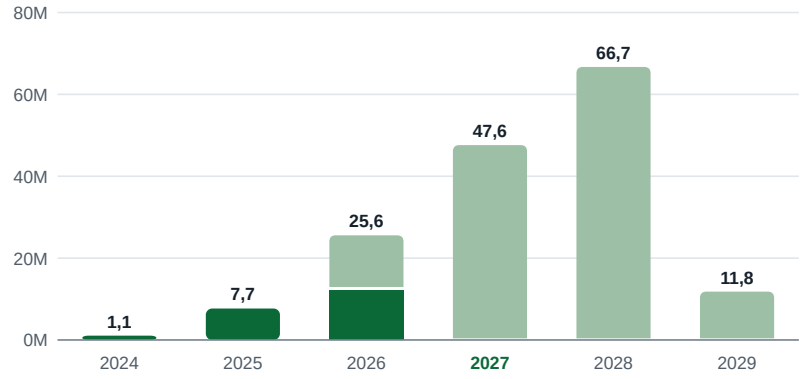

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

Grupo	R$	% do ano	Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)	R$ 9.868.861,03	20,7%	57,8%
Infraestrutura (12 a 16)	R$ 1.296.311,29	2,7%	98,2%
Estrutura (17)	R$ 16.405.808,44	34,5%	97,4%
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)	R$ 11.338.654,26	23,8%	32,0%
Acabamentos (25 a 37)	R$ 8.694.814,82	18,3%	18,9%
Taxa de administração	R$ 0,00	0,0%	
TOTAL	**R$ 47.604.449,83**	**100,0%**	

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.
