
Ed. Jardim · Curva física por cenário

Avanço físico acumulado dos itens diretos (26 PLs), ponderado pela projeção de cada PL · Corte: set/26 · Realizado no corte: 24,70%

Curva S

Visão geral › passe o mouse no gráfico para ver o detalhamento do mês

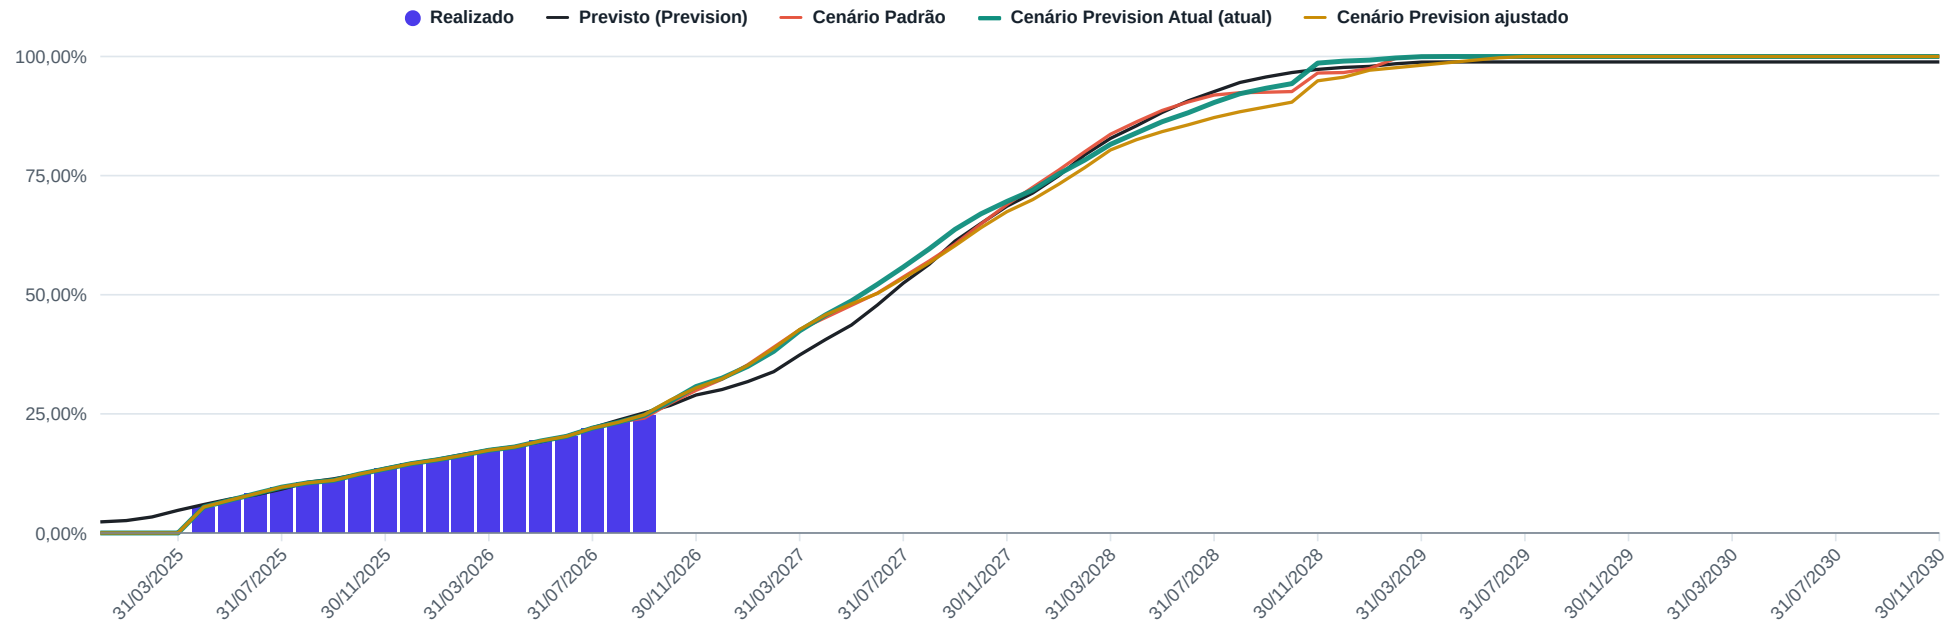

AVANÇO FÍSICO ACUMULADO NO FIM DE CADA ANO

Data	Realizado	Previsto (Prevision)	Padrão	Prevision Atual	Prevision ajustado
31/12/2024	0,0%	2,3%	0,0%	0,0%	0,0%
31/12/2025	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%
31/12/2026	—	30,1%	32,3%	32,5%	32,4%
31/12/2027	**—**	**71,3%**	**72,5%**	**72,0%**	**70,0%**
31/12/2028	—	97,7%	96,6%	99,0%	95,7%
31/12/2029	—	98,9%	100,0%	100,0%	100,0%
Conclusão (100%)		—	mar/29	mar/29	jul/29

POR PL EM 31/12/2027

PL	No corte	Prevision	Padrão	Prevision Atual	Prevision ajustado
SERVIÇOS INICIAIS	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
CONTENÇÃO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TERRAPLENAGEM	89,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
FUNDAÇÃO PROFUNDA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	91,9%	100,0%	99,8%	100,0%	99,7%
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	69,8%	100,0%	98,7%	98,8%	98,8%
ALVENARIA	35,8%	95,7%	98,0%	96,1%	95,6%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,0%	93,9%	97,4%	83,4%	93,1%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,2%	57,4%	56,7%	50,8%	58,6%
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,0%	100,0%	79,5%	100,0%	52,3%
INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	0,0%	76,8%	89,8%	75,9%	76,1%
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,0%	85,8%	63,6%	81,7%	63,9%
ELEVADORES	0,0%	97,1%	88,8%	88,9%	88,9%
ESQUADRIAS	0,0%	57,6%	61,2%	61,6%	61,6%
SERRALHERIA	0,0%	5,0%	26,2%	0,1%	5,0%
MARCENARIA	0,0%	36,5%	0,0%	7,0%	35,8%
REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	0,5%	88,5%	98,0%	78,5%	87,1%
REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	15,3%	87,9%	91,4%	98,2%	97,6%
REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	0,0%	73,7%	52,3%	38,0%	38,6%
ESTRUTURA METÁLICA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA	0,0%	97,3%	60,6%	97,3%	70,6%
FORRO	0,0%	41,8%	39,1%	7,8%	41,1%
LOUÇAS SANITÁRIAS	0,0%	11,6%	29,6%	10,1%	29,7%
PINTURA	5,9%	53,3%	59,7%	37,1%	52,9%
JARDINEIRAS E PAISAGISMO	11,8%	67,8%	68,6%	54,2%	63,3%
LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,0%	9,3%	17,2%	5,2%	9,1%

Como a curva é montada. **Realizado** e **Previsto (Prevision)**: % acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision (aba CP RESUMO) de cada PL. **Cenários**: até o corte, o realizado; depois, o físico de cada PL avança na mesma proporção do desembolso que falta no cenário (curva financeira da aba da PL). PL sem desembolso futuro segue o previsto do Prevision. A obra é a média das PLs diretas ponderada pela projeção (R$ 121,2 mi). O Prevision pondera pelo custo do próprio cronograma, por isso o % dele pode ser um pouco diferente.
