ED JARDIM · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Setembro/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: Prevision ajustado · R$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL
R$ 154,7 mi
orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE
R$ 45,9 mi
29,7% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027
R$ 53,5 mi
realizado + previsto


SALDO A REALIZAR
R$ 108,8 mi
após a data de corte

CONFERÊNCIA
✓ Tudo OK
detalhes abaixo


	REALIZADO (ATUAL) Outubro/2026				COMPOSIÇÃO DO ANO	
Ano	**Anual R$**	**Acumulado R$**	**Anual %**	**Acumulado %**	**Realizado R$**	**A realizar R$**
2024	R$ 5.778.713,93	R$ 5.778.713,93	3,74%	3,74%	R$ 5.778.713,93	-
2025	R$ 18.489.705,84	R$ 24.268.419,77	11,95%	15,69%	R$ 18.489.705,84	-
2026	R$ 33.783.612,43	R$ 58.052.032,20	21,84%	37,52%	R$ 21.604.582,49	R$ 12.179.029,94
2027	**R$ 53.460.558,96**	**R$ 111.512.591,16**	**34,56%**	**72,08%**	**-**	**R$ 53.460.558,96**
2028	R$ 34.296.945,13	R$ 145.809.536,28	22,17%	94,25%	-	R$ 34.296.945,13
2029	R$ 6.170.693,36	R$ 151.980.229,64	3,99%	98,24%	-	R$ 6.170.693,36
2030	R$ 2.725.430,97	R$ 154.705.660,62	1,76%	100,00%	-	R$ 2.725.430,97
TOTAL	**R$ 154.705.660,62**		**100,00%**		**R$ 45.873.002,26**	**R$ 108.832.658,36**

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

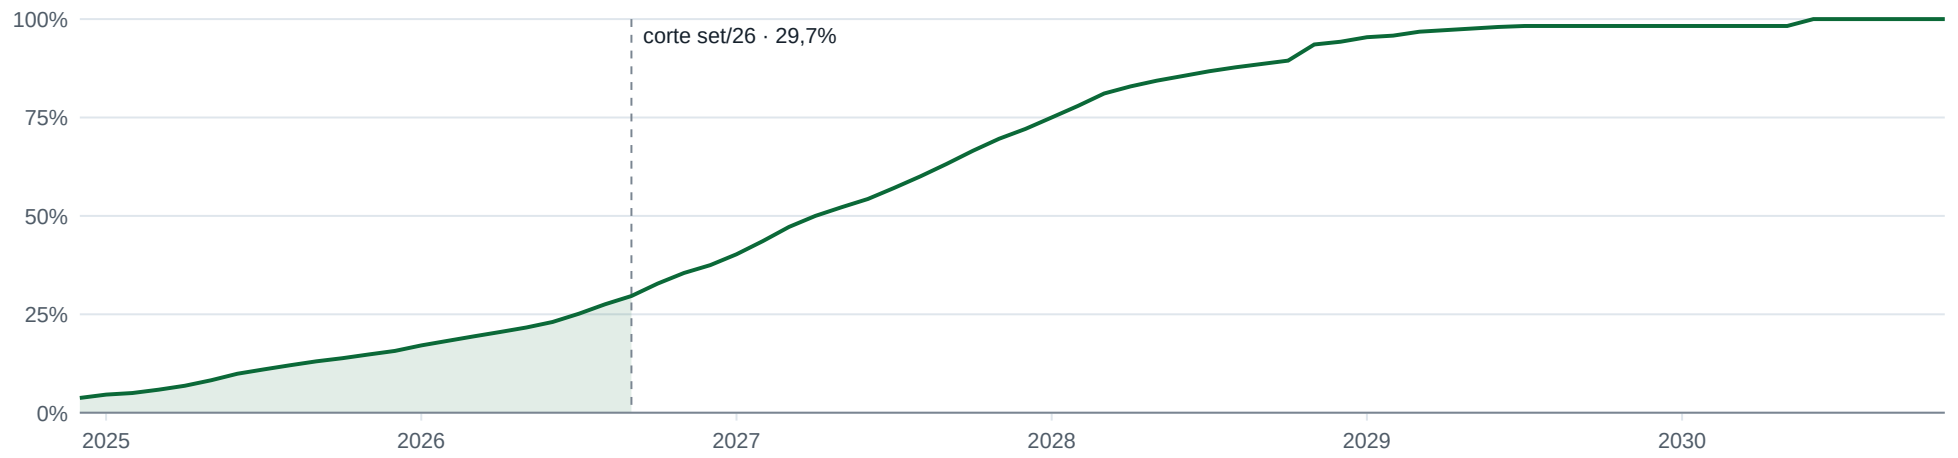

DESEMBOLSO ANUAL (R$ MILHÕES)

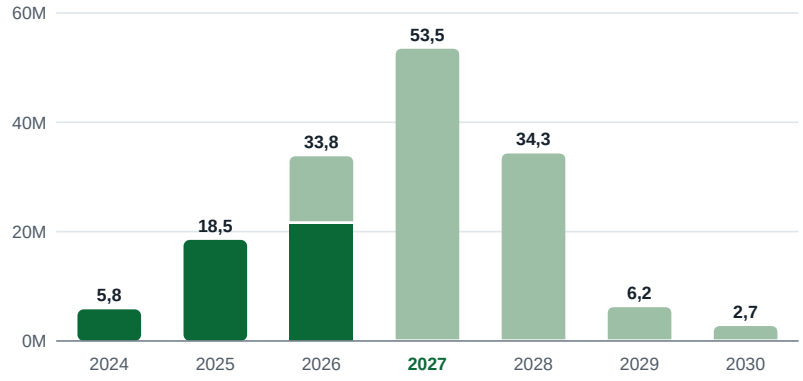

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

Grupo	R$	% do ano	Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)	R$ 7.619.172,61	14,3%	84,3%
Infraestrutura (12 a 16)	R$ 324.285,64	0,6%	99,8%
Estrutura (17)	R$ 3.982.531,14	7,4%	98,6%
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)	R$ 15.094.203,12	28,2%	70,4%
Acabamentos (25 a 37)	R$ 26.440.366,45	49,5%	53,5%
Taxa de administração	R$ 0,00	0,0%	
TOTAL	**R$ 53.460.558,96**	**100,0%**	

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.
