
Ed. Jardim

Impermeabilização · 3º pavimento (lazer) · cronograma de execução: cada cor da planta é um período; a legenda traz a semana de cada ambiente

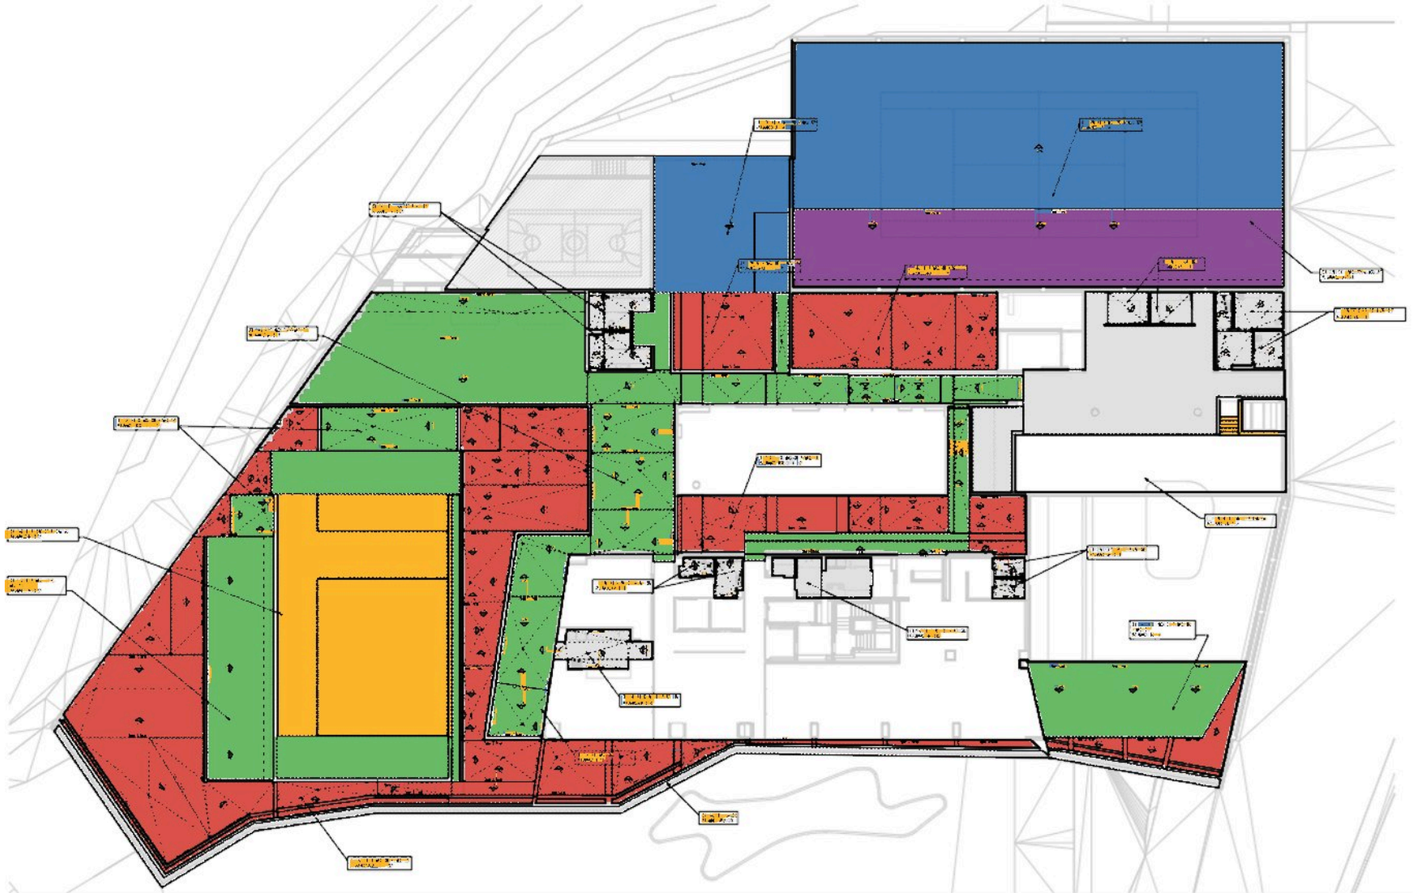

Argamassa flexível (áreas molhadas) e tratamentos com resina/cristalizante: fora deste cronograma

DATAS DE EXECUÇÃO

1ª sem. set/26 → 1ª sem. nov/26

Sistema B · dupla manta asfáltica (3 + 4 mm) · 810 m²

Bar da piscina	1ª sem. set/26 a 2ª sem. set/26
Deck da piscina descoberta	3ª sem. set/26
Terraço do salão de festas	4ª sem. set/26
Circulação externa e varanda do espaço kids e gourmet	4ª sem. set/26 a 3ª sem. out/26
Circulação externa coberta/descoberta	3ª sem. out/26
Circulação interna (trecho 1)	4ª sem. out/26
Circulação interna (trecho 2)	4ª sem. out/26
Estar da piscina	1ª sem. nov/26

2ª sem. nov/26 → 1ª sem. dez/26

Sistema C · piscinas (opção 01, dupla manta + antieflorescência) · 482 m²

Piscina, piscina infantil e prainha (com paredes)	2ª sem. nov/26 a 4ª sem. nov/26
Piscina raia, SPA e escada (com paredes)	4ª sem. nov/26 a 1ª sem. dez/26

2ª sem. dez/26 → 4ª sem. fev/27

Sistema D · dupla manta antiraiz + drenante (jardins) · 1.074 m²

Jardins sobre laje 01 a 06 (playground e ducha), beirais 01 e 02	2ª sem. dez/26 a 4ª sem. fev/27

1ª sem. fev/27 → 2ª sem. fev/27

Sistema B · dupla manta asfáltica (3 + 4 mm) · 229 m²

Quadra de tênis (faixa em dupla manta)	1ª sem. fev/27 a 2ª sem. fev/27

1ª sem. mar/27 → 2ª sem. jun/27


Sistema A · manta asfáltica simples (4 mm) · 586 m²

Quadra de tênis	2ª sem. abr/27 a 3ª sem. mai/27
Piso de apoio das quadras	2ª sem. abr/27 a 3ª sem. mai/27
Circulação externa e varanda do espaço kids e gourmet	2ª sem. abr/27 a 3ª sem. mai/27

Regularização: 1ª sem. mar/27 a 1ª sem. abr/27 · Aplicação da manta: 2ª sem. abr/27 a 3ª sem. mai/27 · Proteção mecânica: 4ª sem. mai/27 a 2ª sem. jun/27

Replanejado: começa no 1º dia útil de março/27 (01/03/2027)

LINHA DO TEMPO (SEMANAS)



Datas = semanas de aplicação da manta em cada ambiente (no sistema A, também regularização e proteção mecânica), pelo cronograma de impermeabilização (Crono_Imper_Ed_Jardim). Cores da planta pelos sistemas do projeto de impermeabilização; no sistema B a planta mostra o período do conjunto (set–nov/26) e a legenda traz a semana de cada ambiente. Sistema A replanejado em 19/10/2026: começa no 1º dia útil de março/27 (01/03/2027), com as mesmas durações do cronograma. Não considera ralos, rodapés e detalhes.
