
# Ed. Jardim · Curva física por cenário

Avanço físico acumulado dos itens diretos (26 PLs), ponderado pela projeção de cada PL · Corte: set/26 · Realizado no corte: 24,70%

## Curva S

Visão geral › passe o mouse no gráfico para ver o detalhamento do mês

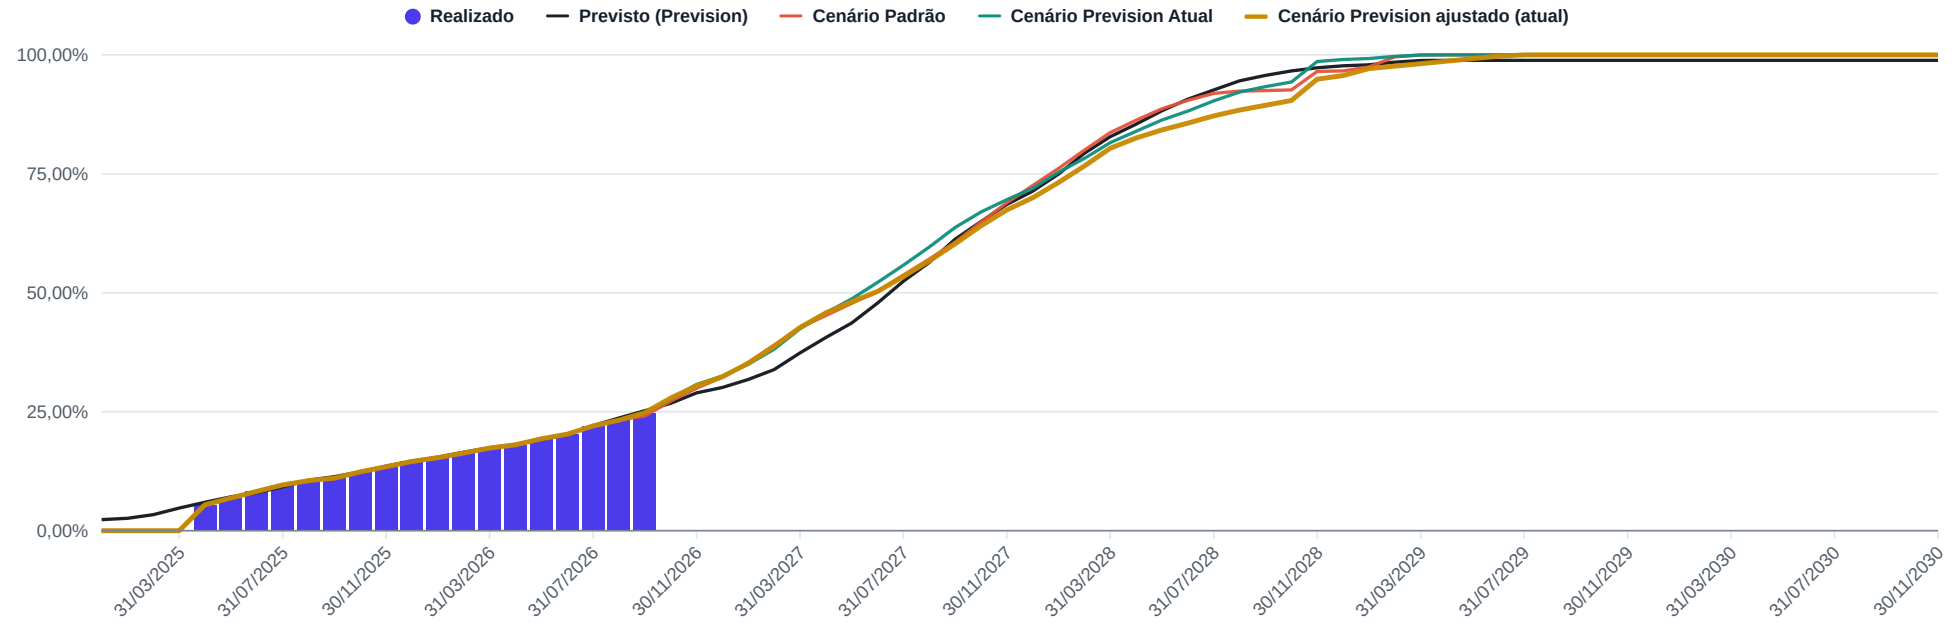


### AVANÇO FÍSICO ACUMULADO NO FIM DE CADA ANO

| Data | Realizado | Previsto (Prevision) | Padrão | Prevision Atual | Prevision ajustado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 0,0% | 2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 31/12/2025 | 14,6% | 14,6% | 14,6% | 14,6% | 14,6% |
| 31/12/2026 | — | 30,1% | 32,3% | 32,5% | 32,4% |
| **31/12/2027** | **—** | **71,3%** | **72,5%** | **72,0%** | **70,0%** |
| 31/12/2028 | — | 97,7% | 96,6% | 99,0% | 95,7% |
| 31/12/2029 | — | 98,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Conclusão (100%) | | — | mar/29 | mar/29 | jul/29 |

## POR PL EM 31/12/2027

| PL | No corte | Prevision | Padrão | Prevision Atual | Prevision ajustado |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS INICIAIS | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| CONTENÇÃO | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| TERRAPLENAGEM | 89,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | 91,9% | 100,0% | 99,8% | 100,0% | 99,7% |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 69,8% | 100,0% | 98,7% | 98,8% | 98,8% |
| ALVENARIA | 35,8% | 95,7% | 98,0% | 96,1% | 95,6% |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | 0,0% | 93,9% | 97,4% | 83,4% | 93,1% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9,2% | 57,4% | 56,7% | 50,8% | 58,6% |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 0,0% | 100,0% | 79,5% | 100,0% | 52,3% |
| INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO | 0,0% | 76,8% | 89,8% | 75,9% | 76,1% |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0,0% | 85,8% | 63,6% | 81,7% | 63,9% |
| ELEVADORES | 0,0% | 97,1% | 88,8% | 88,9% | 88,9% |
| ESQUADRIAS | 0,0% | 57,6% | 61,2% | 61,6% | 61,6% |
| SERRALHERIA | 0,0% | 5,0% | 26,2% | 0,1% | 5,0% |
| MARCENARIA | 0,0% | 36,5% | 0,0% | 7,0% | 35,8% |
| REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS | 0,5% | 88,5% | 98,0% | 78,5% | 87,1% |
| REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES | 15,3% | 87,9% | 91,4% | 98,2% | 97,6% |
| REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO | 0,0% | 73,7% | 52,3% | 38,0% | 38,6% |
| ESTRUTURA METÁLICA | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA | 0,0% | 97,3% | 60,6% | 97,3% | 70,6% |
| FORRO | 0,0% | 41,8% | 39,1% | 7,8% | 41,1% |
| LOUÇAS SANITÁRIAS | 0,0% | 11,6% | 29,6% | 10,1% | 29,7% |
| PINTURA | 5,9% | 53,3% | 59,7% | 37,1% | 52,9% |
| JARDINEIRAS E PAISAGISMO | 11,8% | 67,8% | 68,6% | 54,2% | 63,3% |
| LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0,0% | 9,3% | 17,2% | 5,2% | 9,1% |

Como a curva é montada. **Realizado** e **Previsto (Prevision)**: % acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision (aba CP RESUMO) de cada PL. **Cenários**: até o corte, o realizado; depois, o físico de cada PL avança na mesma proporção do desembolso que falta no cenário (curva financeira da aba da PL). PL sem desembolso futuro segue o previsto do Prevision. A obra é a média das PLs diretas ponderada pela projeção (R$ 121,2 mi). O Prevision pondera pelo custo do próprio cronograma, por isso o % dele pode ser um pouco diferente.
