
# Ed. Jardim

Impermeabilização · 3º pavimento (lazer) · cronograma de execução: cada cor da planta é um período; a legenda traz a semana de cada ambiente

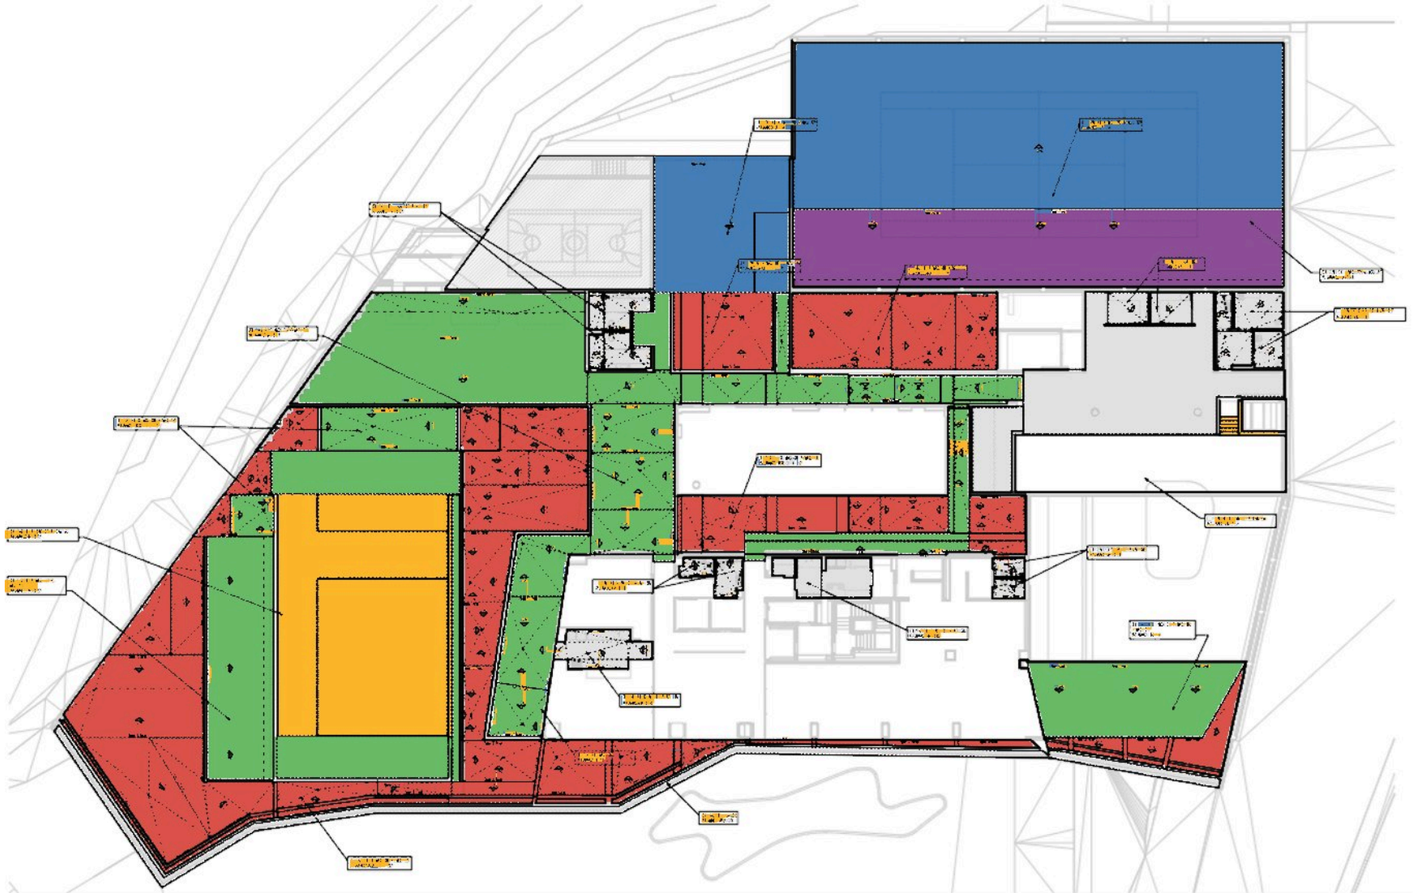

Argamassa flexível (áreas molhadas) e tratamentos com resina/cristalizante: fora deste cronograma

## DATAS DE EXECUÇÃO

### 1ª sem. set/26 → 1ª sem. nov/26

Sistema B · dupla manta asfáltica (3 + 4 mm) · 810 m²

| | |
|---|---|
| Bar da piscina | 1ª sem. set/26 a 2ª sem. set/26 |
| Deck da piscina descoberta | 3ª sem. set/26 |
| Terraço do salão de festas | 4ª sem. set/26 |
| Circulação externa e varanda do espaço kids e gourmet | 4ª sem. set/26 a 3ª sem. out/26 |
| Circulação externa coberta/descoberta | 3ª sem. out/26 |
| Circulação interna (trecho 1) | 4ª sem. out/26 |
| Circulação interna (trecho 2) | 4ª sem. out/26 |
| Estar da piscina | 1ª sem. nov/26 |

### 2ª sem. nov/26 → 1ª sem. dez/26

Sistema C · piscinas (opção 01, dupla manta + antieflorescência) · 482 m²

| | |
|---|---|
| Piscina, piscina infantil e prainha (com paredes) | 2ª sem. nov/26 a 4ª sem. nov/26 |
| Piscina raia, SPA e escada (com paredes) | 4ª sem. nov/26 a 1ª sem. dez/26 |

### 2ª sem. dez/26 → 4ª sem. fev/27

Sistema D · dupla manta antiraiz + drenante (jardins) · 1.074 m²

| | |
|---|---|
| Jardins sobre laje 01 a 06 (playground e ducha), beirais 01 e 02 | 2ª sem. dez/26 a 4ª sem. fev/27 |

### 1ª sem. fev/27 → 2ª sem. fev/27

Sistema B · dupla manta asfáltica (3 + 4 mm) · 229 m²

| | |
|---|---|
| Quadra de tênis (faixa em dupla manta) | 1ª sem. fev/27 a 2ª sem. fev/27 |

### 1ª sem. mar/27 → 2ª sem. jun/27


Sistema A · manta asfáltica simples (4 mm) · 586 m²

| | |
|---|---|
| Quadra de tênis | 2ª sem. abr/27 a 3ª sem. mai/27 |
| Piso de apoio das quadras | 2ª sem. abr/27 a 3ª sem. mai/27 |
| Circulação externa e varanda do espaço kids e gourmet | 2ª sem. abr/27 a 3ª sem. mai/27 |

Regularização: 1ª sem. mar/27 a 1ª sem. abr/27 · Aplicação da manta: 2ª sem. abr/27 a 3ª sem. mai/27 · Proteção mecânica: 4ª sem. mai/27 a 2ª sem. jun/27

**Replanejado: começa no 1º dia útil de março/27 (01/03/2027)**

## LINHA DO TEMPO (SEMANAS)




Datas = semanas de aplicação da manta em cada ambiente (no sistema A, também regularização e proteção mecânica), pelo cronograma de impermeabilização (Crono_Imper_Ed_Jardim). Cores da planta pelos sistemas do projeto de impermeabilização; no sistema B a planta mostra o período do conjunto (set–nov/26) e a legenda traz a semana de cada ambiente. Sistema A replanejado em 19/10/2026: começa no 1º dia útil de março/27 (01/03/2027), com as mesmas durações do cronograma. Não considera ralos, rodapés e detalhes.
