
Botânico · Gantt do cronograma


2.387 atividades do Prevision (situação em 24/09/26) · PL → pacote de trabalho → pavimento/tarefa · clique na seta para abrir

Planejado (início → término) · Realizado (% do Prevision) · Concluído · **Não descrito de forma expressa na curva do Prevision** (notas na última página) · Previsto para a data (atraso > 5 p.p.) · Situação 24/09/26 · 31/12/2027


PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▼ SERVIÇOS INICIAIS	23/06/25	25/07/25	100%
► LOCAÇÃO DE OBRA	23/06/25	04/07/25	100%
► DEMOLIÇÃO	07/07/25	25/07/25	100%
▼ CONTENÇÃO	21/07/25	23/12/26	50%
► CONTENÇÕES EM ESTACAS	21/07/25	14/08/25	97%
► CONTENÇÃO - BLOCO DO ELEVADOR	27/04/26	26/06/26	100%
► FECHAMENTO DE CORTINA - CONTENÇÕES	19/10/26	30/11/26	0%
► TRATAMENTO DE CONTENÇÕES	13/11/26	23/12/26	0%
▼ FUNDAÇÃO PROFUNDA (7 inferidos)	01/09/25	03/03/26	100%
► VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - CENTR… ⓘ	01/09/25	18/09/25	100%
► VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA M… ⓘ	08/09/25	03/10/25	100%
► VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA M… ⓘ	15/09/25	06/10/25	100%
► FUNDAÇÃO PROFUNDA	18/09/25	02/03/26	100%
► VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IP… ⓘ	22/09/25	13/10/25	100%
► VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IP… ⓘ	06/10/25	17/10/25	100%
► VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA B… ⓘ	13/10/25	27/10/25	100%
► FUNDAÇÃO PROFUNDA - MEDIÇÃO	13/10/25	03/03/26	100%
► VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IP… ⓘ	21/10/25	03/11/25	100%
▼ TERRAPLENAGEM	03/03/26	16/10/26	59%
► TERRAPLENAGEM (FASE 1)	03/03/26	27/04/26	100%
► TERRAPLENAGEM (FASE 2)	08/09/26	16/10/26	0%

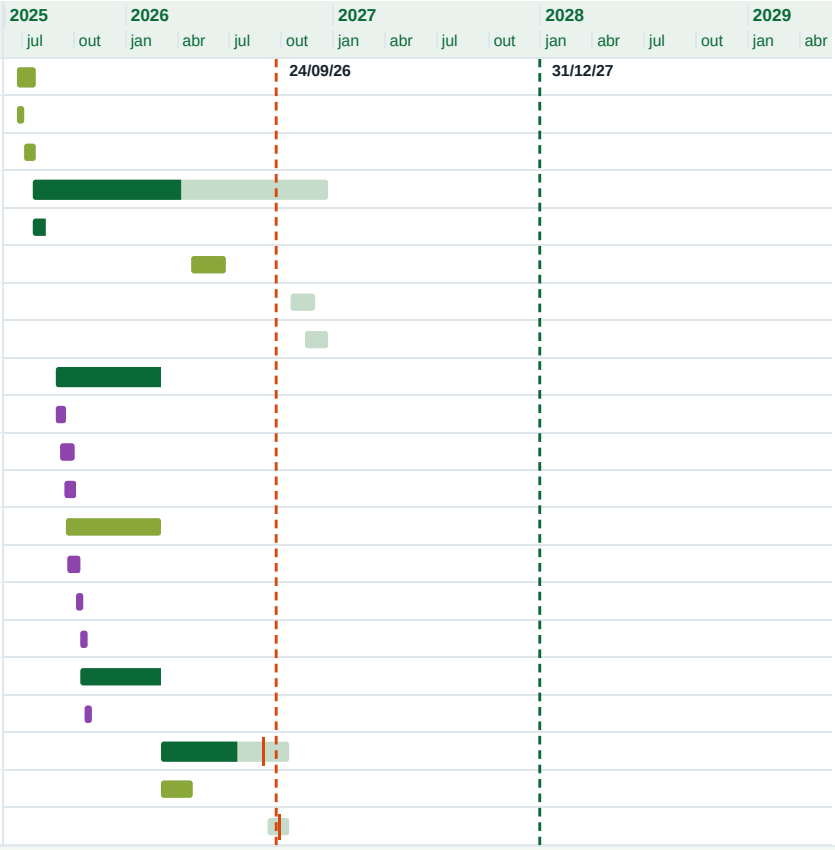

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▼ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	13/04/26	09/04/27	83%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	13/04/26	07/08/26	99%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 1	13/04/26	27/04/26	100%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 2	22/04/26	15/05/26	100%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 3	08/05/26	10/07/26	100%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - NUCLEO	25/05/26	03/07/26	100%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 4	01/06/26	10/07/26	100%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 5	16/06/26	17/07/26	100%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - FASE 6	03/07/26	17/07/26	100%
► CINTAS FASE 1	21/09/26	01/10/26	0%
► CINTAS FASE 2	02/10/26	16/10/26	0%
► CINTAS FASE 3	19/10/26	30/10/26	0%
► CINTAS FASE 4	19/10/26	30/10/26	0%
► FUNDAÇÃO - PROJEÇÃO IGREJA	15/03/27	25/03/27	0%
► BLOCOS E CINTAS - IGREJA	29/03/27	09/04/27	0%
▼ ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	15/06/26	11/02/28	25%
► ESTRUTURA	15/06/26	11/02/28	16%
► Estrutura Térreo - Fase 2	13/07/26	17/08/26	100%
► Estrutura Térreo - Fase 3	21/07/26	07/08/26	100%
► Estrutura Térreo - Fase 4	04/08/26	26/08/26	100%
► Estrutura Mezanino	04/08/26	28/08/26	100%
► Estrutura 2º Pav - Fase 1	17/08/26	28/09/26	60%
► ESTRUTURA IGREJA	18/01/27	03/05/27	0%
► ESTRUTURA - PISO ARMADO	08/02/27	11/03/27	0%
▼ PINTURA 5 inferidos	19/10/26	02/04/29	0%
► TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO	19/10/26	10/05/27	0%
► MASSA CORRIDA	24/11/27	01/12/28	0%
► PINTURA 1º DEMÃO	11/01/28	05/01/29	0%
► PINTURA 2º DEMÃO	27/03/28	27/02/29	0%
► TEXTURA - 1º DEMÃO	17/04/28	26/01/29	0%

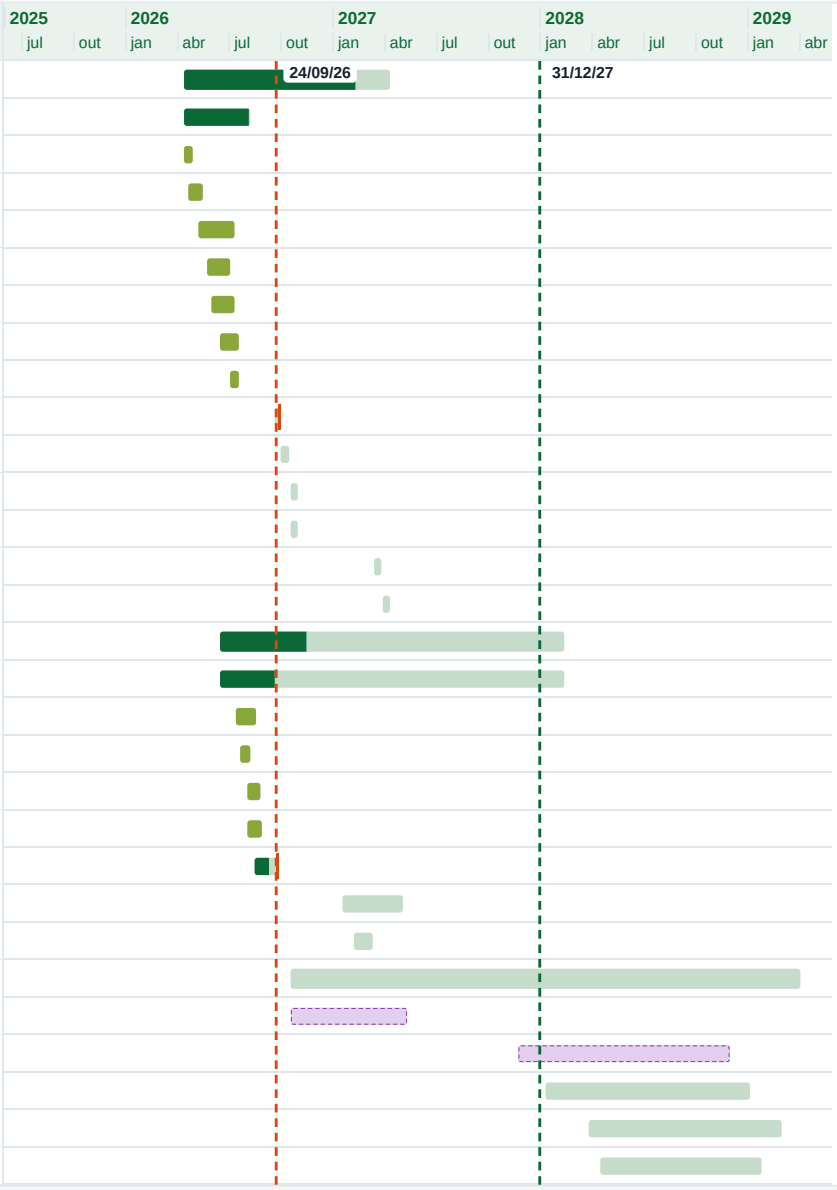


PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
PINTURA DE TUBULAÇÕES (PARED E TETO)	17/04/28	15/01/29	0%
PINTURA 3º DEMÃO	02/05/28	02/04/29	0%
PINTURA - CORRIMÃO	05/05/28	01/06/28	0%
TEXTURA - 2º E 3º DEMÃO	09/06/28	09/03/29	0%
TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE -...	22/06/28	19/07/28	0%
TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE -...	03/08/28	31/08/28	0%
TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE -...	09/10/28	07/11/28	0%
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (3 inferidos)	11/01/27	23/08/28	0%
DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - INFRAS ENTERR...	11/01/27	05/02/27	0%
PRUMADA HIDROSSANITÁRIA	05/04/27	26/05/28	0%
DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA	30/04/27	22/05/28	0%
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	30/04/27	22/05/28	0%
SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS	09/06/27	29/06/28	0%
DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA	28/06/27	23/02/28	0%
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DRYWALL	16/07/27	07/08/28	0%
DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DRYWALL	16/07/27	07/08/28	0%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24/09/27	30/05/28	0%
RESERVATÓRIO	19/10/27	21/07/28	0%
PRESSURIZAÇÃO (HIDRÁULICA)	22/06/28	12/07/28	0%
MONTAGEM - BOILERS E AQUECEDORES	24/07/28	23/08/28	0%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (3 inferidos)	18/01/27	12/03/29	0%
ENTRADA DE ENERGIA	18/01/27	05/02/27	0%
INFRA ELÉTRICA - TETO	03/02/27	15/10/27	0%
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO	30/04/27	22/05/28	0%
PRUMADA ELÉTRICA - INFRA	09/06/27	30/06/28	0%
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADRO - DRYWALL	16/07/27	07/08/28	0%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24/09/27	30/05/28	0%
FIAÇÃO ELÉTRICA	01/10/27	24/10/28	0%
PRUMADA ELÉTRICA - CABOS	01/10/27	25/10/28	0%
FIAÇÃO TELECOM/DADOS	01/10/27	26/10/28	0%

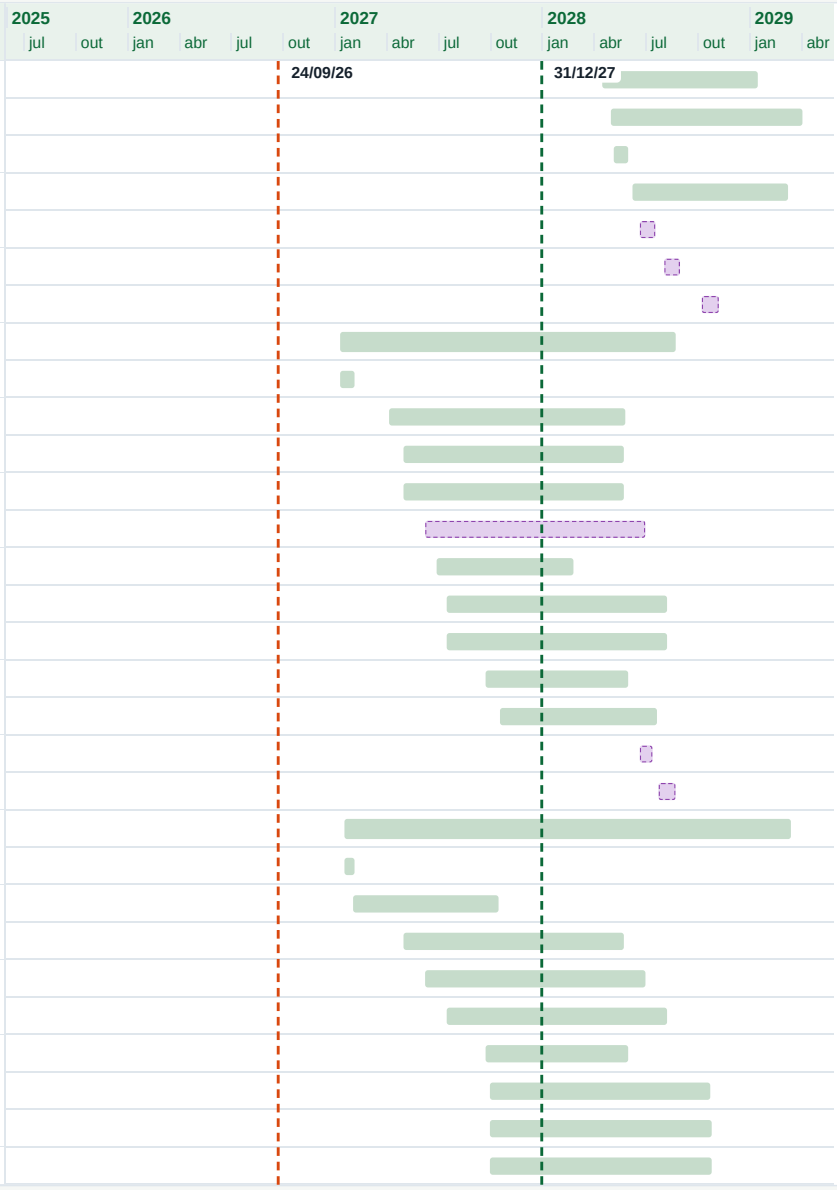


PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
► GERADOR/TRANSFORMADOR	17/01/28	01/03/28	0%
► DISJUNTORES / MIOLOS	21/01/28	05/02/29	0%
► INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SENSORES	21/01/28	28/08/28	0%
► INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	11/02/28	25/01/29	0%
► ACABAMENTOS ELÉTRICOS	07/04/28	12/03/29	0%
► INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS	19/05/28	09/02/29	0%
► SPDA	03/08/28	21/08/28	0%
▼ ALVENARIA	16/03/27	21/08/28	0%
► ALVENARIA	16/03/27	04/05/28	0%
► ENCUNHAMENTO	07/04/27	27/04/28	0%
► ALVENARIA - ISOLAMENTO DE CONTENÇÕES	09/04/27	11/05/27	0%
► DRYWALL 1º FACE	05/07/27	25/07/28	0%
► DRYWALL 2º FACE	29/07/27	21/08/28	0%
► DRYWALL	10/09/27	02/03/28	0%
► SHAFT	19/10/27	26/06/28	0%
▼ INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO (1 inferido)	30/03/27	14/09/28	0%
► PRUMADA DE INCÊNDIO	30/03/27	18/04/28	0%
► INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	04/10/27	26/05/28	0%
► INSTALAÇÕES INCÊNDIO	31/01/28	18/02/28	0%
► PRESSURIZAÇÃO (INCÊNDIO)	24/08/28	14/09/28	0%
▼ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	16/04/27	21/06/28	0%
► TALISCAMENTO	16/04/27	09/05/28	0%
► REBOCO INTERNO	26/05/27	21/06/28	0%
▼ ESQUADRIAS (3 inferidos)	13/05/27	25/01/29	0%
► CONTRAMARCO	13/05/27	02/06/28	0%
► ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	07/12/27	17/11/28	0%
► ESQUADRIA MADEIRA	04/02/28	12/01/29	0%
► INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISE - F...	10/05/28	21/06/28	0%
► INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - ...	22/06/28	02/08/28	0%
► BRISE	26/07/28	25/01/29	0%




PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▸ INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - …	18/08/28	06/10/28	0%
▾ SERRALHERIA (1 inferido)	14/06/27	16/01/29	0%
▸ CHUMBAMENTO DE PCF	14/06/27	12/01/28	0%
▸ SERRALHERIA	02/08/27	29/06/28	0%
▸ INSTALAÇÃO DE PCF (FOLHA)	14/02/28	16/01/29	0%
▸ INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO (SERRALHERIA)	22/02/28	04/05/28	0%
▸ PONTOS DE ANCORAGEM INOX	29/03/28	04/04/28	0%
▾ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	22/06/27	07/08/28	0%
▸ CONTRAPISO	22/06/27	07/08/28	0%
▾ INSTALAÇÕES ESPECIAIS (4 inferidos)	16/07/27	05/02/29	0%
▸ INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO	16/07/27	07/08/28	0%
▸ PRESSURIZAÇÃO (VENTILAÇÃO)	19/10/27	06/12/27	0%
▸ INST. MÓDULOS CHURRASQUEIRA	31/01/28	04/02/28	0%
▸ COMUNICAÇÃO E ALARME	01/03/28	05/02/29	0%
▸ AQUECEDOR (SAUNA)	01/06/28	14/06/28	0%
▸ EQUIPAMENTOS - PISCINA	02/08/28	01/09/28	0%
▾ IMPERMEABILIZAÇÃO	11/08/27	01/09/28	0%
▸ IMPERMEABILIZAÇÃO	11/08/27	01/09/28	0%
▾ REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHA… (7 inferidos)	18/08/27	27/02/29	0%
▸ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F1 +…	18/08/27	08/09/27	0%
▸ FACHADA LOJA	26/08/27	18/01/28	0%
▸ FACHADA AERADA - F1 + F2 (1º ETAPA)	09/09/27	05/11/27	0%
▸ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F3 +…	14/10/27	04/11/27	0%
▸ FACHADA AERADA - F3 + F4 (1º ETAPA)	08/11/27	12/01/28	0%
▸ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F…	08/11/27	06/12/27	0%
▸ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F5 (…	14/12/27	11/01/28	0%
▸ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F…	05/01/28	01/02/28	0%
▸ FACHADA AERADA - F5 (1º ETAPA)	13/01/28	22/03/28	0%
▸ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F1 +…	14/02/28	10/03/28	0%
▸ REBOCO EXTERNO	03/03/28	25/05/28	0%

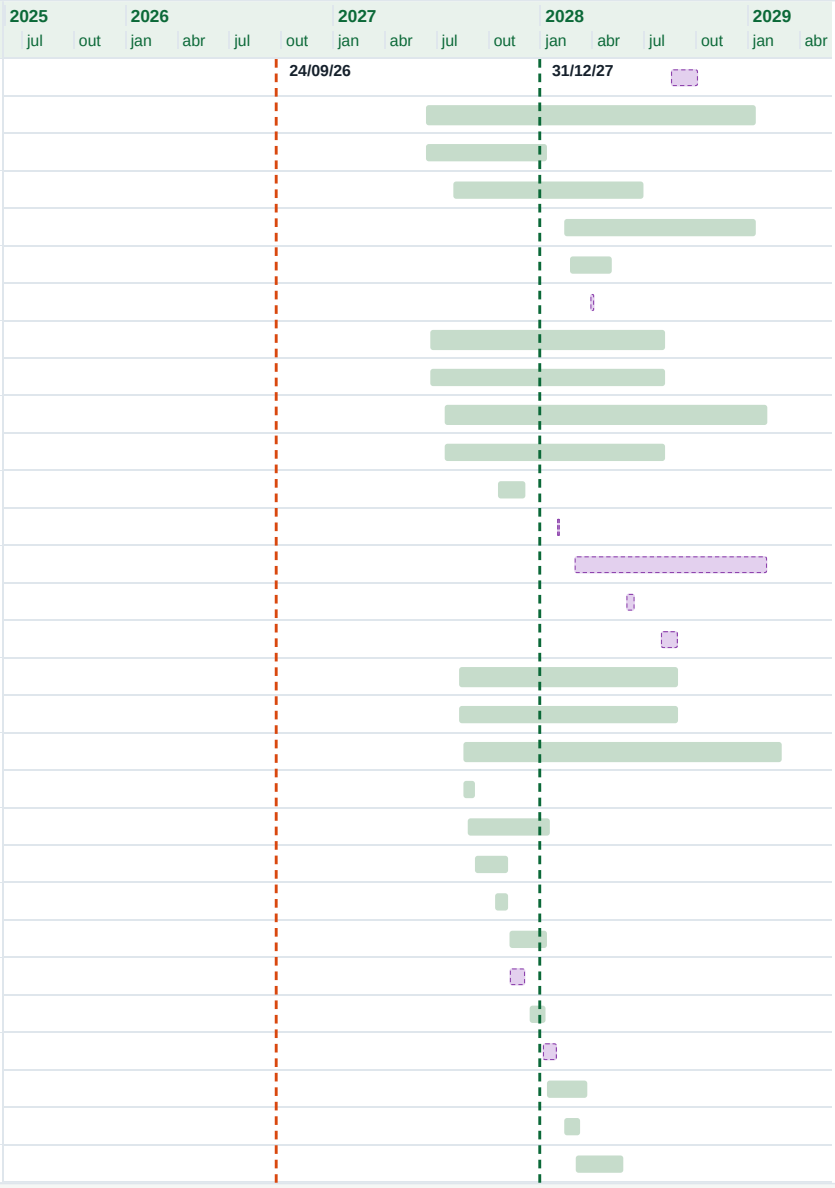

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▸ FACHADA AERADA - F1 + F2 (2º ETAPA)	13/03/28	25/04/28	0%
▸ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F… ⓘ	15/03/28	19/04/28	0%
▸ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F3 +…	24/03/28	24/04/28	0%
▸ TEXTURA - EXTERNA ⓘ	27/03/28	27/02/29	0%
▸ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F… ⓘ	17/04/28	09/05/28	0%
▸ FACHADA AERADA - F3 + F4 (2º ETAPA)	26/04/28	07/06/28	0%
▸ PREPARAÇÃO PARA FACHADA AERADA - F5 (…	10/05/28	06/06/28	0%
▸ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F… ⓘ	31/05/28	21/06/28	0%
▸ FACHADA AERADA - F5 (2º ETAPA)	08/06/28	27/07/28	0%
▸ FACHADA	16/06/28	19/09/28	0%
▸ PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F… ⓘ	20/07/28	17/08/28	0%
▸ FACHADA EMBASAMENTO	18/08/28	04/01/29	0%
▾ REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO 1 inferido	24/08/27	15/02/29	0%
▸ REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE	24/08/27	15/09/28	0%
▸ REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO	06/09/27	28/09/28	0%
▸ REVESTIMENTO DE GRANITO PISO	20/09/27	04/08/28	0%
▸ BANCADAS	20/09/27	11/10/28	0%
▸ PISO VINÍLICO / LAMINADO	24/01/28	03/01/29	0%
▸ RODAPÉ MADEIRA / PVC	17/02/28	23/01/29	0%
▸ POLIMENTO DE PISO ⓘ	24/03/28	15/12/28	0%
▸ PISO EMBORRACHADO	18/05/28	31/05/28	0%
▸ REVESTIMENTO ACABAMENTO	31/05/28	15/02/29	0%
▸ PISO ELEVADO	11/09/28	26/10/28	0%
▾ ELEVADORES 1 inferido	20/09/27	09/10/28	0%
▸ INSTALAÇÃO DE ADUELAS (ELEVADORES) ⓘ	20/09/27	13/07/28	0%
▸ PREPARAÇÃO - POÇO DE ELEVADOR	14/02/28	18/05/28	0%
▸ MONTAGEM - ELEVADOR 1	19/05/28	05/07/28	0%
▸ MONTAGEM - ELEVADOR 2	06/07/28	22/08/28	0%
▸ MONTAGEM - ELEVADOR 3	23/08/28	09/10/28	0%
▾ FORRO	15/10/27	03/11/28	0%

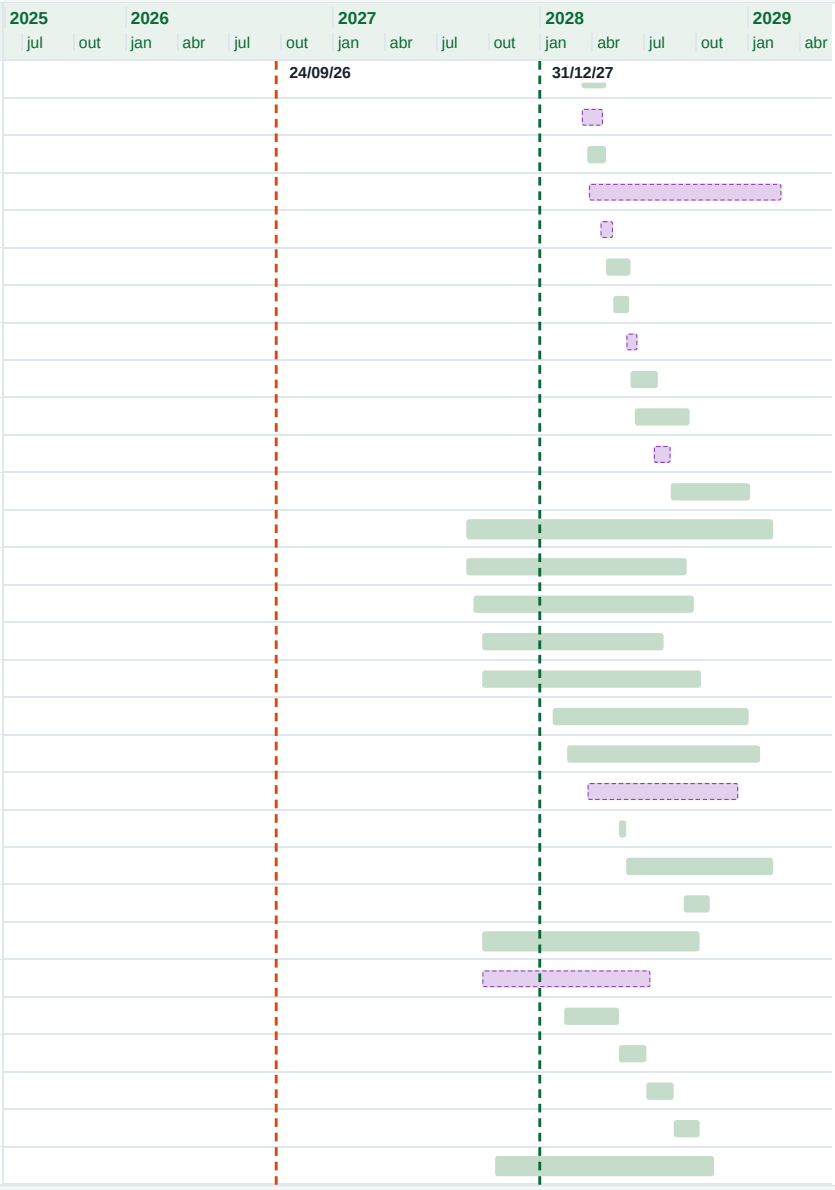

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▸ FORRO	15/10/27	03/11/28	0%
▾ PAVIMENTAÇÃO (2 inferidos)	30/11/27	01/03/29	0%
▸ PASSEIOS, MURETAS E RAMPAS	30/11/27	09/03/28	0%
▸ DEMARCAÇÃO DE VAGAS	19/05/28	01/03/29	0%
▸ QUADRA DE RECREAÇÃO	08/08/28	10/10/28	0%
▾ SEM PL (gestão / entrega) (7 inferidos)	11/02/28	30/04/29	0%
▸ PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS	11/02/28	09/02/29	0%
▸ CHECKLIST	24/04/28	19/03/29	0%
▸ CHECKLIST FINAL	31/10/28	13/04/29	0%
▸ ENXOVAL	17/11/28	02/04/29	0%
▸ VISTORIA APTOS	08/01/29	18/04/29	0%
▸ HABITE-SE	01/03/29	02/04/29	0%
▸ ENTREGA SÍNDICO	03/04/29	30/04/29	0%
▾ MARCENARIA	14/02/28	16/01/29	0%
▸ MARCENARIA - SHAFTS	14/02/28	16/01/29	0%
▾ LOUÇAS SANITÁRIAS	01/03/28	09/02/29	0%
▸ LOUÇAS	01/03/28	05/02/29	0%
▸ METAIS	01/03/28	05/02/29	0%
▸ INSTALAÇÃO DE METAIS	19/05/28	09/02/29	0%
▾ LIMPEZA FINAL DE OBRA	14/03/28	13/04/29	0%
▸ LIMPEZA GROSSA	14/03/28	14/02/29	0%
▸ LIMPEZA FINA	15/05/28	13/04/29	0%
▸ LIMPEZA	26/06/28	02/04/29	0%
▾ PAISAGISMO	08/06/28	06/12/28	0%
▸ IRRIGAÇÃO	08/06/28	25/10/28	0%
▸ PAISAGISMO	16/06/28	06/12/28	0%

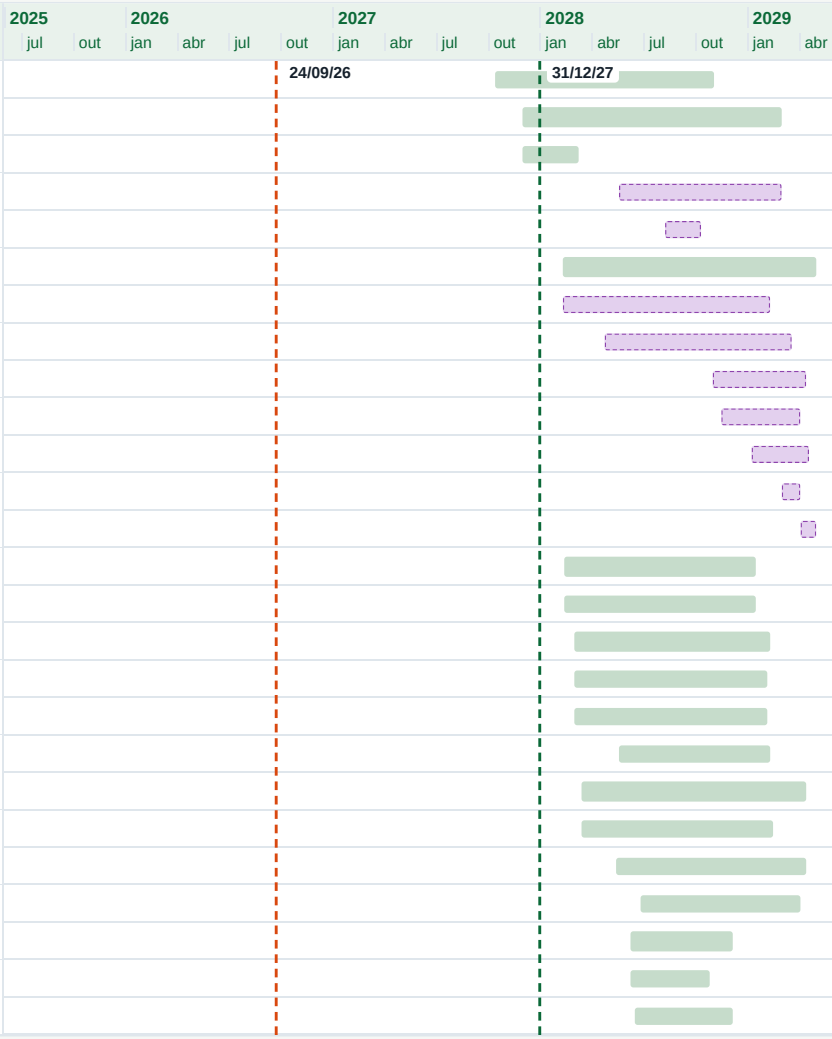

PACOTES NÃO DESCRITOS DE FORMA EXPRESSA NA CURVA DO PREVISION (45)

PL	Pacote	Nota
FUNDAÇÃO PROFUNDA	**VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - CENTRAL DE POLÍMEROS)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.
FUNDAÇÃO PROFUNDA	**VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 1º ETAPA)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.
FUNDAÇÃO PROFUNDA	**VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA MANACA 2º ETAPA)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.
FUNDAÇÃO PROFUNDA	**VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 1º ETAPA)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.
FUNDAÇÃO PROFUNDA	**VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 2º ETAPA)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.
FUNDAÇÃO PROFUNDA	**VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA BOM JESUS)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.
FUNDAÇÃO PROFUNDA	**VIGA DE COROAMENTO (TRECHO - RUA IPÊ 3º ETAPA)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA (termo sem correspondência: viga, coroamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES.
PINTURA	**TRATAMENTO DE CONCRETO - TETO**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
PINTURA	**MASSA CORRIDA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: massa, corrida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 28 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES.
PINTURA	**TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F1 + F2**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
PINTURA	**TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F3 + F4**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
PINTURA	**TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - F5**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: tratamento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: shaft). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 18 – ALVENARIA; 27 – MARCENARIA.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**PRESSURIZAÇÃO (HIDRÁULICA)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: pressurizacao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 34 – LOUÇAS E METAIS.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**MONTAGEM - BOILERS E AQUECEDORES**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (termo sem correspondência: boilers). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**GERADOR/TRANSFORMADOR**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: gerador). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**DISJUNTORES / MIOLOS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: disjuntores, miolos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).

PL	Pacote	Nota
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**INST. CARREGADOR DE VEÍCULOS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: carregador, veiculos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.
INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	**PRESSURIZAÇÃO (INCÊNDIO)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO (termo sem correspondência: pressurizacao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 34 – LOUÇAS E METAIS.
ESQUADRIAS	**INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISE - F1 + F2**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 25 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: shadowbox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
ESQUADRIAS	**INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - F3 + F4**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 25 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: shadowbox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
ESQUADRIAS	**INSTALAÇÃO DE SHADOWBOX E BRISES - F5**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 25 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: shadowbox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
SERRALHERIA	**PONTOS DE ANCORAGEM INOX**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 26 – SERRALHERIA (termo sem correspondência: pontos, ancoragem, inox). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	**INST. MÓDULOS CHURRASQUEIRA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: modulos, churrasqueira). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	**COMUNICAÇÃO E ALARME**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: comunicacao, alarme). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 09 – CONSULTORIAS (OBRAS); 22 – INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA.
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	**AQUECEDOR (SAUNA)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: aquecedor). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 21 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS.
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	**EQUIPAMENTOS - PISCINA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: equipamentos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 10 – MÃO DE OBRA PRÓPRIA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	**PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F1 + F2 (1º ETAPA)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	**PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F3 + F4 (1º ETAPA)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	**PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F5 (1º ETAPA)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	**TEXTURA - EXTERNA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: textura). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS.
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	**PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F1 + F2 (2º ETAPA)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	**PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F3 + F4 (2º ETAPA)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	**PEITORIS E REQUADROS DE FACHADA - F5 (2º ETAPA)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA (termo sem correspondência: peitoris, requadros). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.

PL	Pacote	Nota
REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	**POLIMENTO DE PISO**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO (termo sem correspondência: polimento). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA; 16 – FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO.
ELEVADORES	**INSTALAÇÃO DE ADUELAS (ELEVADORES)**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – ELEVADORES (termo sem correspondência: aduelas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
PAVIMENTAÇÃO	**DEMARCAÇÃO DE VAGAS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTÇÃO (termo sem correspondência: demarcacao, vagas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 18 – ALVENARIA; 35 – PINTURAS.
PAVIMENTAÇÃO	**QUADRA DE RECREAÇÃO**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 31 – PAVIMENTÇÃO (termo sem correspondência: quadra, recreacao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 19 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
SEM PL (gestão / entrega)	**PLACAS E IDEINTIFIC. VISUAIS**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**CHECKLIST**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**CHECKLIST FINAL**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**ENXOVAL**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**VISTORIA APTOS**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**HABITE-SE**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**ENTREGA SÍNDICO**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.

Fonte: aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (export do Prevision). Datas de início e término e % realizado vêm do Prevision; nos níveis PL e pacote o % é a média dos itens ponderada pela duração. O cronograma é o mesmo nos três cenários (os cenários mudam as curvas financeiras, não as datas das atividades).
