Ed Jardim · Esquemático de avanço por pavimento

Corte ilustrativo (sem escala): cada célula é o avanço da PL no pavimento, pelas atividades do cronograma do Prevision · passe o mouse numa célula para ver o detalhe

Concluído · Em andamento (50% a 99%) · Em andamento (1% a 49%) · A executar · Sem atividade da PL no pavimento


SITUAÇÃO EM 07/10/2026 (realizado do cronograma)

Pavimentos **26%** Infraestrutura **94%** Fachada **0%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. ACABAM.	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE																			0%
28º LAJE TÉCNICA																			0%
27º DUPLEX SUPERIOR																			0%
26º DUPLEX INFERIOR																			0%
25º TIPO																			0%
24º TIPO																			0%
23º TIPO																			0%
22º TIPO																			0%
21º TIPO																			0%
20º TIPO																			0%
19º TIPO																			0%
18º TIPO	94																		3%
17º TIPO	100																		4%
16º TIPO	100																		2%
15º TIPO	100																		4%
14º TIPO	100																		2%
13º TIPO	100	16																	7%
12º TIPO	100	67																	8%
11º TIPO	100	53																	9%
10º TIPO	100	97		9							28								16%
9º TIPO	100	46						6											8%
8º TIPO	100	35						8											7%
7º TIPO	100	98		10				9			87								16%
6º TIPO	100	98		18				11			32								16%
5º TIPO	100	66	2					10			10								13%
4º APTO GARDEN	99	68						2											44%
3º PILOTIS	100	98	28	39			35				44					26	4		36%
2º GARAGEM	99	100		62	15						96								75%
TÉRREO	91	92		66	37					60	51								64%
Infraestrutura	Contenção, terraplenagem e fundações: 94%																		
% da PL	**89**	**70**	**13**	**22**	**9**	**0**	**6**	**2**	**0**	**12**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**1**		**26%**

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2026

Pavimentos **34%** Infraestrutura **96%** Fachada **18%**

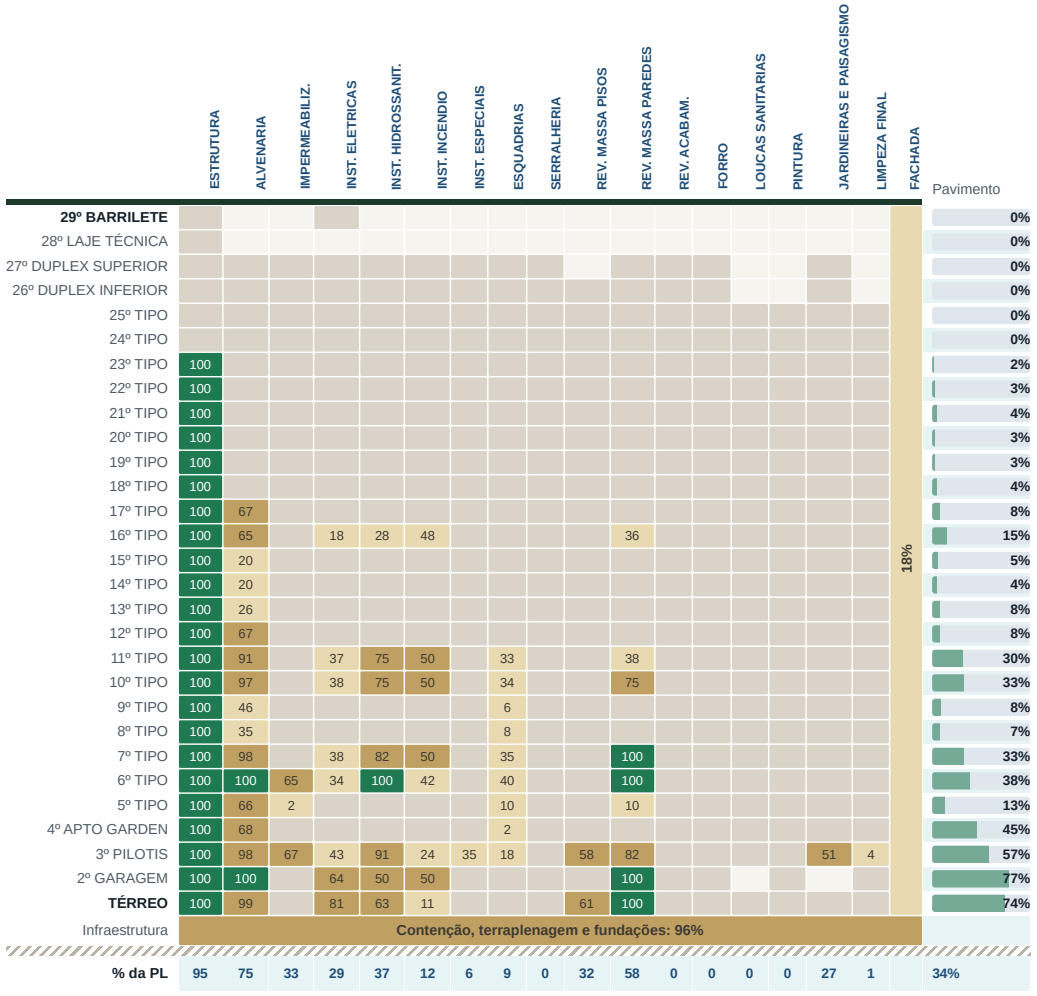

RETRATO: PREVISÃO PARA 31/12/2027

Pavimentos **76%** Infraestrutura **100%** Fachada **86%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. ACABAM.	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100															100%
28º LAJE TÉCNICA	100																		100%
27º DUPLEX SUPERIOR	100	97		79	100	46		36			57								52%
26º DUPLEX INFERIOR	100	97		79	77	48		100			100								52%
25º TIPO	100	97	48	38	100	46		35			100								34%
24º TIPO	100	100	85	40	100	48		37		63	100								40%
23º TIPO	100	100	100	51	100	42	55	37		100	100								43%
22º TIPO	100	100	100	49	100	48	43	35		100	100	31							47%
21º TIPO	100	100	100	51	100	48	45	33		100	100	47							50%
20º TIPO	100	100	100	72	100	46	61	36		100	100	49	55		42				60%
19º TIPO	100	100	100	73	100	50	63	31		100	100	47	50		44				60%
18º TIPO	100	100	100	74	100	44	63	36		100	100	45	48		44				61%
17º TIPO	100	100	100	70	100	48	56	30		100	100	48	51		42				59%
16º TIPO	100	100	100	76	100	48	68	35		100	100	45	50		43				62%
15º TIPO	100	100	100	67	100	52	59	49		100	100	48							56%
14º TIPO	100	100	100	72	100	46	59	72		100	100	46	44						59%
13º TIPO	100	100	100	50	100	52	43	74		100	100	43							54%
12º TIPO	100	100	100	71	100	50	59	76		100	100	48	51		49				64%
11º TIPO	100	100	100	86	100	50	100	100		100	100	77	100		40	85			80%
10º TIPO	100	100	100	86	100	50	100	100		100	100	96	100		40	100			83%
9º TIPO	100	100	100	70	100	44	59	74		100	100	64	51		41				65%
8º TIPO	100	100	100	71	100	44	59	100		100	100	70	95		40				72%
7º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	71		98%
6º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
5º TIPO	100	100	100	85	100	44	94	100		100	100	77	100		41				78%
4º APTO GARDEN	100	100	100	86	100	44	100	100		100	100	83	100		40	100			88%
3º PILOTIS	100	100	100	93	100	74	97	100		100	100	90	100	42	82	100	56		95%
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	50	100	35		100	100	88	35		61		29		94%
TÉRREO	100	99	100	88	94	38	59	11		90	100	63	50	77	11	82			88%
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 100%**																		
% da PL	**100**	**100**	**95**	**78**	**98**	**53**	**69**	**66**	**8**	**93**	**99**	**61**	**53**	**15**	**41**	**72**	**17**		**76%**

Pavimentos: nº na coluna N da aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (lote do Prevision). PLs com atividades em pelo menos 3 pavimentos; infraestrutura = contenção, terraplenagem, fundação profunda, fundação superficial; fachada = revestimento diversos fachada (lotes sem pavimento). Previsão: o saldo de cada tarefa segue linear da data da situação (ou do início planejado) até o término planejado. Esquema ilustrativo, sem escala, não substitui o levantamento em campo.
