
Ed Jardim · Gantt do cronograma


2.253 atividades do Prevision (situação em 28/09/26) · PL → pacote de trabalho → pavimento/tarefa · clique na seta para abrir

Planejado (início → término) · Realizado (% do Prevision) · Concluído · **Não descrito de forma expressa na curva do Prevision** (notas na última página) · Previsto para a data (atraso > 5 p.p.) · Situação 28/09/26 · 31/12/2027


PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▼ SERVIÇOS INICIAIS	01/08/24	12/02/27	80%
DEMOLIÇÃO FASE 1	01/08/24	25/09/24	100%
DEMOLIÇÃO BALTAZAR	29/01/27	12/02/27	0%
▼ TERRAPLENAGEM	12/08/24	22/04/27	74%
► TERRAPLENAGEM	12/08/24	22/04/27	74%
► RETIRADA DE TERRA DE FUNDAÇÃO(BOTA F…	28/04/25	02/05/25	100%
▼ CONTENÇÃO	21/10/24	28/11/25	100%
► CONTENÇÃO	21/10/24	28/11/25	100%
▼ FUNDAÇÃO PROFUNDA	19/02/25	16/05/25	100%
► FUNDAÇÃO PROFUNDA	19/02/25	16/05/25	100%
► FUNDAÇÃO PROFUNDA - TRECHO A	28/04/25	16/05/25	100%
► FUNDAÇÃO PROFUNDA - TRECHO C	05/05/25	09/05/25	100%
▼ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	28/04/25	12/09/25	97%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - TRECHO B	28/04/25	28/07/25	95%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - TRECHO C - N948	28/04/25	12/09/25	100%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - TRECHO C - N941	05/05/25	10/07/25	88%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	14/05/25	12/09/25	100%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - TRECHO A (2º ETA…	22/07/25	25/07/25	100%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - TRECHO A (4º ETA…	24/07/25	27/08/25	100%
► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - TRECHO A (ETAPA …	01/09/25	12/09/25	100%
▼ ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 6 inferidos	19/05/25	29/10/27	73%

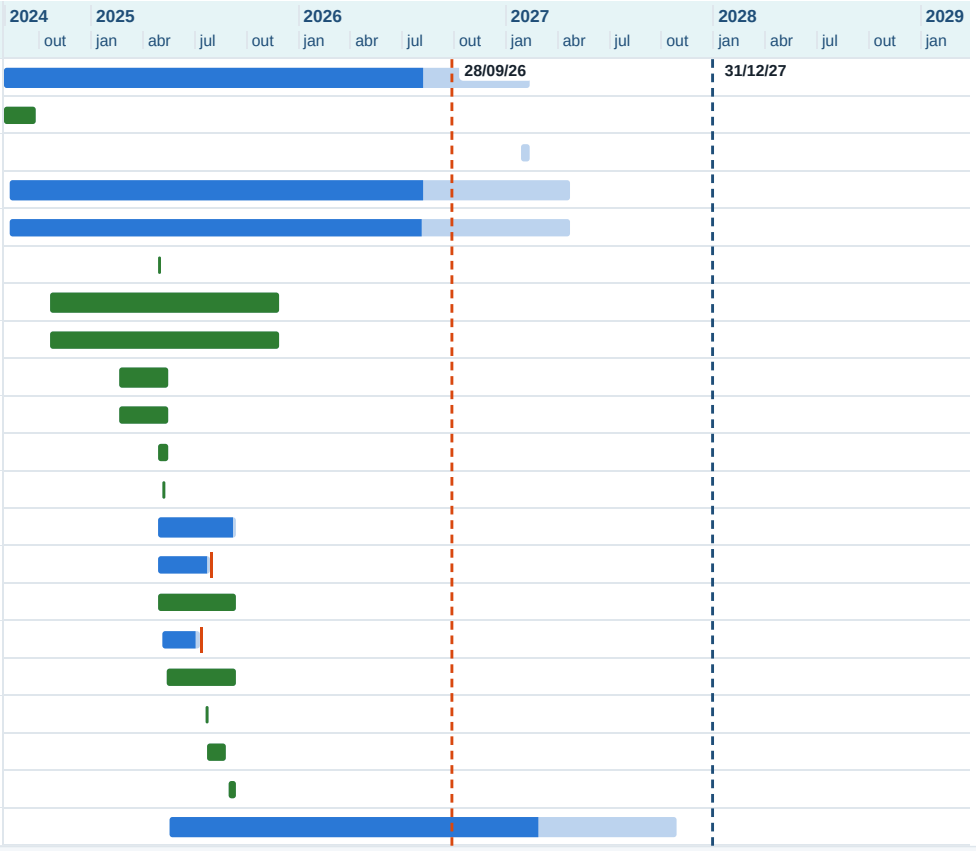


PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
ESTRUTURA EMBASAMENTO B	19/05/25	10/10/25	100%
ESTRUTURA EMBASAMENTO B - MEDIÇÃO	19/05/25	10/10/25	100%
ESTRUTURA TORRE A	01/09/25	15/10/25	100%
ESTRUTURA TORRE	15/09/25	06/04/27	67%
ESTRUTURA EMBASAMENTO C	07/10/25	19/02/26	100%
ESTRUTURA EMBASAMENTO C - MEDIÇÃO	07/10/25	17/02/26	100%
ESTRUTURA TORRE A - LOOKAHEAD	03/11/25	28/11/25	100%
ESTRUTURA TORRE - GARDEN - LOOKAEHAD	26/11/25	19/12/25	100%
VIGA SOLTEIRA	05/01/26	23/02/26	100%
VIGA INVERTIDA	05/01/26	14/01/26	100%
VIGAS V31, V403 E V405 - TERRAÇO SALÃO D…	19/03/26	30/04/26	100%
PISO ARMADO - SETOR B	17/06/26	17/07/26	100%
PISO ARMADO - SETOR C	20/07/26	14/08/26	100%
PISO ARMADO - SETOR A	17/08/26	31/08/26	100%
EXECUÇÃO DE MURO	15/02/27	29/10/27	0%
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (6 inferidos)	01/08/25	16/03/28	8%
DRENAGEM	01/08/25	03/10/25	100%
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE REUSO	02/03/26	31/03/26	100%
POÇO ARTESIANO	16/03/26	17/07/26	100%
PRUMADA HIDROSSANITÁRIA	10/08/26	17/09/27	3%
DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA	24/08/26	14/09/27	0%
GÁS	01/09/26	27/10/27	0%
DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - SETOR B	08/09/26	07/10/26	0%
SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS	16/09/26	11/01/28	0%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	25/09/26	16/03/28	0%
DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - SETOR C	08/10/26	10/11/26	0%
DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - SETOR A	11/11/26	11/12/26	0%
RESERVATÓRIO - CAIXA DE DETENÇÃO	23/04/27	26/07/27	0%
RESERVATÓRIOS / BOILERS	22/06/27	12/07/27	0%
RAMAL DE ENTRADA - COPASA	01/07/27	01/10/27	0%

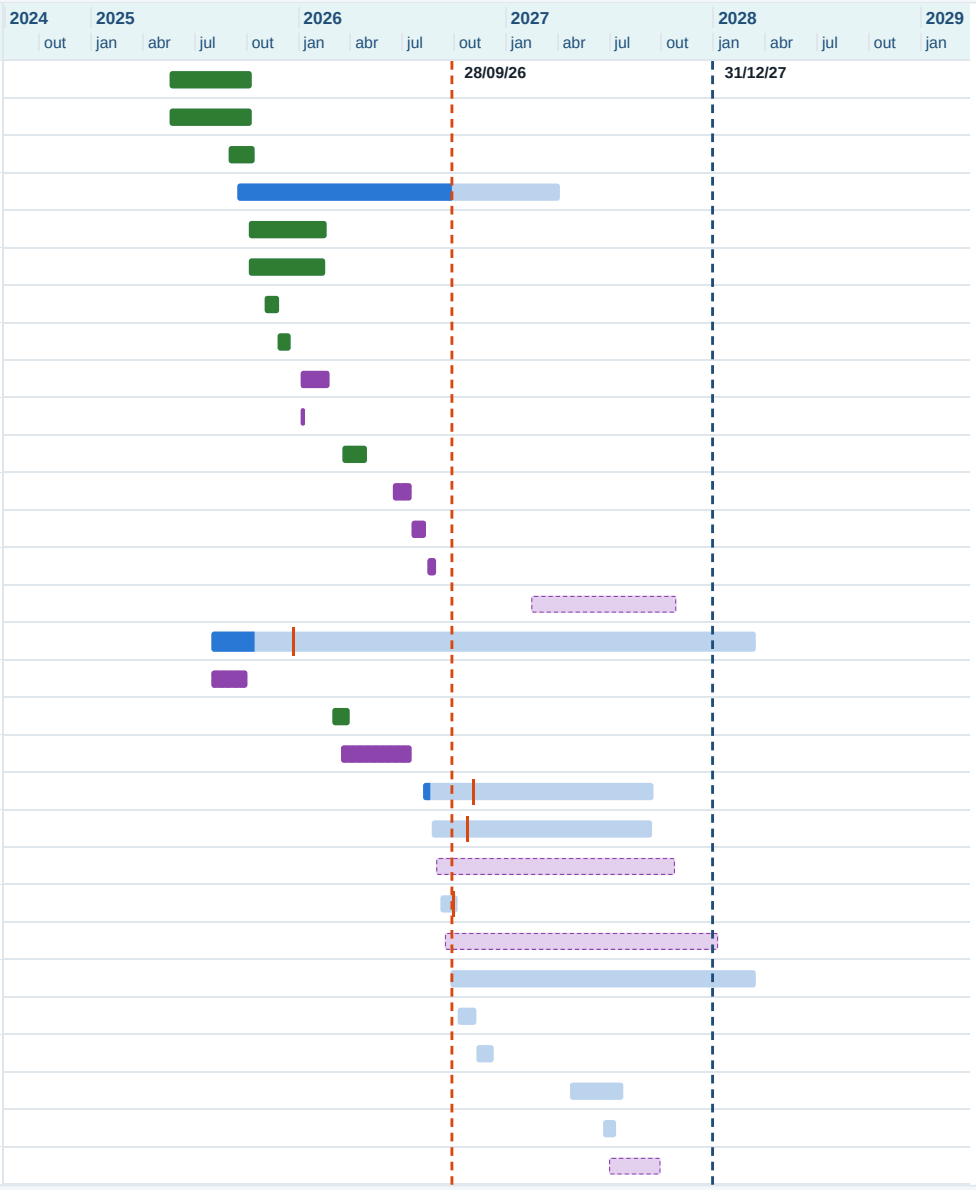


PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
LIGAÇÃO COPASA	02/07/27	05/11/27	0%
▼ ALVENARIA (5 inferidos)	03/11/25	02/03/28	55%
► ALVENARIA BLOCO CHEIO + ACERTO DE TAL…	03/11/25	28/11/25	100%
► ESTUQUE - SETOR B	10/11/25	17/07/26	100%
► ALVENARIA - POSTERIOR E LATERAL ESQUER…	03/12/25	19/06/26	100%
► ALVENARIA FECHAMENTO POSTERIOR C	25/02/26	04/03/26	100%
► ESTUQUE - SETOR C	02/03/26	24/08/26	100%
► ALVENARIA RAMPA B	05/03/26	16/03/26	100%
► ALVENARIA FECHAMENTO LATERAL - SETOR C	05/03/26	19/03/26	100%
► ESTUQUE - SETOR A	09/03/26	31/07/26	100%
► ALVENARIA - SETOR B	16/03/26	04/09/26	99%
► ALVENARIA CASA MAQUINAS A	17/03/26	27/03/26	100%
► ALVENARIA ÁREA SOCIAL	20/03/26	31/07/26	100%
► ALVENARIA	23/03/26	02/03/28	42%
► ALVENARIA EXTERNA	06/05/26	30/04/27	73%
► TRATAMENTO DE SHAFTS	10/08/26	30/10/26	25%
► ALVENARIA - SETOR C	08/09/26	07/10/26	60%
► ALVENARIA - SETOR A	08/10/26	10/11/26	0%
► ENCUNHAMENTO	08/10/26	27/10/27	0%
► TRATAMENTO ACÚSTICO	10/12/26	26/01/28	0%
▼ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (4 inferidos)	29/01/26	09/01/29	18%
► ENTRADA DE ENERGIA	29/01/26	05/06/26	100%
RAMAL DE ENTRADA - CEMIG	16/02/26	05/06/26	100%
► INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 1º QUAD…	01/04/26	16/06/26	99%
► INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - TETO	01/06/26	14/10/27	15%
► INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS - SET…	01/06/26	29/06/26	100%
► INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 2º QUAD…	17/06/26	10/07/26	100%
► INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS - SET…	30/06/26	21/07/26	100%
► INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 3º QUAD…	06/07/26	30/07/26	100%
► INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - PAREDES	13/07/26	16/03/28	4%

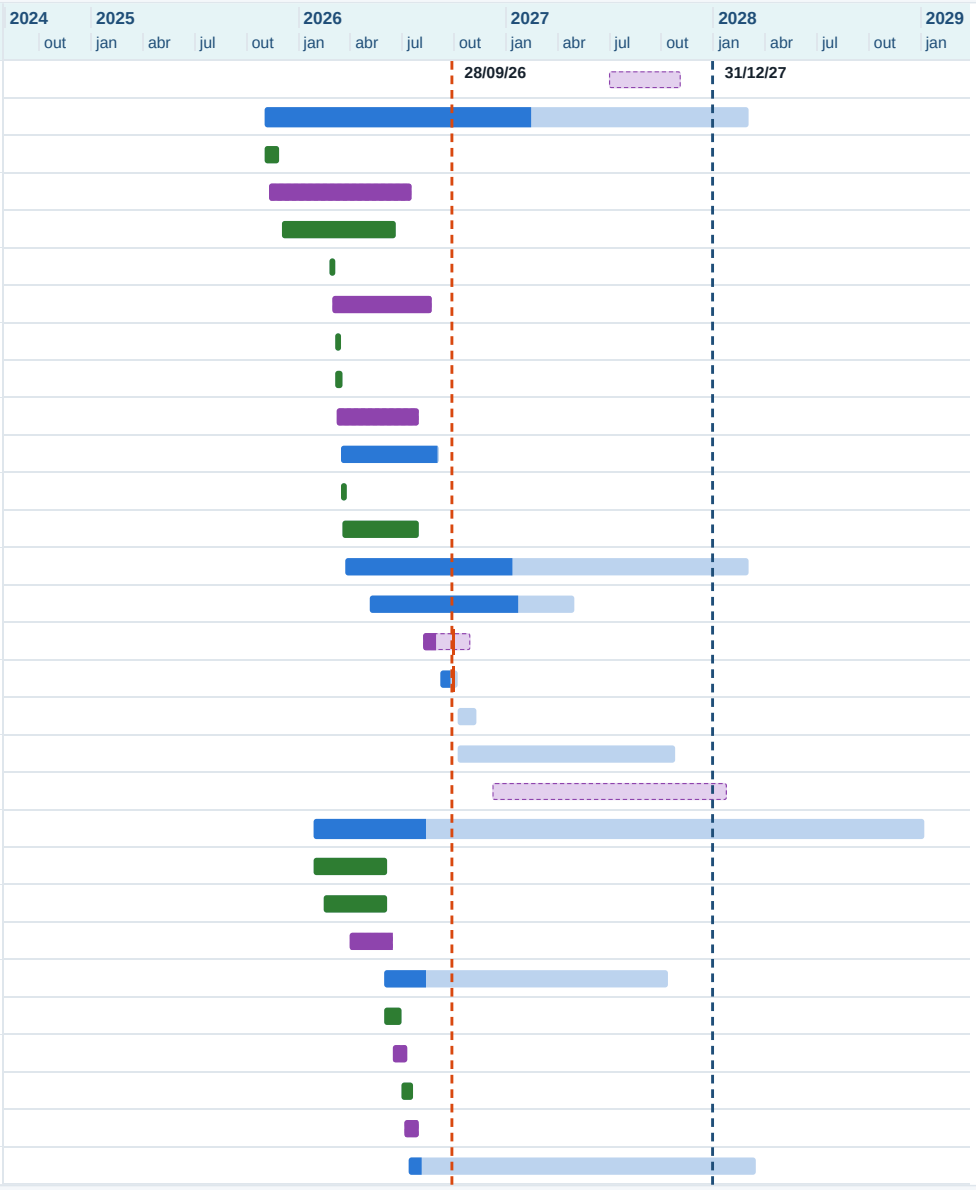


PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▸ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS - SET…	22/07/26	18/08/26	100%
▸ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (TETO) - SETOR B	03/08/26	15/09/26	95%
▸ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO - SETOR B	04/08/26	14/10/27	10%
▸ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24/08/26	16/03/28	40%
▸ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (TETO) - SETOR C	16/09/26	16/10/26	14%
▸ PRUMADA ELÉTRICA INFRA	29/09/26	27/09/27	0%
▸ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO - SETOR C	08/10/26	10/11/26	0%
▸ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (TETO) - SETOR A	19/10/26	18/11/26	0%
▸ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO - SETOR A	11/11/26	01/12/26	0%
▸ FIAÇÃO ELÉTRICA	13/01/27	17/04/28	0%
CAIXAS DE PASSAGEM	07/04/27	01/07/27	0%
▸ DISJUNTORES / MIOLOS ⓘ	02/08/27	18/10/28	0%
▸ SPDA	24/09/27	22/10/27	0%
▸ ACABAMENTOS ELÉTRICOS	07/10/27	09/01/29	0%
PRUMADA ELÉTRICA CABOS	07/01/28	07/04/28	0%
▸ GERADOR	11/01/28	17/01/28	0%
▾ JARDINEIRAS E PAISAGISMO 4 inferidos	02/02/26	01/12/28	22%
▸ PAISAGISMO	02/02/26	01/12/28	19%
▸ CAMINHO DO CLIENTE ⓘ	08/05/26	04/09/26	100%
▸ SISTEMA DE IRRIGAÇÃO ⓘ	04/01/27	22/04/27	0%
▸ QUADRA DE TÊNIS E POLIESPORTIVA ⓘ	10/02/27	16/07/27	0%
▸ PASSEIO ⓘ	10/02/28	06/03/28	0%
▾ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	02/03/26	30/03/28	29%
▸ REBOCO - SETOR B	02/03/26	21/10/26	49%
▸ REBOCO - SETOR C	01/04/26	23/11/26	58%
▸ REBOCO INTERNO	21/05/26	30/03/28	25%
▸ REBOCO - SETOR A	25/05/26	18/12/26	15%
▸ REVESTIMENTO DE MASSA	03/08/26	30/09/26	94%
▸ TALISCAMENTO	03/08/26	30/09/27	8%
▾ LIMPEZA FINAL DE OBRA	16/03/26	06/02/29	0%

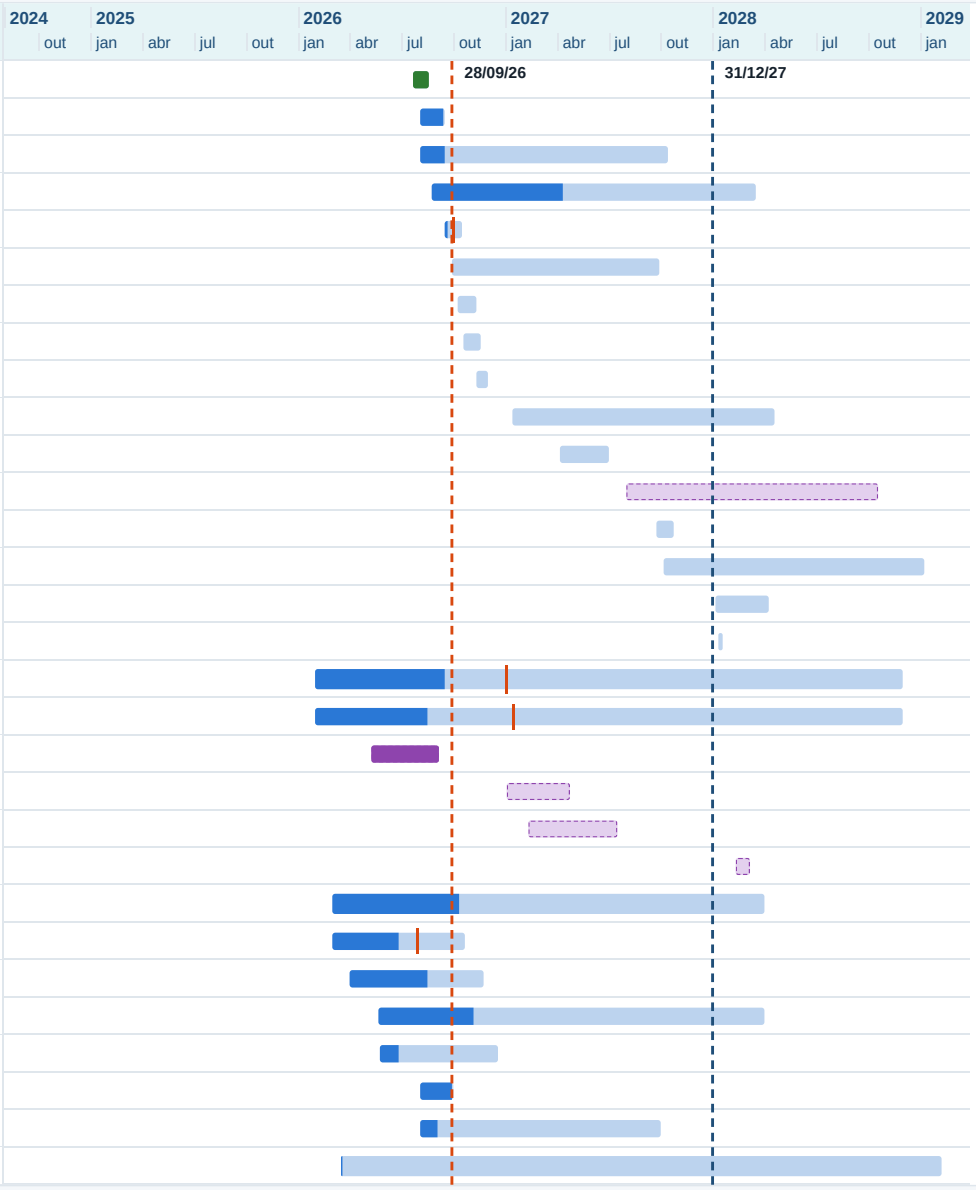


PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▸ LIMPEZA DE ETULHO E MADEIRA - SETOR B	16/03/26	20/03/26	100%
▸ LIMPEZA GROSSA	21/09/27	08/12/28	0%
▸ LIMPEZA FINA	19/11/27	06/02/29	0%
▸ LIMPEZA FACHADA	20/03/28	23/05/28	0%
▾ SEM PL (gestão / entrega) 9 inferidos	04/05/26	13/02/29	6%
▸ ÁREA DE VIVÊNCIA	04/05/26	15/06/26	100%
▸ ÁREA DE VIVÊNCIA + SALAS DE JOGOS	06/07/26	14/08/26	93%
▸ COMUNICAÇÃO VISUAL	22/11/27	07/02/29	0%
▸ CHECKLIST	03/12/27	13/02/29	0%
ENXOVAL	07/12/27	24/04/28	0%
MANUAL DE USO E OPERAÇÃO	05/01/28	03/02/28	0%
HABITE-SE	07/03/28	24/04/28	0%
AVCB	17/03/28	24/04/28	0%
ENTREGA OBRA / CONDOMÍNIO	25/04/28	19/05/28	0%
▾ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	17/06/26	13/04/28	12%
▸ CONTRAPISO	17/06/26	13/04/28	12%
▾ IMPERMEABILIZAÇÃO 1 inferido	13/07/26	02/03/28	7%
▸ REGULARIZAÇÃO DE PISO PARA IMPERMEABI…	13/07/26	22/09/26	92%
▸ IMPERMEABILIZAÇÃO	24/08/26	23/08/27	16%
▸ IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA	26/11/26	24/01/28	0%
▸ IMPERMEABILIZAÇÃO VARANDA E JARDINEIR…	11/12/26	07/02/28	0%
▸ DRENO + ATERRO JARDINEIRAS	07/01/27	02/03/28	0%
▾ INSTALAÇÕES ESPECIAIS 4 inferidos	10/08/26	18/10/28	4%
▸ PISCINA	10/08/26	29/04/27	32%
▸ INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO	21/01/27	20/03/28	0%
▸ AR CONDICIONADO	12/02/27	22/10/27	0%
▸ VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO	17/03/27	31/03/28	0%
▸ CFTV	02/08/27	18/10/28	0%
▸ COMUNICAÇÃO E ALARME	27/09/27	11/01/28	0%
▸ EQUIPAMENTOS	30/11/27	10/01/28	0%

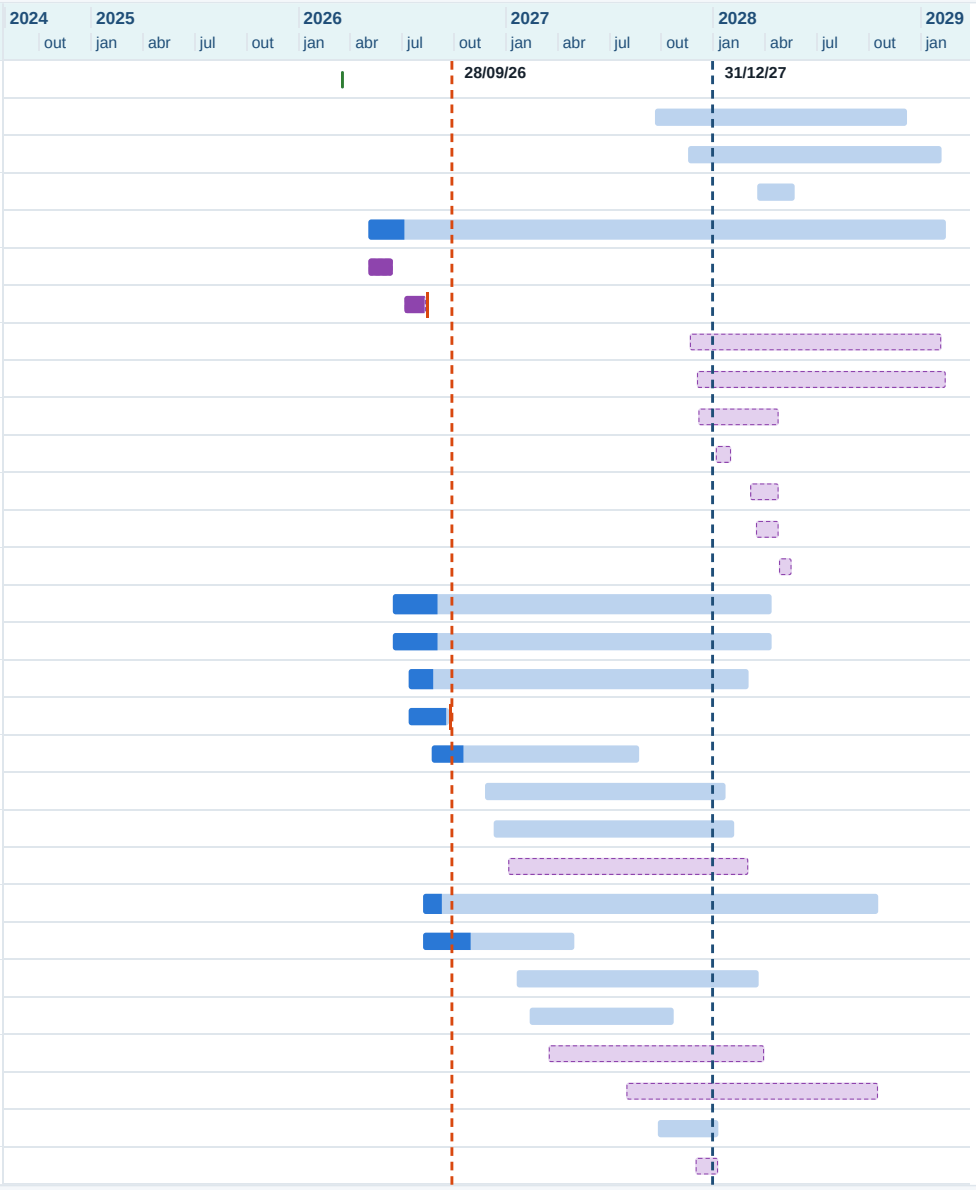

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▸ CARREGADOR VEICULAR / PORTA BOX	06/12/27	17/03/28	0%
▾ REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA	15/09/26	17/03/28	0%
▸ FACHADA POSTERIOR - F1 (A)	15/09/26	07/12/26	0%
▸ FACHADA JAIRO - F1 (B)	30/10/26	12/01/27	0%
▸ FACHADA FRONTAL - F1 (C)	10/12/26	11/05/27	0%
▸ FACHADA BALTAZAR - F1 (D)	15/12/26	29/01/27	0%
▸ FACHADA POSTERIOR - F2 (A)	01/04/27	18/08/27	0%
▸ FACHADA JAIRO - F2 (B)	11/06/27	09/09/27	0%
▸ FACHADA FRONTAL - F2 (C)	23/07/27	06/01/28	0%
▸ FACHADA BALTAZAR - F2 (D)	17/09/27	07/10/27	0%
▸ TEXTURA	11/10/27	02/02/28	0%
▸ FACHADA CREMALHEIRA	20/10/27	17/03/28	0%
▸ REBOCO EXTERNO	05/01/28	01/02/28	0%
▾ INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO 1 inferido	21/09/26	06/02/29	0%
▸ PRUMADA DE INCÊNDIO	21/09/26	17/09/27	0%
▸ ACABAMENTOS INCÊNDIO	21/06/27	06/02/29	0%
▾ ESQUADRIAS 1 inferido	23/09/26	19/09/28	0%
▸ CONTRAMARCO	23/09/26	27/10/27	0%
▸ ESPALA ESQUADRIA DE ALUMINIO	22/10/26	18/10/27	0%
▸ ESQUADRIA	08/04/27	12/09/28	0%
▸ ESQUADRIA MADEIRA	05/07/27	19/09/28	0%
▾ REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	11/01/27	09/01/29	0%
▸ REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO	11/01/27	24/02/27	0%
▸ REVESTIMENTO PAREDE	21/01/27	24/04/28	0%
▸ REVESTIMENTOS PISO	17/02/27	02/05/28	0%
▸ REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE	25/02/27	29/03/27	0%
▸ BANCADAS	03/03/27	24/03/28	0%
▸ PISO MADEIRA / LAMINADO	21/06/27	04/09/28	0%
▸ RODAPÉ MADEIRA / PVC	19/07/27	03/10/28	0%
▸ POLIMENTO PISO	28/07/27	18/10/27	0%

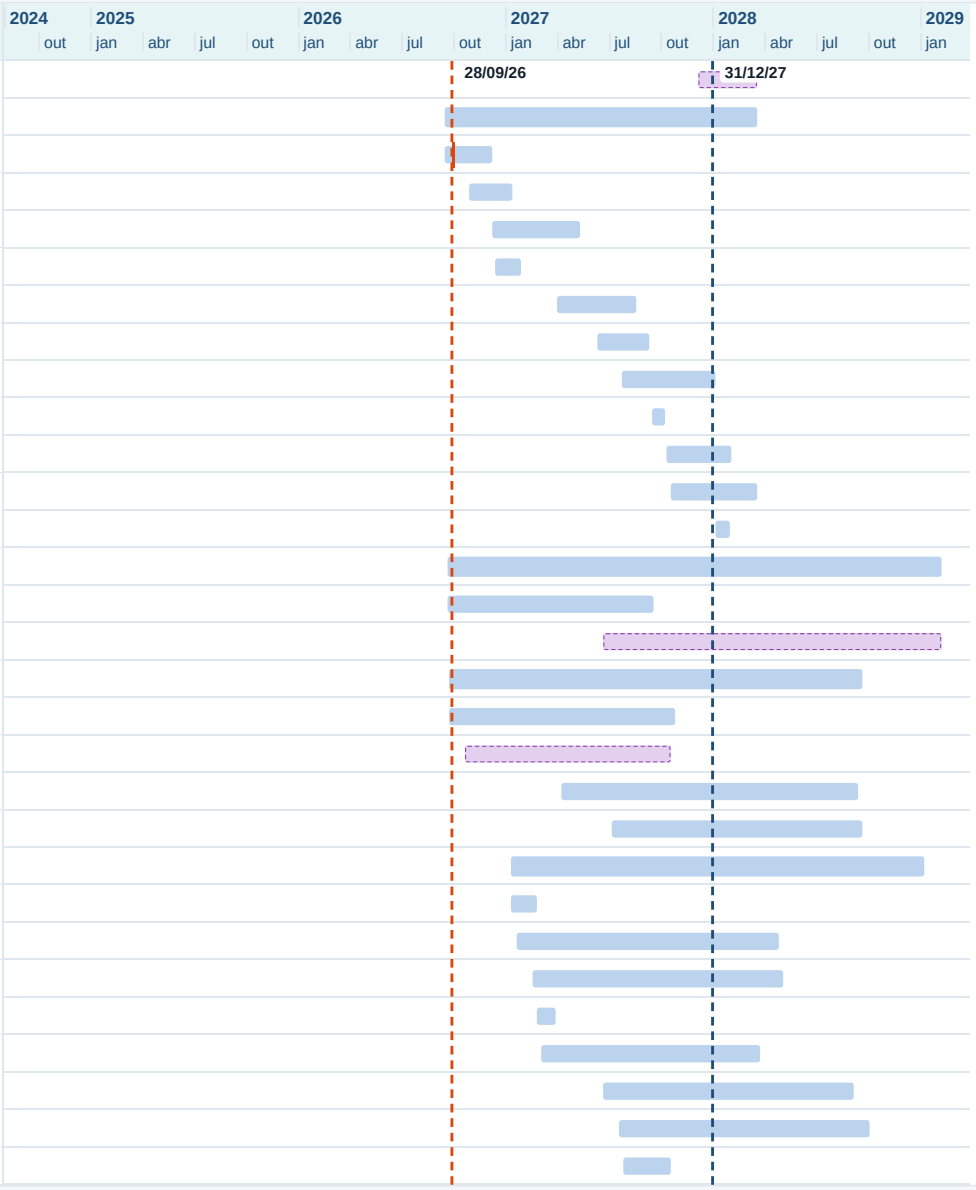

PL / pacote / pavimento	Início	Término	Real.
▸ DECK	02/08/27	15/09/27	0%
▸ PISO VINÍLICO / LAMINADO	02/08/27	13/08/27	0%
▸ TRATAMENTO DE GRANITO/MÁRMORE	30/08/27	09/01/29	0%
▸ PISO ELEVADO / EXTERNO	24/11/27	18/02/28	0%
▾ FORRO	30/03/27	09/11/28	0%
▸ FORRO	30/03/27	10/05/28	0%
▸ FORRO DE MADEIRA	12/07/27	09/11/28	0%
▾ ELEVADORES	20/04/27	06/01/28	0%
▸ PREPARAÇÃO POÇO ELEVADOR	20/04/27	12/08/27	0%
▸ ELEVADOR 1	23/06/27	23/08/27	0%
▸ ELEVADOR 2	24/08/27	20/10/27	0%
▸ ELEVADOR 3	21/10/27	06/01/28	0%
▾ PINTURA 1 inferido	30/04/27	23/01/29	0%
▸ MASSA CORRIDA ⓘ	30/04/27	19/05/28	0%
▸ PINTURA 1º DEMÃO	14/05/27	31/05/28	0%
▸ PINTURA 2º DEMÃO	05/10/27	22/12/28	0%
▸ PINTURA 3º DEMÃO	04/11/27	23/01/29	0%
▸ PINTURA VAGAS	12/11/27	03/03/28	0%
▾ LOUÇAS SANITÁRIAS	14/09/27	09/01/29	0%
▸ LOUÇAS	14/09/27	09/01/29	0%
▸ METAIS	20/10/27	09/01/29	0%
▾ SERRALHERIA	20/10/27	01/02/29	0%
▸ SERRALHERIA	20/10/27	01/02/29	0%
▾ ESTRUTURA METÁLICA	25/04/28	21/06/28	0%
▸ COBERTURA	25/04/28	21/06/28	0%

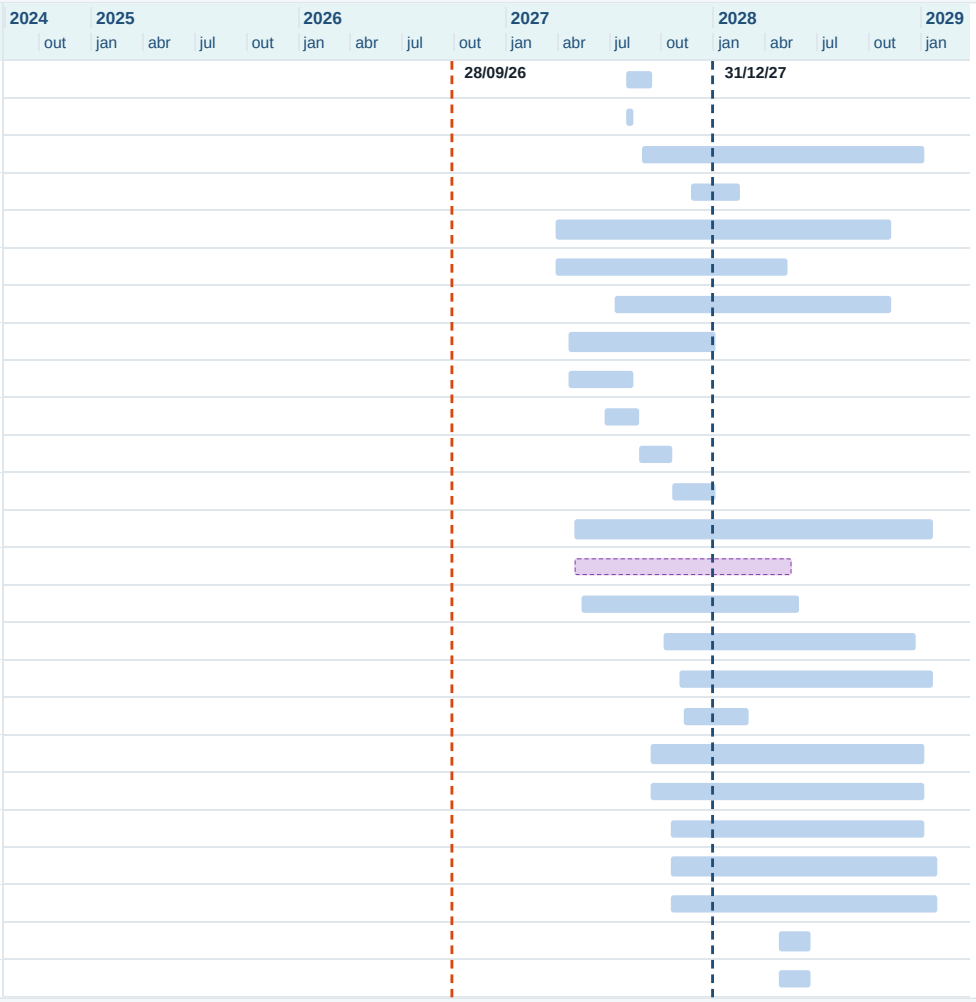

PACOTES NÃO DESCRITOS DE FORMA EXPRESSA NA CURVA DO PREVISION (42)

PL	Pacote	Nota
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**VIGA SOLTEIRA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: viga, solteira). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**VIGA INVERTIDA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: viga, invertida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**PISO ARMADO - SETOR B**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 28 – MARCENARIA.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**PISO ARMADO - SETOR C**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 28 – MARCENARIA.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**PISO ARMADO - SETOR A**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 28 – MARCENARIA.
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	**EXECUÇÃO DE MURO**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: muro). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**DRENAGEM**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: drenagem). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 25 – ELEVADORES.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**POÇO ARTESIANO**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: poco, artesiano). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 25 – ELEVADORES.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**GÁS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: gas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: shaft). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 28 – MARCENARIA.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**RAMAL DE ENTRADA - COPASA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: ramal, entrada, copasa). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**LIGAÇÃO COPASA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: ligacao, copasa). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 05 – LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ESGOTO, ENERGIA,TELEFONE, INTERNET; 34 – LOUÇAS E METAIS; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA.
ALVENARIA	**ESTUQUE - SETOR B**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: estuque). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS.
ALVENARIA	**ESTUQUE - SETOR C**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: estuque). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS.
ALVENARIA	**ESTUQUE - SETOR A**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: estuque). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS.
ALVENARIA	**TRATAMENTO DE SHAFTS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: tratamento, shafts). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
ALVENARIA	**TRATAMENTO ACÚSTICO**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: tratamento, acustico). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO.

PL	Pacote	Nota
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 1º QUADRANTE**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: enterrada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 2º QUADRANTE**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: enterrada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 3º QUADRANTE**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: enterrada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**DISJUNTORES / MIOLOS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: disjuntores, miolos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
JARDINEIRAS E PAISAGISMO	**CAMINHO DO CLIENTE**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: caminho, cliente). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 08 – FRETES E TRANSPORTES; 14 – TERRAPLENAGEM; 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA.
JARDINEIRAS E PAISAGISMO	**SISTEMA DE IRRIGAÇÃO**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: sistema). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS.
JARDINEIRAS E PAISAGISMO	**QUADRA DE TÊNIS E POLIESPORTIVA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: quadra, tenis, poliesportiva). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO.
JARDINEIRAS E PAISAGISMO	**PASSEIO**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: passeio). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 31 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO.
SEM PL (gestão / entrega)	**ÁREA DE VIVÊNCIA**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**ÁREA DE VIVÊNCIA + SALAS DE JOGOS**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**COMUNICAÇÃO VISUAL**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**CHECKLIST**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**ENXOVAL**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**MANUAL DE USO E OPERAÇÃO**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**HABITE-SE**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**AVCB**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
SEM PL (gestão / entrega)	**ENTREGA OBRA / CONDOMÍNIO**	Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL.
IMPERMEABILIZAÇÃO	**DRENO + ATERRO JARDINEIRAS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO (termo sem correspondência: dreno, aterro, jardineiras). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta).
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	**VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: ventilacao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	**CFTV**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: cftv). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	**EQUIPAMENTOS**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: equipamentos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 10 – MÃO DE OBRA PRÓPRIA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 14 – TERRAPLENAGEM.

PL	Pacote	Nota
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	**CARREGADOR VEICULAR / PORTA BOX**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: carregador, veicular, porta). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.
INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	**ACABAMENTOS INCÊNDIO**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO (termo sem correspondência: acabamentos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 10 – MÃO DE OBRA PRÓPRIA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.
ESQUADRIAS	**ESPALA ESQUADRIA DE ALUMINIO**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 26 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: espala). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES; 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA.
PINTURA	**MASSA CORRIDA**	Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: massa, corrida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS; 30 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES.

Fonte: aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (export do Prevision). Datas de início e término e % realizado vêm do Prevision; nos níveis PL e pacote o % é a média dos itens ponderada pela duração. O cronograma é o mesmo nos três cenários (os cenários mudam as curvas financeiras, não as datas das atividades).
