Ed Jardim · Esquemático de avanço por pavimento

Corte ilustrativo (sem escala): cada célula é o avanço da PL no pavimento, pelas atividades do cronograma do Prevision · passe o mouse numa célula para ver o detalhe

Concluído · Em andamento (50% a 99%) · Em andamento (1% a 49%) · A executar · Sem atividade da PL no pavimento

SITUAÇÃO EM 11/10/2026 (realizado do cronograma)

Pavimentos **28%** Infraestrutura **92%** Fachada **1%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. ACABAM.	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE																		1%	**0%**
28º LAJE TÉCNICA																			**0%**
27º DUPLEX SUPERIOR																			**0%**
26º DUPLEX INFERIOR																			**0%**
25º TIPO																			**0%**
24º TIPO																			**0%**
23º TIPO																			**0%**
22º TIPO																			**0%**
21º TIPO																			**0%**
20º TIPO																			**0%**
19º TIPO	32																		**1%**
18º TIPO	100																		**4%**
17º TIPO	100																		**4%**
16º TIPO	100																		**3%**
15º TIPO	100																		**5%**
14º TIPO	100																		**3%**
13º TIPO	100	17																	**8%**
12º TIPO	100	69																	**9%**
11º TIPO	100	74									40								**12%**
10º TIPO	100	97		11							63								**20%**
9º TIPO	100	46						3											**9%**
8º TIPO	100	36						3											**8%**
7º TIPO	100	98		12				6			99								**18%**
6º TIPO	100	98		22				8			32								**18%**
5º TIPO	100	99	2					10			32								**19%**
4º APTO GARDEN	99	66						7											**46%**
3º PILOTIS	100	98	45	35			35				84					26	4		**44%**
2º GARAGEM	99	100		62	15						96								**75%**
TÉRREO	100	94		62	36					60	49								**61%**
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 92%**																		
% da PL	**90**	**72**	**15**	**23**	**9**	**0**	**7**	**1**	**0**	**12**	**53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**1**		**28%**


MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2026

Pavimentos **35%** Infraestrutura **94%** Fachada **28%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. ACABAM.	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE																		28%	0%
28º LAJE TÉCNICA																			0%
27º DUPLEX SUPERIOR																			0%
26º DUPLEX INFERIOR																			0%
25º TIPO																			0%
24º TIPO																			0%
23º TIPO	100																		2%
22º TIPO	100																		4%
21º TIPO	100																		3%
20º TIPO	100																		3%
19º TIPO	100																		4%
18º TIPO	100																		4%
17º TIPO	100	63																	8%
16º TIPO	100	69				68													9%
15º TIPO	100	73																	9%
14º TIPO	100	69																	7%
13º TIPO	100	24																	8%
12º TIPO	100	69																	9%
11º TIPO	100	74		24							40								16%
10º TIPO	100	97		30		68					63								25%
9º TIPO	100	72						3											11%
8º TIPO	100	77						3											11%
7º TIPO	100	98		34		59		6			99								23%
6º TIPO	100	98		28	23	63		33			100								28%
5º TIPO	100	99	2	27	28			10			32								25%
4º APTO GARDEN	100	87		23	28	67		7			36								54%
3º PILOTIS	100	98	76	48	91	21	35	17		41	96					51	4		58%
2º GARAGEM	100	100		64	50	60					100								77%
TÉRREO	100	99		83	63	11				61	93								72%
Infraestrutura	Contenção, terraplenagem e fundações: 94%																		
% da PL	**95**	**79**	**26**	**33**	**29**	**16**	**7**	**5**	**0**	**25**	**64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**1**		**35%**

RETRATO: PREVISÃO PARA 31/12/2027

Pavimentos **70%** Infraestrutura **100%** Fachada **89%**

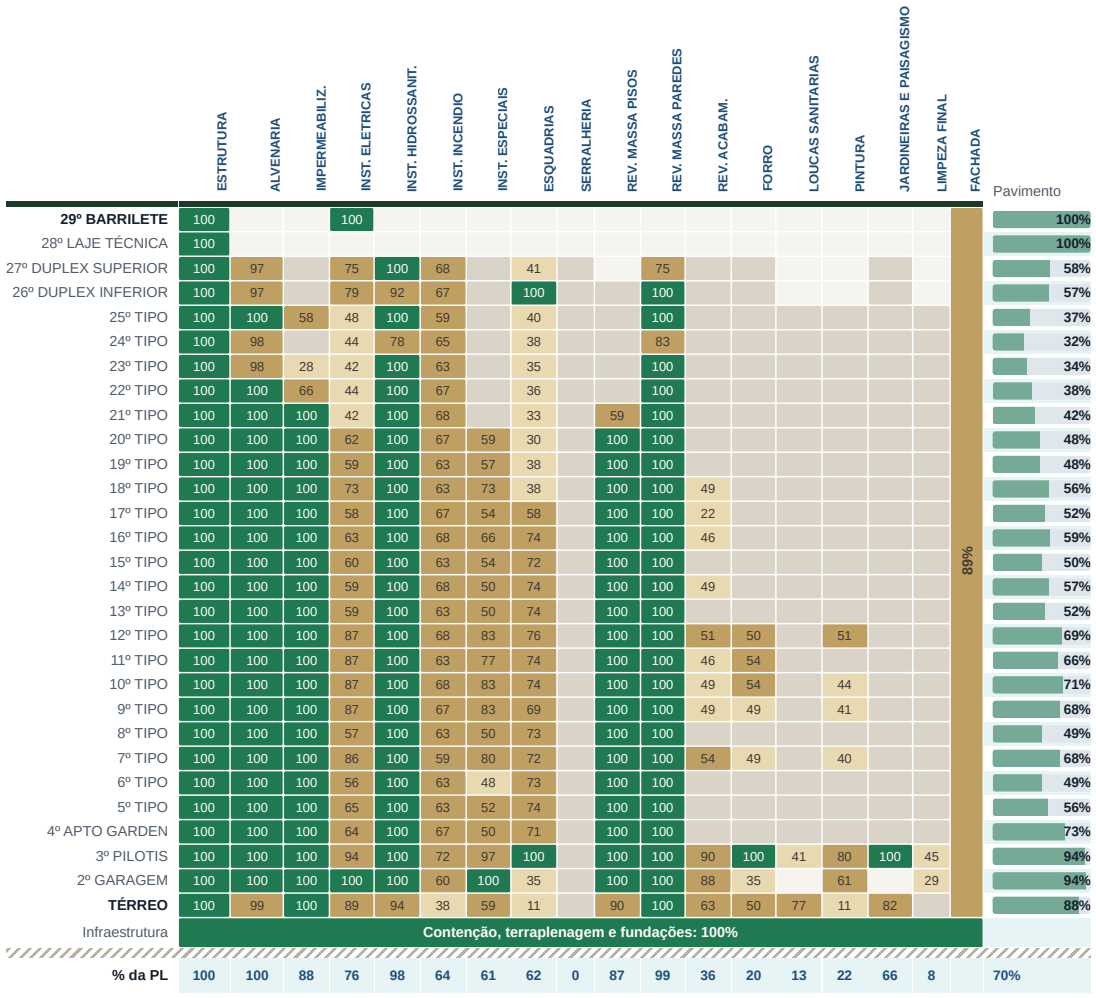

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. ACABAM.	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100														89%	**100%**
28º LAJE TÉCNICA	100																		**100%**
27º DUPLEX SUPERIOR	100	97		75	100	68		41			75								**58%**
26º DUPLEX INFERIOR	100	97		79	92	67		100			100								**57%**
25º TIPO	100	100	58	48	100	59		40			100								**37%**
24º TIPO	100	98		44	78	65		38			83								**32%**
23º TIPO	100	98	28	42	100	63		35			100								**34%**
22º TIPO	100	100	66	44	100	67		36			100								**38%**
21º TIPO	100	100	100	42	100	68		33		59	100								**42%**
20º TIPO	100	100	100	62	100	67	59	30		100	100								**48%**
19º TIPO	100	100	100	59	100	63	57	38		100	100								**48%**
18º TIPO	100	100	100	73	100	63	73	38		100	100	49							**56%**
17º TIPO	100	100	100	58	100	67	54	58		100	100	22							**52%**
16º TIPO	100	100	100	63	100	68	66	74		100	100	46							**59%**
15º TIPO	100	100	100	60	100	63	54	72		100	100								**50%**
14º TIPO	100	100	100	59	100	68	50	74		100	100	49							**57%**
13º TIPO	100	100	100	59	100	63	50	74		100	100								**52%**
12º TIPO	100	100	100	87	100	68	83	76		100	100	51	50		51				**69%**
11º TIPO	100	100	100	87	100	63	77	74		100	100	46	54						**66%**
10º TIPO	100	100	100	87	100	68	83	74		100	100	49	54		44				**71%**
9º TIPO	100	100	100	87	100	67	83	69		100	100	49	49		41				**68%**
8º TIPO	100	100	100	57	100	63	50	73		100	100								**49%**
7º TIPO	100	100	100	86	100	59	80	72		100	100	54	49		40				**68%**
6º TIPO	100	100	100	56	100	63	48	73		100	100								**49%**
5º TIPO	100	100	100	65	100	63	52	74		100	100								**56%**
4º APTO GARDEN	100	100	100	64	100	67	50	71		100	100								**73%**
3º PILOTIS	100	100	100	94	100	72	97	100		100	100	90	100	41	80	100	45		**94%**
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	60	100	35		100	100	88	35		61		29		**94%**
TÉRREO	100	99	100	89	94	38	59	11		90	100	63	50	77	11	82			**88%**
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 100%**																		
% da PL	**100**	**100**	**88**	**76**	**98**	**64**	**61**	**62**	**0**	**87**	**99**	**36**	**20**	**13**	**22**	**66**	**8**		**70%**

Pavimentos: nº na coluna N da aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (lote do Prevision). PLs com atividades em pelo menos 3 pavimentos; infraestrutura = contenção, terraplenagem, fundação profunda, fundação superficial; fachada = revestimento diversos fachada (lotes sem pavimento). Previsão: o saldo de cada tarefa segue linear da data da situação (ou do início planejado) até o término planejado. Esquema ilustrativo, sem escala, não substitui o levantamento em campo.
