
# Ed Jardim · Gantt do cronograma


2.291 atividades do Prevision (situação em 19/10/26) · PL → pacote de trabalho → pavimento/tarefa · clique na seta para abrir

Planejado (início → término) · Realizado (% do Prevision) · Concluído · **Não descrito de forma expressa na curva do Prevision** (notas na última página) · Previsto para a data (atraso > 5 p.p.) · Situação 19/10/26 · 31/12/2027


| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▼ SERVIÇOS INICIAIS | 01/08/24 | 12/02/27 | 80% |
| DEMOLIÇÃO FASE 1 | 01/08/24 | 25/09/24 | 100% |
| DEMOLIÇÃO BALTAZAR | 29/01/27 | 12/02/27 | 0% |
| ▼ TERRAPLENAGEM | 12/08/24 | 22/04/27 | 74% |
| ► TERRAPLENAGEM | 12/08/24 | 22/04/27 | 74% |
| ► RETIRADA DE TERRA DE FUNDAÇÃO(BOTA F… | 28/04/25 | 02/05/25 | 100% |
| ▼ CONTENÇÃO | 21/10/24 | 28/11/25 | 100% |
| ► CONTENÇÃO | 21/10/24 | 28/11/25 | 100% |
| ▼ FUNDAÇÃO PROFUNDA | 19/02/25 | 16/05/25 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO PROFUNDA | 19/02/25 | 16/05/25 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO PROFUNDA - TRECHO A | 28/04/25 | 16/05/25 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO PROFUNDA - TRECHO C | 05/05/25 | 09/05/25 | 100% |
| ▼ FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | 28/04/25 | 12/09/25 | 97% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - TRECHO B | 28/04/25 | 28/07/25 | 95% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - TRECHO C - N948 | 28/04/25 | 12/09/25 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - TRECHO C - N941 | 05/05/25 | 10/07/25 | 88% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | 14/05/25 | 12/09/25 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - TRECHO A (2º ETA… | 22/07/25 | 25/07/25 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - TRECHO A (4º ETA… | 24/07/25 | 27/08/25 | 100% |
| ► FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - TRECHO A (ETAPA … | 01/09/25 | 12/09/25 | 100% |
| ▼ ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 6 inferidos | 19/05/25 | 29/10/27 | 74% |

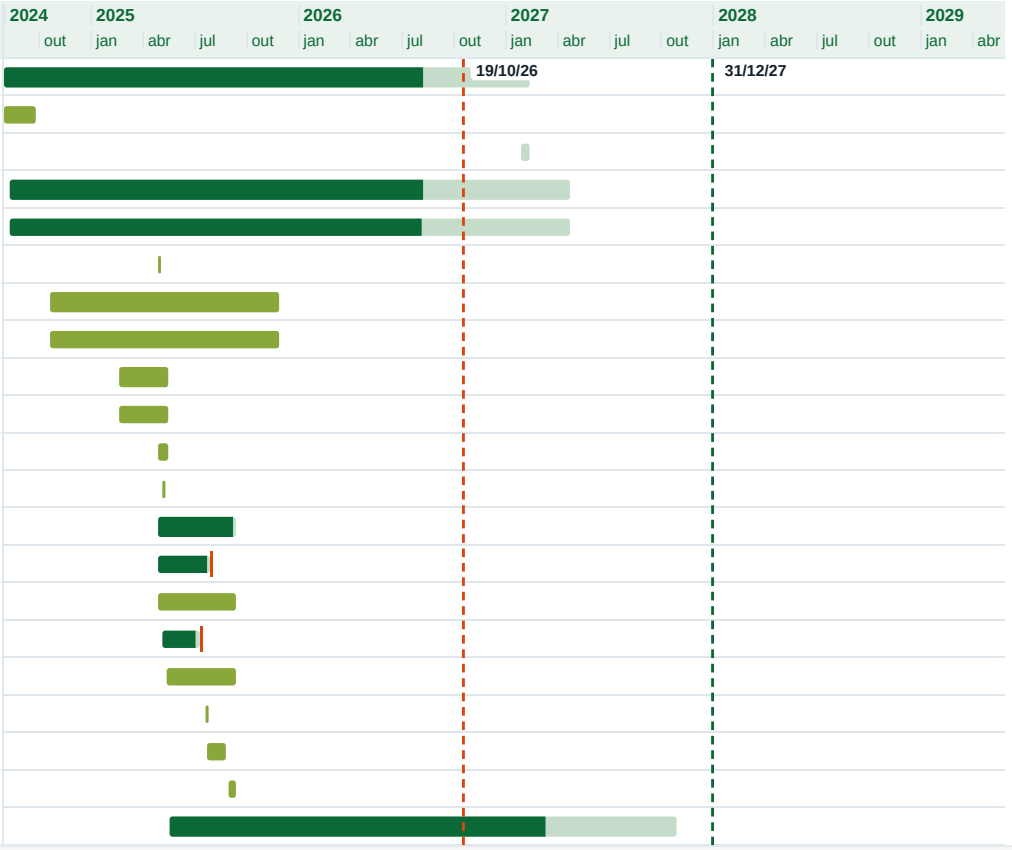


| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ESTRUTURA EMBASAMENTO B | 19/05/25 | 10/10/25 | 100% |
| ESTRUTURA EMBASAMENTO B - MEDIÇÃO | 19/05/25 | 10/10/25 | 100% |
| ESTRUTURA TORRE A | 01/09/25 | 15/10/25 | 100% |
| ESTRUTURA TORRE | 15/09/25 | 06/04/27 | 70% |
| ESTRUTURA EMBASAMENTO C | 07/10/25 | 19/02/26 | 100% |
| ESTRUTURA EMBASAMENTO C - MEDIÇÃO | 07/10/25 | 17/02/26 | 100% |
| ESTRUTURA TORRE A - LOOKAHEAD | 03/11/25 | 28/11/25 | 100% |
| ESTRUTURA TORRE - GARDEN - LOOKAEHAD | 26/11/25 | 19/12/25 | 100% |
| VIGA SOLTEIRA | 05/01/26 | 23/02/26 | 100% |
| VIGA INVERTIDA | 05/01/26 | 14/01/26 | 100% |
| VIGAS V31, V403 E V405 - TERRAÇO SALÃO D… | 19/03/26 | 30/04/26 | 100% |
| PISO ARMADO - SETOR B | 17/06/26 | 17/07/26 | 100% |
| PISO ARMADO - SETOR C | 20/07/26 | 14/08/26 | 100% |
| PISO ARMADO - SETOR A | 17/08/26 | 31/08/26 | 100% |
| EXECUÇÃO DE MURO | 15/02/27 | 29/10/27 | 0% |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (6 inferidos) | 01/08/25 | 16/03/28 | 8% |
| DRENAGEM | 01/08/25 | 03/10/25 | 100% |
| RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE REUSO | 02/03/26 | 31/03/26 | 100% |
| POÇO ARTESIANO | 16/03/26 | 17/07/26 | 100% |
| PRUMADA HIDROSSANITÁRIA | 10/08/26 | 20/10/27 | 3% |
| DISTRIBUIÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 24/08/26 | 14/10/27 | 0% |
| GÁS | 01/09/26 | 30/11/27 | 0% |
| DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - SETOR B | 08/09/26 | 07/10/26 | 0% |
| SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS | 16/09/26 | 20/01/28 | 0% |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 25/09/26 | 16/03/28 | 0% |
| DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - SETOR C | 19/10/26 | 18/11/26 | 0% |
| DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - SETOR A | 19/11/26 | 04/01/27 | 0% |
| RESERVATÓRIO - CAIXA DE DETENÇÃO | 23/04/27 | 26/07/27 | 0% |
| RESERVATÓRIOS / BOILERS | 22/06/27 | 12/07/27 | 0% |
| RAMAL DE ENTRADA - COPASA | 01/07/27 | 01/10/27 | 0% |

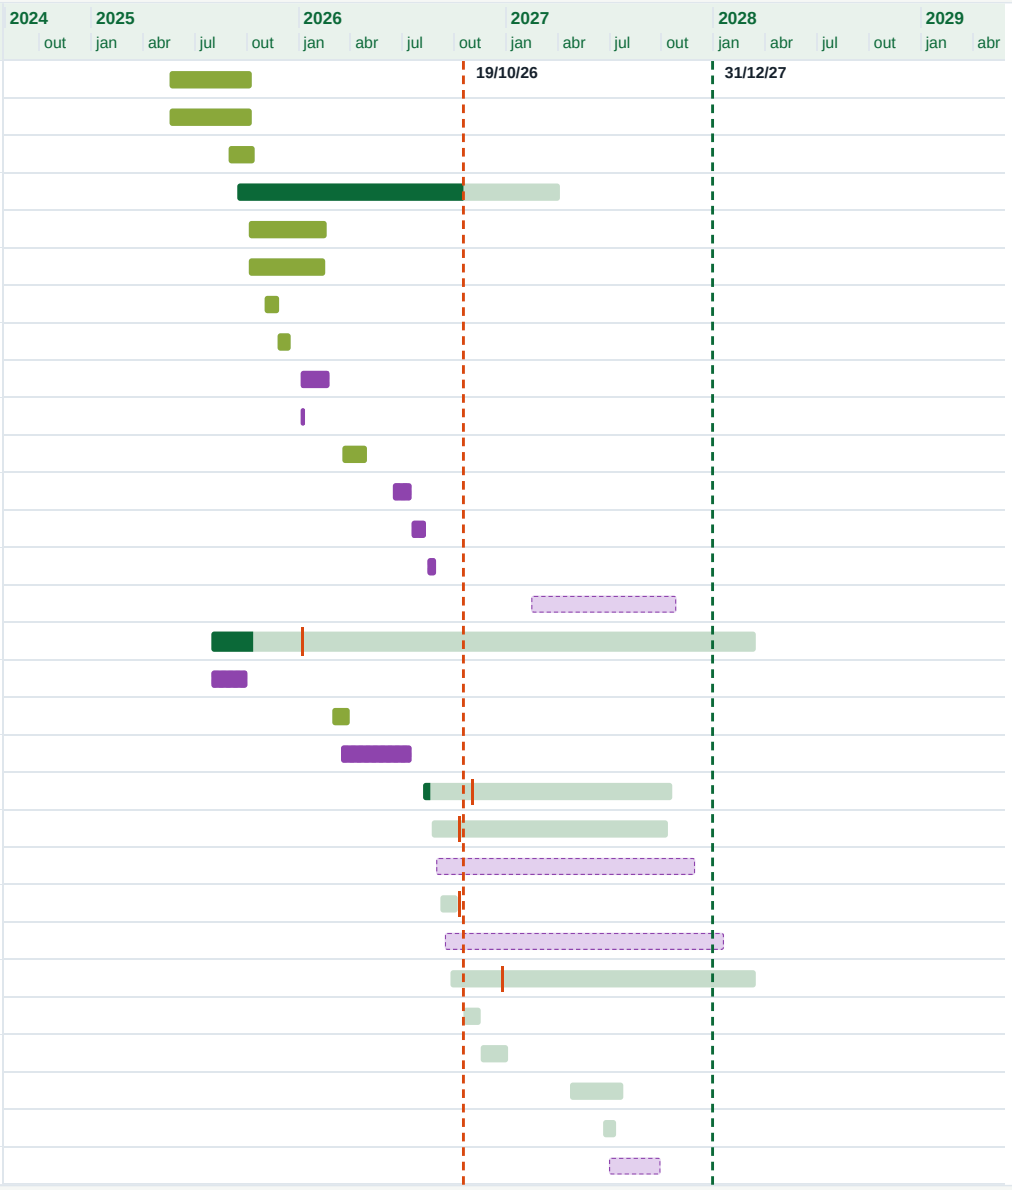


| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÃO COPASA | 02/07/27 | 05/11/27 | 0% |
| ALVENARIA (5 inferidos) | 03/11/25 | 02/03/28 | 60% |
| ALVENARIA BLOCO CHEIO + ACERTO DE TAL… | 03/11/25 | 28/11/25 | 100% |
| ESTUQUE - SETOR B | 10/11/25 | 17/07/26 | 100% |
| ALVENARIA - POSTERIOR E LATERAL ESQUER… | 03/12/25 | 19/06/26 | 100% |
| ALVENARIA FECHAMENTO POSTERIOR C | 25/02/26 | 04/03/26 | 100% |
| ESTUQUE - SETOR C | 02/03/26 | 24/08/26 | 100% |
| ALVENARIA RAMPA B | 05/03/26 | 16/03/26 | 100% |
| ALVENARIA FECHAMENTO LATERAL - SETOR C | 05/03/26 | 19/03/26 | 100% |
| ESTUQUE - SETOR A | 09/03/26 | 31/07/26 | 100% |
| ALVENARIA - SETOR B | 16/03/26 | 04/09/26 | 100% |
| ALVENARIA CASA MAQUINAS A | 17/03/26 | 27/03/26 | 100% |
| ALVENARIA ÁREA SOCIAL | 20/03/26 | 31/07/26 | 100% |
| ALVENARIA | 23/03/26 | 02/03/28 | 48% |
| ALVENARIA EXTERNA | 06/05/26 | 30/04/27 | 75% |
| TRATAMENTO DE SHAFTS | 10/08/26 | 30/10/26 | 29% |
| ALVENARIA - SETOR C | 08/09/26 | 07/10/26 | 95% |
| ENCUNHAMENTO | 08/10/26 | 30/11/27 | 18% |
| ALVENARIA - SETOR A | 19/10/26 | 18/11/26 | 0% |
| TRATAMENTO ACÚSTICO | 22/02/27 | 03/02/28 | 0% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (4 inferidos) | 29/01/26 | 26/03/29 | 17% |
| ENTRADA DE ENERGIA | 29/01/26 | 05/06/26 | 100% |
| RAMAL DE ENTRADA - CEMIG | 16/02/26 | 05/06/26 | 100% |
| INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 1º QUAD… | 01/04/26 | 16/06/26 | 99% |
| INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - TETO | 01/06/26 | 17/11/27 | 15% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS - SET… | 01/06/26 | 29/06/26 | 100% |
| INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 2º QUAD… | 17/06/26 | 10/07/26 | 100% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS - SET… | 30/06/26 | 21/07/26 | 100% |
| INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 3º QUAD… | 06/07/26 | 30/07/26 | 100% |
| INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - PAREDES | 13/07/26 | 29/03/28 | 4% |

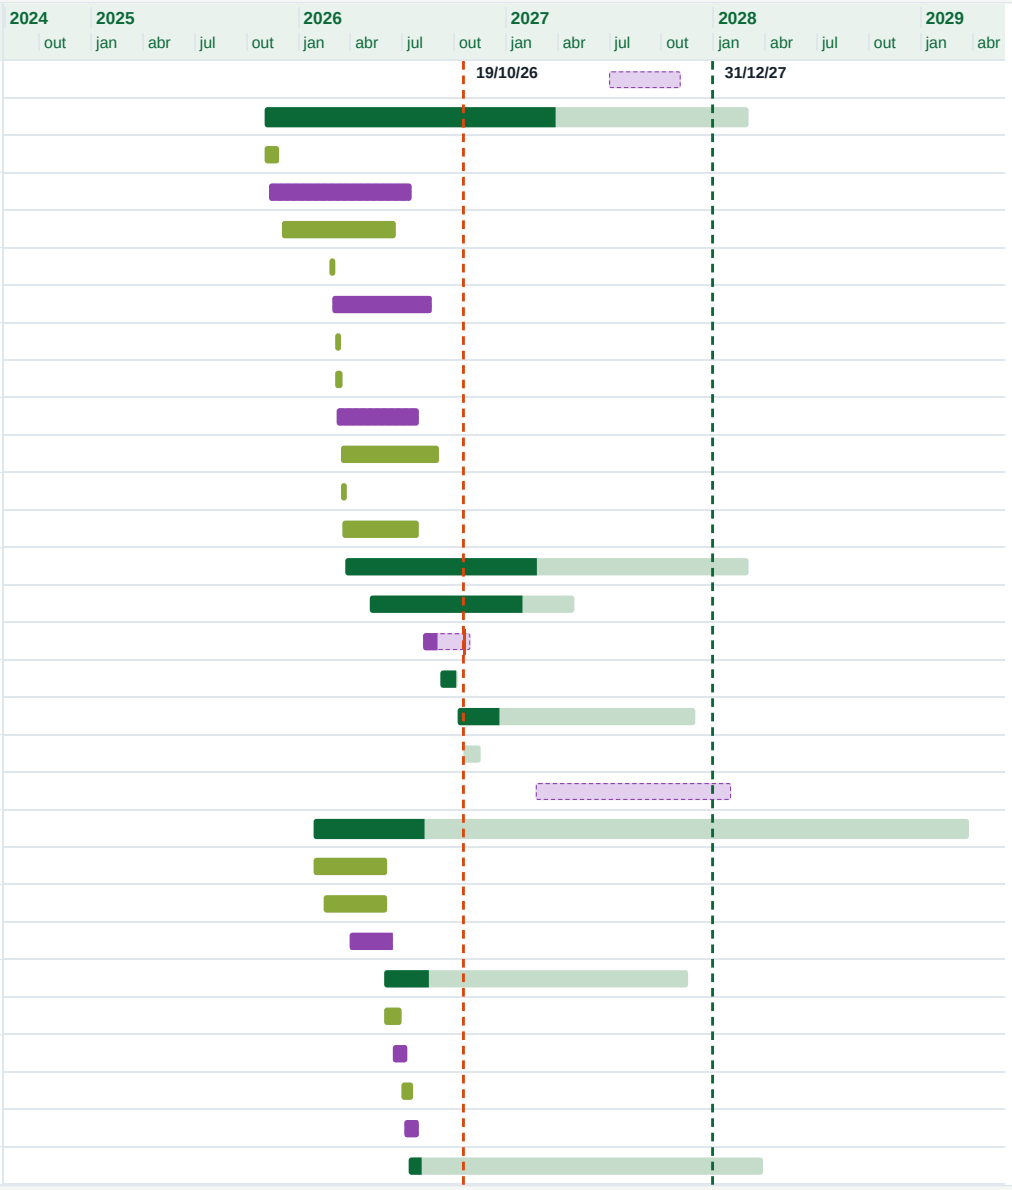


| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▸ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS - SET… | 22/07/26 | 18/08/26 | 100% |
| ▸ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (TETO) - SETOR B | 03/08/26 | 15/09/26 | 100% |
| ▸ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO - SETOR B | 04/08/26 | 17/11/27 | 19% |
| ▸ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 24/08/26 | 16/03/28 | 26% |
| ▸ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (TETO) - SETOR C | 16/09/26 | 16/10/26 | 82% |
| ▸ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO - SETOR C | 19/10/26 | 18/11/26 | 0% |
| ▸ INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (TETO) - SETOR A | 19/10/26 | 18/11/26 | 0% |
| ▸ DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA / QUADRO - SETOR A | 19/11/26 | 10/12/26 | 0% |
| ▸ PRUMADA ELÉTRICA INFRA | 10/12/26 | 28/10/27 | 0% |
| ▸ FIAÇÃO ELÉTRICA | 10/02/27 | 27/09/28 | 0% |
| CAIXAS DE PASSAGEM | 07/04/27 | 01/07/27 | 0% |
| ▸ DISJUNTORES / MIOLOS ⓘ | 20/09/27 | 15/01/29 | 0% |
| ▸ SPDA | 24/09/27 | 22/10/27 | 0% |
| ▸ ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 07/10/27 | 26/03/29 | 0% |
| PRUMADA ELÉTRICA CABOS | 07/01/28 | 07/04/28 | 0% |
| ▸ GERADOR | 11/01/28 | 17/01/28 | 0% |
| ▾ JARDINEIRAS E PAISAGISMO (4 inferidos) | 02/02/26 | 29/01/29 | 22% |
| ▸ PAISAGISMO | 02/02/26 | 29/01/29 | 19% |
| ▸ CAMINHO DO CLIENTE ⓘ | 08/05/26 | 04/09/26 | 100% |
| ▸ SISTEMA DE IRRIGAÇÃO ⓘ | 04/01/27 | 22/04/27 | 0% |
| ▸ QUADRA DE TÊNIS E POLIESPORTIVA ⓘ | 10/03/27 | 13/08/27 | 0% |
| ▸ PASSEIO ⓘ | 10/02/28 | 06/03/28 | 0% |
| ▾ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES | 02/03/26 | 12/01/28 | 44% |
| ▸ REBOCO - SETOR B | 02/03/26 | 21/10/26 | 84% |
| ▸ REBOCO - SETOR C | 01/04/26 | 23/11/26 | 58% |
| ▸ REBOCO INTERNO | 04/05/26 | 12/01/28 | 49% |
| ▸ REBOCO - SETOR A | 25/05/26 | 11/01/27 | 10% |
| ▸ REVESTIMENTO DE MASSA | 03/08/26 | 30/09/26 | 100% |
| ▸ TALISCAMENTO | 03/08/26 | 03/11/27 | 21% |
| ▾ LIMPEZA FINAL DE OBRA | 16/03/26 | 24/04/29 | 0% |

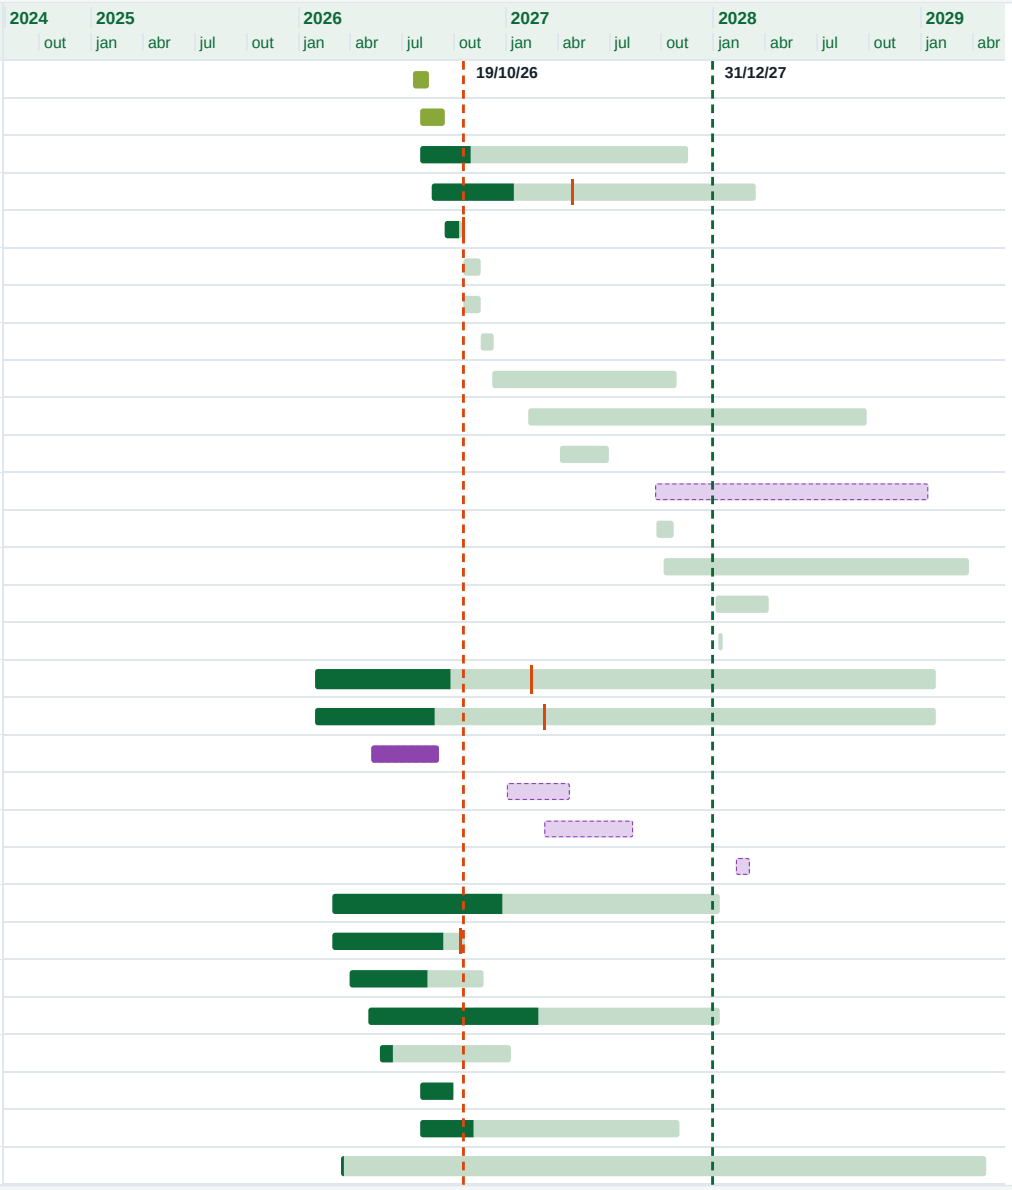


| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▸ LIMPEZA DE ETULHO E MADEIRA - SETOR B | 16/03/26 | 20/03/26 | 100% |
| ▸ LIMPEZA GROSSA | 27/10/27 | 05/03/29 | 0% |
| ▸ LIMPEZA FINA | 16/12/27 | 24/04/29 | 0% |
| ▸ LIMPEZA FACHADA | 20/03/28 | 23/05/28 | 0% |
| ▾ SEM PL (gestão / entrega) 9 inferidos | 04/05/26 | 30/04/29 | 6% |
| ▸ ÁREA DE VIVÊNCIA | 04/05/26 | 15/06/26 | 100% |
| ▸ ÁREA DE VIVÊNCIA + SALAS DE JOGOS | 06/07/26 | 14/08/26 | 100% |
| ▸ COMUNICAÇÃO VISUAL | 25/11/27 | 18/04/29 | 0% |
| ENXOVAL | 07/12/27 | 24/04/28 | 0% |
| MANUAL DE USO E OPERAÇÃO | 05/01/28 | 03/02/28 | 0% |
| ▸ CHECKLIST | 13/01/28 | 30/04/29 | 0% |
| HABITE-SE | 07/03/28 | 24/04/28 | 0% |
| AVCB | 17/03/28 | 24/04/28 | 0% |
| ENTREGA OBRA / CONDOMÍNIO | 25/04/28 | 19/05/28 | 0% |
| ▾ REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS | 17/06/26 | 13/04/28 | 12% |
| ▸ CONTRAPISO | 17/06/26 | 13/04/28 | 12% |
| ▾ IMPERMEABILIZAÇÃO 1 inferido | 13/07/26 | 02/03/28 | 11% |
| ▸ REGULARIZAÇÃO DE PISO PARA IMPERMEABI… | 13/07/26 | 22/09/26 | 92% |
| ▸ IMPERMEABILIZAÇÃO | 24/08/26 | 23/08/27 | 27% |
| ▸ IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | 09/02/27 | 02/02/28 | 0% |
| ▸ IMPERMEABILIZAÇÃO VARANDA E JARDINEIR… | 23/02/27 | 16/02/28 | 0% |
| ▸ DRENO + ATERRO JARDINEIRAS | 08/03/27 | 02/03/28 | 0% |
| ▾ INSTALAÇÕES ESPECIAIS 4 inferidos | 10/08/26 | 15/01/29 | 5% |
| ▸ PISCINA | 10/08/26 | 28/05/27 | 35% |
| ▸ AR CONDICIONADO | 12/03/27 | 22/10/27 | 0% |
| ▸ INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | 05/04/27 | 31/03/28 | 0% |
| ▸ VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO | 09/06/27 | 13/09/28 | 0% |
| ▸ COMUNICAÇÃO E ALARME | 27/09/27 | 11/01/28 | 0% |
| ▸ EQUIPAMENTOS | 30/11/27 | 10/01/28 | 0% |
| ▸ CARREGADOR VEICULAR / PORTA BOX | 06/12/27 | 17/03/28 | 0% |

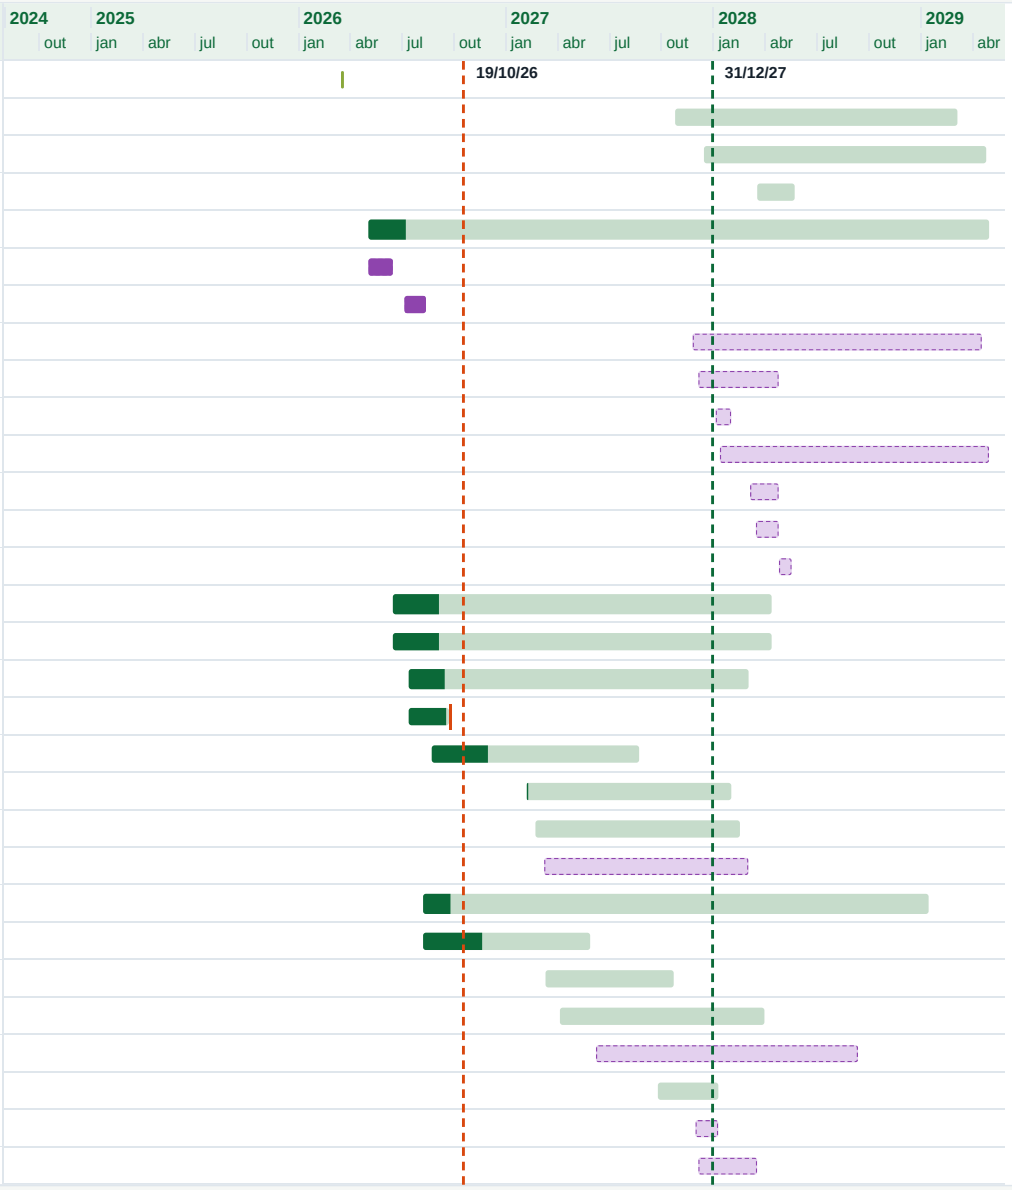

| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▸ CFTV | 21/02/28 | 15/01/29 | 0% |
| ▾ REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA | 24/09/26 | 17/03/28 | 1% |
| ▸ FACHADA POSTERIOR - F1 (A) | 24/09/26 | 06/01/27 | 5% |
| ▸ FACHADA FRONTAL - F1 (C) | 14/01/27 | 02/06/27 | 0% |
| ▸ FACHADA BALTAZAR - F1 (D) | 18/03/27 | 22/04/27 | 0% |
| ▸ FACHADA JAIRO - F1 (B) | 07/05/27 | 05/07/27 | 0% |
| ▸ FACHADA POSTERIOR - F2 (A) | 24/05/27 | 08/10/27 | 0% |
| ▸ FACHADA JAIRO - F2 (B) | 11/06/27 | 09/09/27 | 0% |
| ▸ FACHADA FRONTAL - F2 (C) | 23/07/27 | 06/01/28 | 0% |
| ▸ FACHADA BALTAZAR - F2 (D) | 17/09/27 | 07/10/27 | 0% |
| ▸ TEXTURA | 11/10/27 | 02/02/28 | 0% |
| ▸ FACHADA CREMALHEIRA | 20/10/27 | 17/03/28 | 0% |
| ▸ REBOCO EXTERNO | 05/01/28 | 01/02/28 | 0% |
| ▾ INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO 1 inferido | 28/09/26 | 26/03/29 | 0% |
| ▸ PRUMADA DE INCÊNDIO | 28/09/26 | 20/10/27 | 0% |
| ▸ ACABAMENTOS INCÊNDIO | 21/06/27 | 26/03/29 | 0% |
| ▾ ESQUADRIAS 1 inferido | 26/10/26 | 11/12/28 | 1% |
| ▸ CONTRAMARCO | 26/10/26 | 30/11/27 | 6% |
| ▸ ESPALA ESQUADRIA DE ALUMINIO | 27/11/26 | 24/11/27 | 0% |
| ▸ ESQUADRIA | 12/04/27 | 30/06/28 | 0% |
| ▸ ESQUADRIA MADEIRA | 14/09/27 | 11/12/28 | 0% |
| ▾ REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO | 11/01/27 | 19/02/29 | 0% |
| ▸ REVESTIMENTOS PORCELANATO PISO | 11/01/27 | 24/02/27 | 0% |
| ▸ REVESTIMENTO PAREDE | 19/02/27 | 08/08/28 | 0% |
| ▸ REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE | 25/02/27 | 29/03/27 | 0% |
| ▸ REVESTIMENTOS PISO | 14/04/27 | 22/08/28 | 0% |
| ▸ BANCADAS | 17/05/27 | 05/09/28 | 0% |
| ▸ POLIMENTO PISO | 28/07/27 | 18/10/27 | 0% |
| ▸ DECK | 16/08/27 | 27/09/27 | 0% |
| ▸ PISO VINÍLICO / LAMINADO | 30/08/27 | 13/09/27 | 0% |

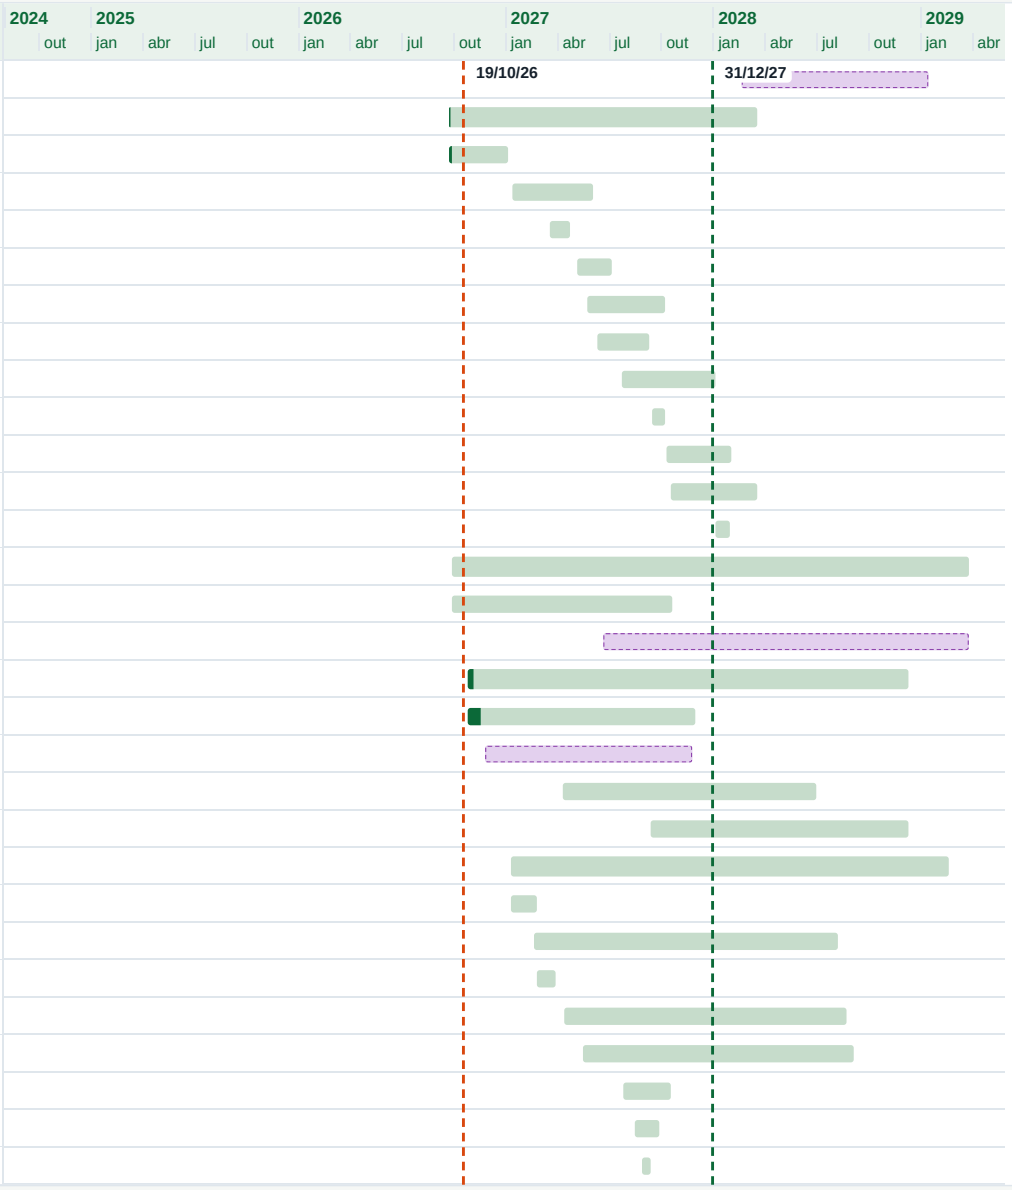

| PL / pacote / pavimento | Início | Término | Real. |
|---|---|---|---|
| ▸ RODAPÉ MADEIRA / PVC | 28/09/27 | 08/01/29 | 0% |
| ▸ PISO MADEIRA / LAMINADO | 10/11/27 | 27/11/28 | 0% |
| ▸ PISO ELEVADO / EXTERNO | 24/11/27 | 18/02/28 | 0% |
| ▸ TRATAMENTO DE GRANITO/MÁRMORE | 06/03/28 | 19/02/29 | 0% |
| ▾ ELEVADORES | 20/04/27 | 06/01/28 | 0% |
| ▸ PREPARAÇÃO POÇO ELEVADOR | 20/04/27 | 12/08/27 | 0% |
| ▸ ELEVADOR 1 | 23/06/27 | 23/08/27 | 0% |
| ▸ ELEVADOR 2 | 24/08/27 | 20/10/27 | 0% |
| ▸ ELEVADOR 3 | 21/10/27 | 06/01/28 | 0% |
| ▾ FORRO | 29/04/27 | 18/12/28 | 0% |
| ▸ FORRO | 29/04/27 | 19/10/28 | 0% |
| ▸ FORRO DE MADEIRA | 28/02/28 | 18/12/28 | 0% |
| ▾ PINTURA 1 inferido | 21/07/27 | 10/04/29 | 0% |
| ▸ MASSA CORRIDA ⓘ | 21/07/27 | 30/10/28 | 0% |
| ▸ PINTURA 1º DEMÃO | 30/07/27 | 10/11/28 | 0% |
| ▸ PINTURA 2º DEMÃO | 11/11/27 | 19/03/29 | 0% |
| ▸ PINTURA VAGAS | 12/11/27 | 03/03/28 | 0% |
| ▸ PINTURA 3º DEMÃO | 09/12/27 | 10/04/29 | 0% |
| ▾ LOUÇAS SANITÁRIAS | 13/10/27 | 26/03/29 | 0% |
| ▸ LOUÇAS | 13/10/27 | 26/03/29 | 0% |
| ▸ METAIS | 26/11/27 | 26/03/29 | 0% |
| ▾ SERRALHERIA | 24/01/28 | 26/03/29 | 0% |
| ▸ SERRALHERIA | 24/01/28 | 26/03/29 | 0% |
| ▾ ESTRUTURA METÁLICA | 25/04/28 | 21/06/28 | 0% |
| ▸ COBERTURA | 25/04/28 | 21/06/28 | 0% |

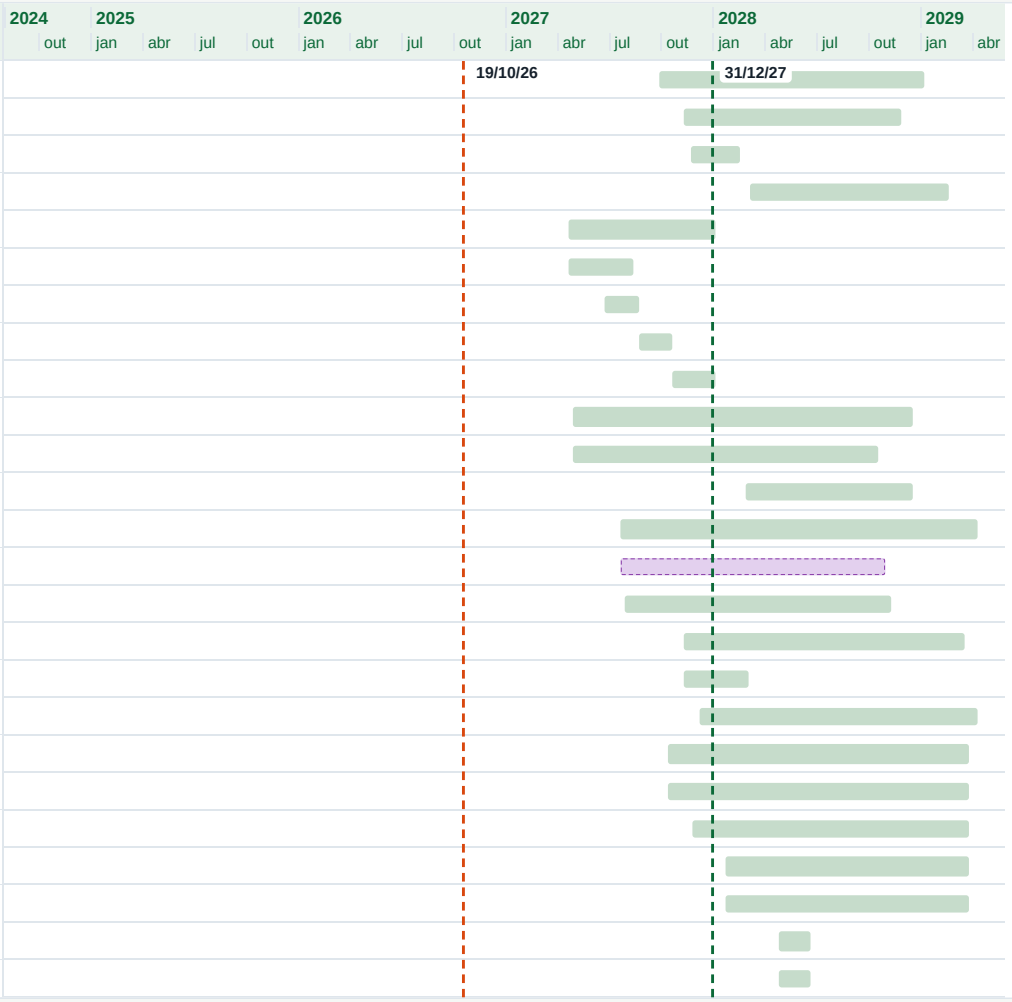

## PACOTES NÃO DESCRITOS DE FORMA EXPRESSA NA CURVA DO PREVISION (42)

| PL | Pacote | Nota |
|---|---|---|
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **VIGA SOLTEIRA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: viga, solteira). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **VIGA INVERTIDA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: viga, invertida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **PISO ARMADO - SETOR B** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 28 – MARCENARIA. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **PISO ARMADO - SETOR C** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 28 – MARCENARIA. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **PISO ARMADO - SETOR A** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: piso). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS; 28 – MARCENARIA. |
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | **EXECUÇÃO DE MURO** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO (termo sem correspondência: muro). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **DRENAGEM** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: drenagem). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 25 – ELEVADORES. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **POÇO ARTESIANO** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: poco, artesiano). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 25 – ELEVADORES. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **GÁS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: gas). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **SHAFT INTERNO INST. HIDRAÚLICAS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: shaft). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 28 – MARCENARIA. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **RAMAL DE ENTRADA - COPASA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: ramal, entrada, copasa). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | **LIGAÇÃO COPASA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (termo sem correspondência: ligacao, copasa). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 05 – LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ESGOTO, ENERGIA,TELEFONE, INTERNET; 34 – LOUÇAS E METAIS; 37 – LIMPEZA FINAL DE OBRA. |
| ALVENARIA | **ESTUQUE - SETOR B** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: estuque). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS. |
| ALVENARIA | **ESTUQUE - SETOR C** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: estuque). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS. |
| ALVENARIA | **ESTUQUE - SETOR A** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: estuque). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 35 – PINTURAS. |
| ALVENARIA | **TRATAMENTO DE SHAFTS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: tratamento, shafts). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |
| ALVENARIA | **TRATAMENTO ACÚSTICO** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 19 – ALVENARIA (termo sem correspondência: tratamento, acustico). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 13 – CONTENÇÕES; 17 – ESTRUTURA EM CONCRETO; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |

| PL | Pacote | Nota |
|---|---|---|
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | **INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 1º QUADRANTE** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: enterrada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | **INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 2º QUADRANTE** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: enterrada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | **INFRAESTRUTURA ENTERRADA - 3º QUADRANTE** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: enterrada). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | **DISJUNTORES / MIOLOS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (termo sem correspondência: disjuntores, miolos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| JARDINEIRAS E PAISAGISMO | **CAMINHO DO CLIENTE** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: caminho, cliente). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 08 – FRETES E TRANSPORTES; 14 – TERRAPLENAGEM; 15 – FUNDAÇÃO PROFUNDA. |
| JARDINEIRAS E PAISAGISMO | **SISTEMA DE IRRIGAÇÃO** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: sistema). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS. |
| JARDINEIRAS E PAISAGISMO | **QUADRA DE TÊNIS E POLIESPORTIVA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: quadra, tenis, poliesportiva). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO. |
| JARDINEIRAS E PAISAGISMO | **PASSEIO** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 36 – JARDINEIRAS E PAISAGISMO (termo sem correspondência: passeio). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 31 – REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **ÁREA DE VIVÊNCIA** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **ÁREA DE VIVÊNCIA + SALAS DE JOGOS** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **COMUNICAÇÃO VISUAL** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **ENXOVAL** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **MANUAL DE USO E OPERAÇÃO** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **CHECKLIST** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **HABITE-SE** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **AVCB** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| SEM PL (gestão / entrega) | **ENTREGA OBRA / CONDOMÍNIO** | Pacote sem PL correspondente no orçamento/Prevision (atividade de gestão ou entrega): não entra em nenhuma curva de PL. |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | **DRENO + ATERRO JARDINEIRAS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO (termo sem correspondência: dreno, aterro, jardineiras). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS | **VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: ventilacao). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 22 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS | **EQUIPAMENTOS** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: equipamentos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 10 – MÃO DE OBRA PRÓPRIA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 14 – TERRAPLENAGEM. |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS | **CARREGADOR VEICULAR / PORTA BOX** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: carregador, veicular, porta). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS. |

| PL | Pacote | Nota |
|---|---|---|
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS | **CFTV** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 24 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS (termo sem correspondência: cftv). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. |
| INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO | **ACABAMENTOS INCÊNDIO** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 23 – INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO (termo sem correspondência: acabamentos). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 04 – BARRACAO DE OBRA; 10 – MÃO DE OBRA PRÓPRIA; 11 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS. |
| ESQUADRIAS | **ESPALA ESQUADRIA DE ALUMINIO** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 26 – ESQUADRIAS (termo sem correspondência: espala). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 30 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES; 32 – REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA. |
| PINTURA | **MASSA CORRIDA** | Serviço não descrito de forma expressa na curva do Prevision da PL 35 – PINTURAS (termo sem correspondência: massa, corrida). Associado a esta PL por afinidade do serviço (regra de de-para da ferramenta). O termo aparece na curva de: 20 – IMPERMEABILIZAÇÃO; 29 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS; 30 – REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES. |

Fonte: aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (export do Prevision). Datas de início e término e % realizado vêm do Prevision; nos níveis PL e pacote o % é a média dos itens ponderada pela duração. O cronograma é o mesmo nos três cenários (os cenários mudam as curvas financeiras, não as datas das atividades).
