Ed Jardim · Esquemático de avanço por pavimento

Corte ilustrativo (sem escala): cada célula é o avanço da PL no pavimento, pelas atividades do cronograma do Prevision · passe o mouse numa célula para ver o detalhe

Concluído · Em andamento (50% a 99%) · Em andamento (1% a 49%) · A executar · Sem atividade da PL no pavimento

ACABAMENTO FINALIZADO ATÉ 31/12/2027: CORTE POR APARTAMENTO

Critério: término do revestimento de parede e de piso (cerâmica/porcelanato) no cronograma do Prevision

29º	*Barrilete (área comum)*	
28º	*Laje técnica (área comum)*	
26º/27º	**Duplex 2600**	termina em mar/28
25º	**Apto 2500**	termina em mar/28
24º	**Apto 2400**	termina em ago/28
23º	**Apto 2300**	termina em jul/28
22º	**Apto 2200**	termina em abr/28
21º	**Apto 2100**	termina em abr/28
20º	**Apto 2000**	termina em mar/28
19º	**Apto 1900**	termina em jan/28
18º	**Apto 1800**	**pronto em 24/11/2027**
17º	**Apto 1700**	em execução · termina 19/01/2028
16º	**Apto 1600**	**pronto em 03/12/2027**
15º	**Apto 1500**	termina em fev/28
14º	**Apto 1400**	**pronto em 08/12/2027**
13º	**Apto 1300**	termina em jul/28
12º	**Apto 1200**	**pronto em 29/09/2027**
11º	**Apto 1100**	**pronto em 25/10/2027**
10º	**Apto 1000**	**pronto em 17/08/2027**
9º	**Apto 900**	**pronto em 06/07/2027**
8º	**Apto 800**	termina em jun/28
7º	**Apto 700**	**pronto em 20/05/2027**
6º	**Apto 600**	termina em abr/28
5º	**Apto 500**	termina em mar/28
4º	**Apto Garden 400**	termina em mai/28
3º	*Pilotis (área comum)*	
2º	*Garagem (área comum)*	
Térreo	*Garagens (área comum)*	

8 de 23 apartamentos

com acabamento finalizado em 2027

- **Apto 700** · 20/05/2027
- **Apto 900** · 06/07/2027
- **Apto 1000** · 17/08/2027
- **Apto 1200** · 29/09/2027
- **Apto 1100** · 25/10/2027
- **Apto 1800** · 24/11/2027
- **Apto 1600** · 03/12/2027
- **Apto 1400** · 08/12/2027


Em 2028: 15

- Apto 1700 · 19/01/2028 (em execução em 31/12/2027)
- Apto 1900 · 28/01/2028
- Apto 1500 · 02/02/2028
- Apto 2000 · 01/03/2028
- Apto 2500 · 10/03/2028
- Apto 500 · 15/03/2028
- Duplex 2600 · 23/03/2028
- Apto 600 · 12/04/2028
- Apto 2100 · 25/04/2028
- Apto 2200 · 28/04/2028
- Apto Garden 400 · 29/05/2028
- Apto 800 · 07/06/2028
- Apto 1300 · 11/07/2028
- Apto 2300 · 20/07/2028
- Apto 2400 · 22/08/2028

Acabamento finalizado · Em execução na data · A executar

CHECK LIST EM 2028: CORTE POR APARTAMENTO

Critério: término do check list no cronograma do Prevision

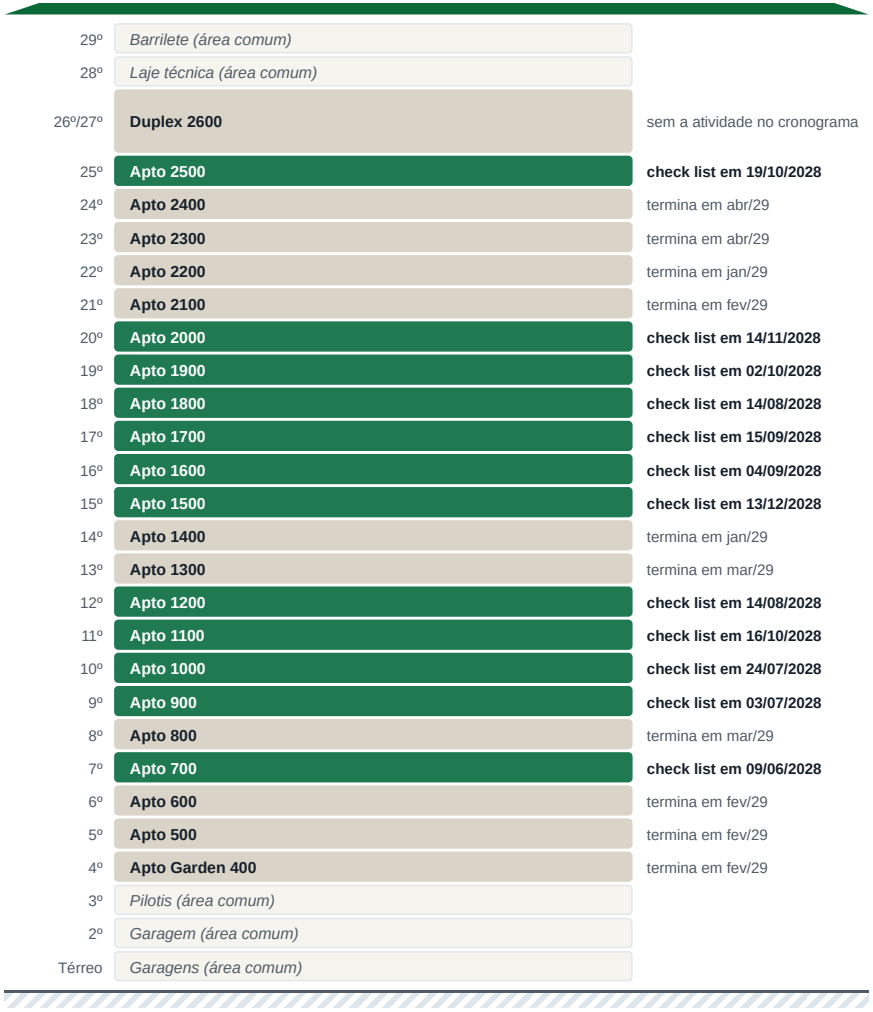

12 de 23 apartamentos

com check list concluído em 2028

- **Apto 700** · 09/06/2028
- **Apto 900** · 03/07/2028
- **Apto 1000** · 24/07/2028
- **Apto 1800** · 14/08/2028
- **Apto 1200** · 14/08/2028
- **Apto 1600** · 04/09/2028
- **Apto 1700** · 15/09/2028
- **Apto 1900** · 02/10/2028
- **Apto 1100** · 16/10/2028
- **Apto 2500** · 19/10/2028
- **Apto 2000** · 14/11/2028
- **Apto 1500** · 13/12/2028


Em 2029: 10

- Apto 2200 · 17/01/2029
- Apto 1400 · 17/01/2029
- Apto 2100 · 05/02/2029
- Apto 600 · 07/02/2029
- Apto 500 · 28/02/2029
- Apto Garden 400 · 28/02/2029
- Apto 1300 · 21/03/2029
- Apto 800 · 21/03/2029
- Apto 2300 · 10/04/2029
- Apto 2400 · 30/04/2029

Concluído antes de 01/01/2028 · Check list concluído no ano · Em execução na data · A executar

CHECK LIST EM 2029: CORTE POR APARTAMENTO

Critério: término do check list no cronograma do Prevision

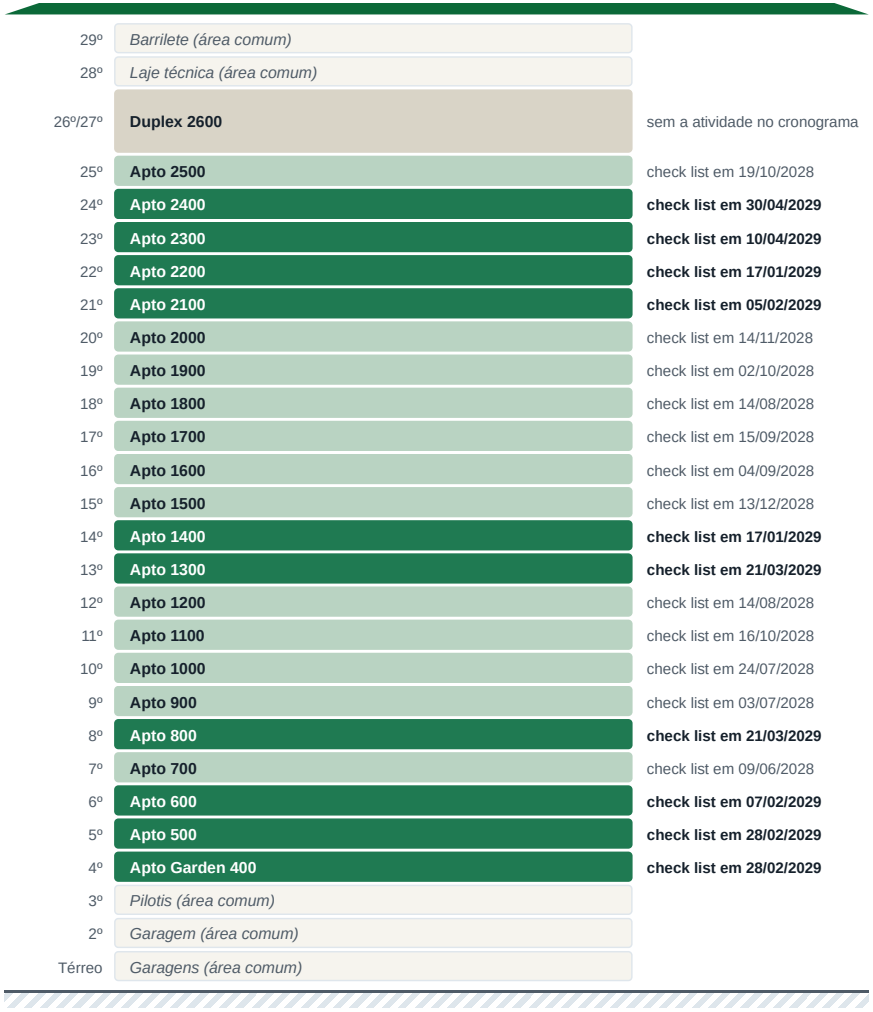

10 de 23 apartamentos

com check list concluído em 2029

+ 12 já concluídos antes de 01/01/2029

- **Apto 2200** · 17/01/2029
- **Apto 1400** · 17/01/2029
- **Apto 2100** · 05/02/2029
- **Apto 600** · 07/02/2029
- **Apto 500** · 28/02/2029
- **Apto Garden 400** · 28/02/2029
- **Apto 1300** · 21/03/2029
- **Apto 800** · 21/03/2029
- **Apto 2300** · 10/04/2029
- **Apto 2400** · 30/04/2029

Concluído antes de 01/01/2029 · Check list concluído no ano · Em execução na data · A executar


SITUAÇÃO EM 19/10/2026 (realizado do cronograma)

Pavimentos **29%** Infraestrutura **94%** Fachada **1%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE																				1%	0%
28º LAJE TÉCNICA																					0%
27º DUPLEX SUPERIOR																					0%
26º DUPLEX INFERIOR																					0%
25º TIPO																					0%
24º TIPO																					0%
23º TIPO																					0%
22º TIPO																					0%
21º TIPO																					0%
20º TIPO																					0%
19º TIPO	32																				1%
18º TIPO	100																				4%
17º TIPO	100																				4%
16º TIPO	100																				3%
15º TIPO	100																				5%
14º TIPO	100																				2%
13º TIPO	100	17																			8%
12º TIPO	100	69																			9%
11º TIPO	100	74									40										12%
10º TIPO	100	97		11							63										20%
9º TIPO	100	46						3													9%
8º TIPO	100	36						3													8%
7º TIPO	100	98		12				6			99										18%
6º TIPO	100	98		22				8			32										18%
5º TIPO	100	99	2					10			32										19%
4º APTO GARDEN	99	66						7													45%
3º PILOTIS	100	98	45	35			35				84							26	4		44%
2º GARAGEM	99	100		62	15						96										75%
TÉRREO	100	94		62	36					60	49										64%
Infraestrutura	Contenção, terraplenagem e fundações: 94%																				
% da PL	**90**	**72**	**15**	**23**	**9**	**0**	**7**	**1**	**0**	**12**	**53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**1**		**29%**

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2026


Pavimentos **36%** Infraestrutura **96%** Fachada **28%**

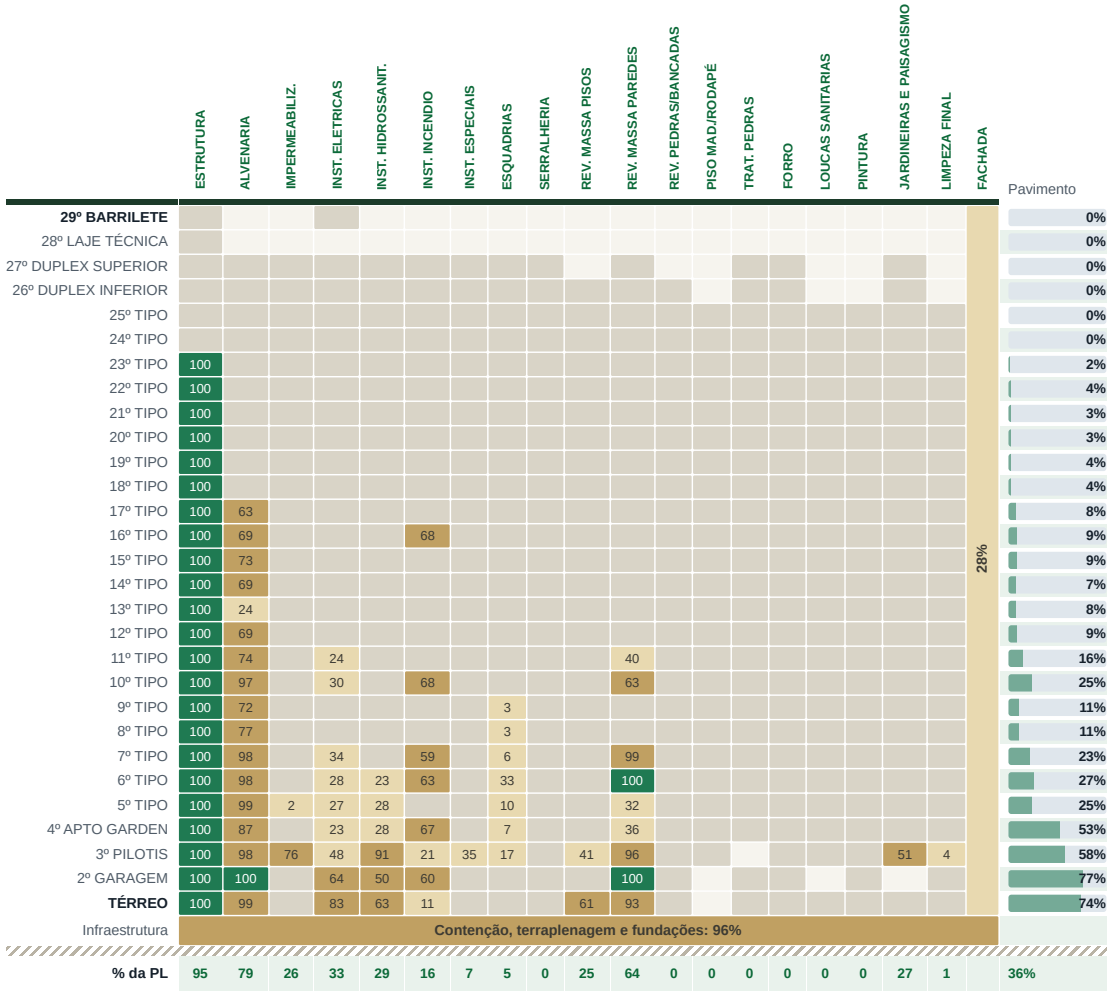

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE																					0%
28º LAJE TÉCNICA																					0%
27º DUPLEX SUPERIOR																					0%
26º DUPLEX INFERIOR																					0%
25º TIPO																					0%
24º TIPO																					0%
23º TIPO	100																				2%
22º TIPO	100																				4%
21º TIPO	100																				3%
20º TIPO	100																				3%
19º TIPO	100																				4%
18º TIPO	100																				4%
17º TIPO	100	63																			8%
16º TIPO	100	69				68															9%
15º TIPO	100	73																			9%
14º TIPO	100	69																			7%
13º TIPO	100	24																			8%
12º TIPO	100	69																			9%
11º TIPO	100	74		24							40										16%
10º TIPO	100	97		30		68					63										25%
9º TIPO	100	72						3													11%
8º TIPO	100	77						3													11%
7º TIPO	100	98		34		59		6			99										23%
6º TIPO	100	98		28	23	63		33			100										27%
5º TIPO	100	99	2	27	28			10			32										25%
4º APTO GARDEN	100	87		23	28	67		7			36										53%
3º PILOTIS	100	98	76	48	91	21	35	17		41	96							51	4		58%
2º GARAGEM	100	100		64	50	60					100										77%
TÉRREO	100	99		83	63	11				61	93										74%
Infraestrutura	Contenção, terraplenagem e fundações: 96%																				
% da PL	**95**	**79**	**26**	**33**	**29**	**16**	**7**	**5**	**0**	**25**	**64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27**	**1**		**36%**

RETRATO: PREVISÃO PARA 31/12/2027

Pavimentos **70%** Infraestrutura **100%** Fachada **89%**

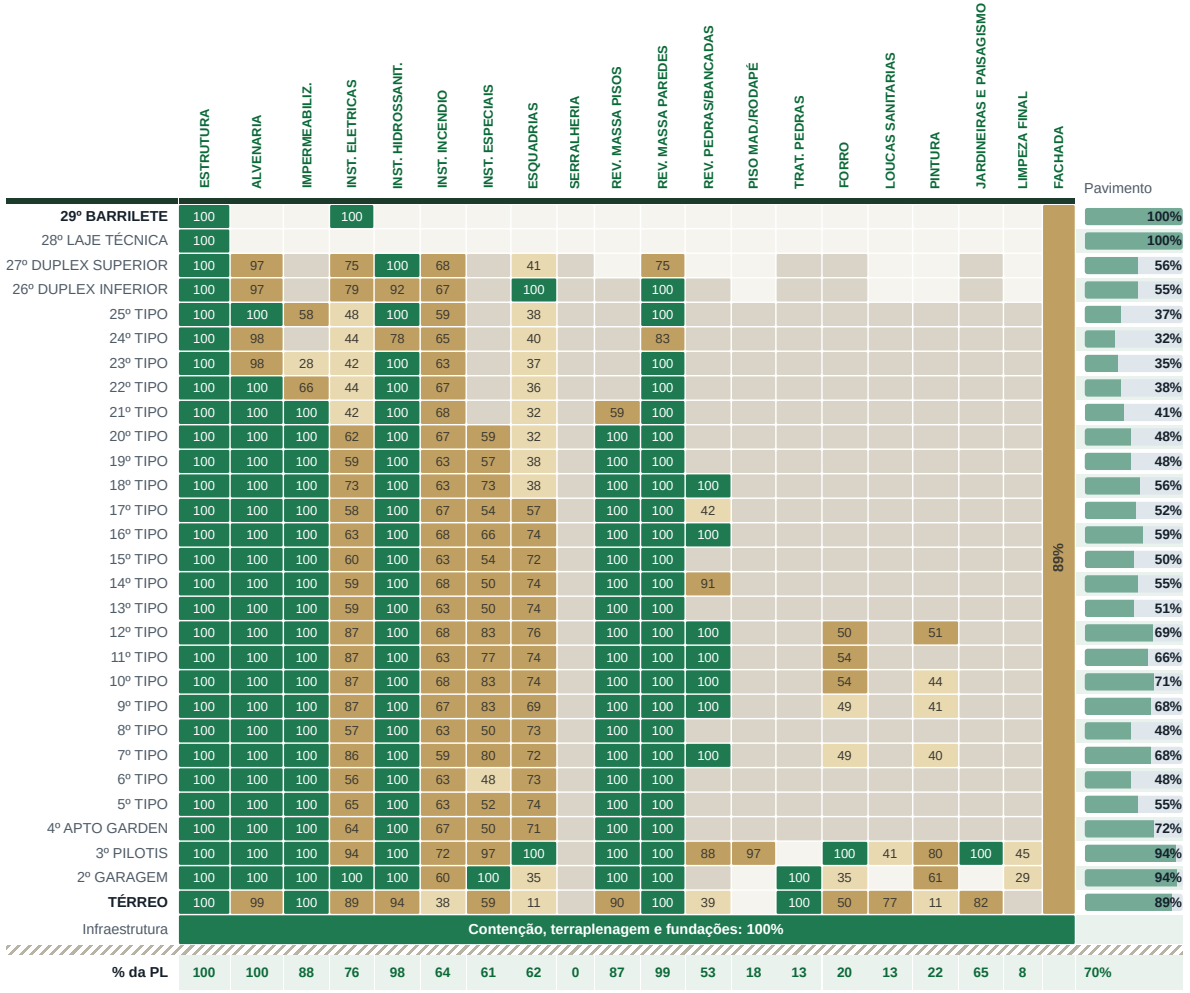

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100																	**100%**
28º LAJE TÉCNICA	100																				**100%**
27º DUPLEX SUPERIOR	100	97		75	100	68		41			75										**56%**
26º DUPLEX INFERIOR	100	97		79	92	67		100			100										**55%**
25º TIPO	100	100	58	48	100	59		38			100										**37%**
24º TIPO	100	98		44	78	65		40			83										**32%**
23º TIPO	100	98	28	42	100	63		37			100										**35%**
22º TIPO	100	100	66	44	100	67		36			100										**38%**
21º TIPO	100	100	100	42	100	68		32		59	100										**41%**
20º TIPO	100	100	100	62	100	67	59	32		100	100										**48%**
19º TIPO	100	100	100	59	100	63	57	38		100	100										**48%**
18º TIPO	100	100	100	73	100	63	73	38		100	100	100									**56%**
17º TIPO	100	100	100	58	100	67	54	57		100	100	42									**52%**
16º TIPO	100	100	100	63	100	68	66	74		100	100	100									**59%**
15º TIPO	100	100	100	60	100	63	54	72		100	100										**50%**
14º TIPO	100	100	100	59	100	68	50	74		100	100	91									**55%**
13º TIPO	100	100	100	59	100	63	50	74		100	100										**51%**
12º TIPO	100	100	100	87	100	68	83	76		100	100	100			50		51				**69%**
11º TIPO	100	100	100	87	100	63	77	74		100	100	100			54						**66%**
10º TIPO	100	100	100	87	100	68	83	74		100	100	100			54		44				**71%**
9º TIPO	100	100	100	87	100	67	83	69		100	100	100			49		41				**68%**
8º TIPO	100	100	100	57	100	63	50	73		100	100										**48%**
7º TIPO	100	100	100	86	100	59	80	72		100	100	100			49		40				**68%**
6º TIPO	100	100	100	56	100	63	48	73		100	100										**48%**
5º TIPO	100	100	100	65	100	63	52	74		100	100										**55%**
4º APTO GARDEN	100	100	100	64	100	67	50	71		100	100										**72%**
3º PILOTIS	100	100	100	94	100	72	97	100		100	100	88	97		100	41	80	100	45		**94%**
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	60	100	35		100	100			100	35		61		29		**94%**
TÉRREO	100	99	100	89	94	38	59	11		90	100	39		100	50	77	11	82			**89%**
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 100%**																				
% da PL	**100**	**100**	**88**	**76**	**98**	**64**	**61**	**62**	**0**	**87**	**99**	**53**	**18**	**13**	**20**	**13**	**22**	**65**	**8**		**70%**

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2028

Pavimentos **97%** Infraestrutura **100%** Fachada **100%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	CHECK LIST	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100																	100%	**100%**
28º LAJE TÉCNICA	100																					**100%**
27º DUPLEX SUPERIOR	100	100	100	100	100	68	100	100			100				100			41				**85%**
26º DUPLEX INFERIOR	100	100	100	100	100	67	100	100		100	100	100		32	100			100				**90%**
25º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
24º TIPO	100	100	100	85	100	65	77	100		100	100	100	80		100		43					**78%**
23º TIPO	100	100	100	92	100	63	100	100		100	100	100	100		100		40	100				**83%**
22º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	81			**99%**
21º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	100	52			**95%**
20º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
19º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
18º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
17º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
16º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
15º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
14º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	81			**99%**
13º TIPO	100	100	100	93	100	63	100	100		100	100	100	100	77	100		41	100				**86%**
12º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
11º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
10º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
9º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
8º TIPO	100	100	100	92	100	63	100	100		100	100	100	100	77	100		42	100				**85%**
7º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
6º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	78	100	52			**95%**
5º TIPO	100	100	100	94	100	63	100	100		100	100	100	100	100	100		53	100	50			**90%**
4º APTO GARDEN	100	100	100	93	100	67	100	100		100	100	100	100	100	100		53	100	50			**94%**
3º PILOTIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100		**100%**
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100		100		100			**100%**
TÉRREO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100			**100%**
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 100%**																					
% da PL	**100**	**100**	**100**	**99**	**100**	**91**	**99**	**100**	**73**	**100**	**100**	**100**	**99**	**84**	**100**	**80**	**86**	**97**	**78**	**68**		**97%**

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2029

Pavimentos **100%** Infraestrutura **100%** Fachada **100%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	CHECK LIST	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100																	100%	**100%**
28º LAJE TÉCNICA	100																					**100%**
27º DUPLEX SUPERIOR	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100			100	100			100				**100%**
26º DUPLEX INFERIOR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100			100				**100%**
25º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
24º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
23º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
22º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
21º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
20º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
19º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
18º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
17º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
16º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
15º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
14º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
13º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
12º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
11º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
10º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
9º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
8º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
7º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
6º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
5º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
4º APTO GARDEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
3º PILOTIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100		**100%**
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100		100		100			**100%**
TÉRREO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100			**100%**
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 100%**																					
% da PL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**100%**

Pavimentos: nº na coluna N da aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (lote do Prevision). PLs com atividades em pelo menos 3 pavimentos; infraestrutura = contenção, terraplenagem, fundação profunda, fundação superficial; fachada = revestimento diversos fachada (lotes sem pavimento). Previsão: o saldo de cada tarefa segue linear da data da situação (ou do início planejado) até o término planejado. Esquema ilustrativo, sem escala, não substitui o levantamento em campo.
