# Ed Jardim · Esquemático de avanço por pavimento

Corte ilustrativo (sem escala): cada célula é o avanço da PL no pavimento, pelas atividades do cronograma do Prevision · passe o mouse numa célula para ver o detalhe

Concluído · Em andamento (50% a 99%) · Em andamento (1% a 49%) · A executar · Sem atividade da PL no pavimento

## ACABAMENTO FINALIZADO ATÉ 31/12/2027: CORTE POR APARTAMENTO

Critério: término do revestimento de parede e de piso (cerâmica/porcelanato) no cronograma do Prevision

| | | |
|---|---|---|
| 29º | *Barrilete (área comum)* | |
| 28º | *Laje técnica (área comum)* | |
| 26º/27º | **Duplex 2600** | termina em mar/28 |
| 25º | **Apto 2500** | termina em mar/28 |
| 24º | **Apto 2400** | termina em fev/28 |
| 23º | **Apto 2300** | termina em jan/28 |
| 22º | **Apto 2200** | em execução · termina 07/01/2028 |
| 21º | **Apto 2100** | **pronto em 03/12/2027** |
| 20º | **Apto 2000** | **pronto em 23/09/2027** |
| 19º | **Apto 1900** | **pronto em 25/08/2027** |
| 18º | **Apto 1800** | **pronto em 28/07/2027** |
| 17º | **Apto 1700** | **pronto em 14/07/2027** |
| 16º | **Apto 1600** | **pronto em 30/06/2027** |
| 15º | **Apto 1500** | **pronto em 22/11/2027** |
| 14º | **Apto 1400** | **pronto em 28/10/2027** |
| 13º | **Apto 1300** | **pronto em 13/12/2027** |
| 12º | **Apto 1200** | **pronto em 29/09/2027** |
| 11º | **Apto 1100** | **pronto em 10/05/2027** |
| 10º | **Apto 1000** | **pronto em 19/04/2027** |
| 9º | **Apto 900** | **pronto em 15/09/2027** |
| 8º | **Apto 800** | **pronto em 24/08/2027** |
| 7º | **Apto 700** | **pronto em 05/04/2027** |
| 6º | **Apto 600** | **pronto em 02/03/2027** |
| 5º | **Apto 500** | **pronto em 03/08/2027** |
| 4º | **Apto Garden 400** | **pronto em 13/07/2027** |
| 3º | *Pilotis (área comum)* | |
| 2º | *Garagem (área comum)* | |
| Térreo | *Garagens (área comum)* | |

**18** de 23 apartamentos

### com acabamento finalizado em 2027

- **Apto 600** · 02/03/2027
- **Apto 700** · 05/04/2027
- **Apto 1000** · 19/04/2027
- **Apto 1100** · 10/05/2027
- **Apto 1600** · 30/06/2027
- **Apto Garden 400** · 13/07/2027
- **Apto 1700** · 14/07/2027
- **Apto 1800** · 28/07/2027
- **Apto 500** · 03/08/2027
- **Apto 800** · 24/08/2027
- **Apto 1900** · 25/08/2027
- **Apto 900** · 15/09/2027
- **Apto 2000** · 23/09/2027
- **Apto 1200** · 29/09/2027
- **Apto 1400** · 28/10/2027
- **Apto 1500** · 22/11/2027
- **Apto 2100** · 03/12/2027
- **Apto 1300** · 13/12/2027


### Em 2028: 5

- Apto 2200 · 07/01/2028 (em execução em 31/12/2027)
- Apto 2300 · 28/01/2028
- Apto 2400 · 18/02/2028
- Apto 2500 · 10/03/2028
- Duplex 2600 · 17/03/2028

Acabamento finalizado · Em execução na data · A executar

## CHECK LIST EM 2028: CORTE POR APARTAMENTO

Critério: término do check list no cronograma do Prevision

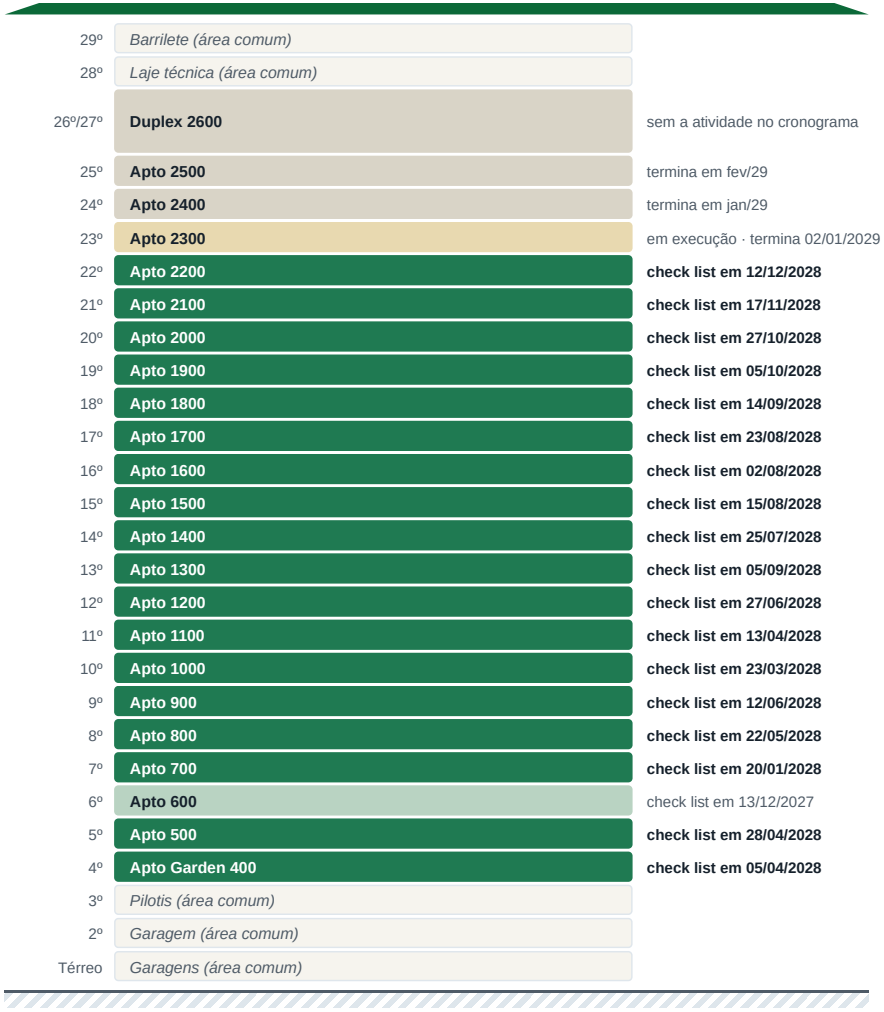


**18** de 23 apartamentos

**com check list concluído em 2028**

+ 1 já concluídos antes de 01/01/2028

- **Apto 700** · 20/01/2028
- **Apto 1000** · 23/03/2028
- **Apto Garden 400** · 05/04/2028
- **Apto 1100** · 13/04/2028
- **Apto 500** · 28/04/2028
- **Apto 800** · 22/05/2028
- **Apto 900** · 12/06/2028
- **Apto 1200** · 27/06/2028
- **Apto 1400** · 25/07/2028
- **Apto 1600** · 02/08/2028
- **Apto 1500** · 15/08/2028
- **Apto 1700** · 23/08/2028
- **Apto 1300** · 05/09/2028
- **Apto 1800** · 14/09/2028
- **Apto 1900** · 05/10/2028
- **Apto 2000** · 27/10/2028
- **Apto 2100** · 17/11/2028
- **Apto 2200** · 12/12/2028


**Em 2029: 3**

- Apto 2300 · 02/01/2029 (em execução em 31/12/2028)
- Apto 2400 · 23/01/2029
- Apto 2500 · 13/02/2029

Concluído antes de 01/01/2028 · Check list concluído no ano · Em execução na data · A executar

## CHECK LIST EM 2029: CORTE POR APARTAMENTO

Critério: término do check list no cronograma do Prevision

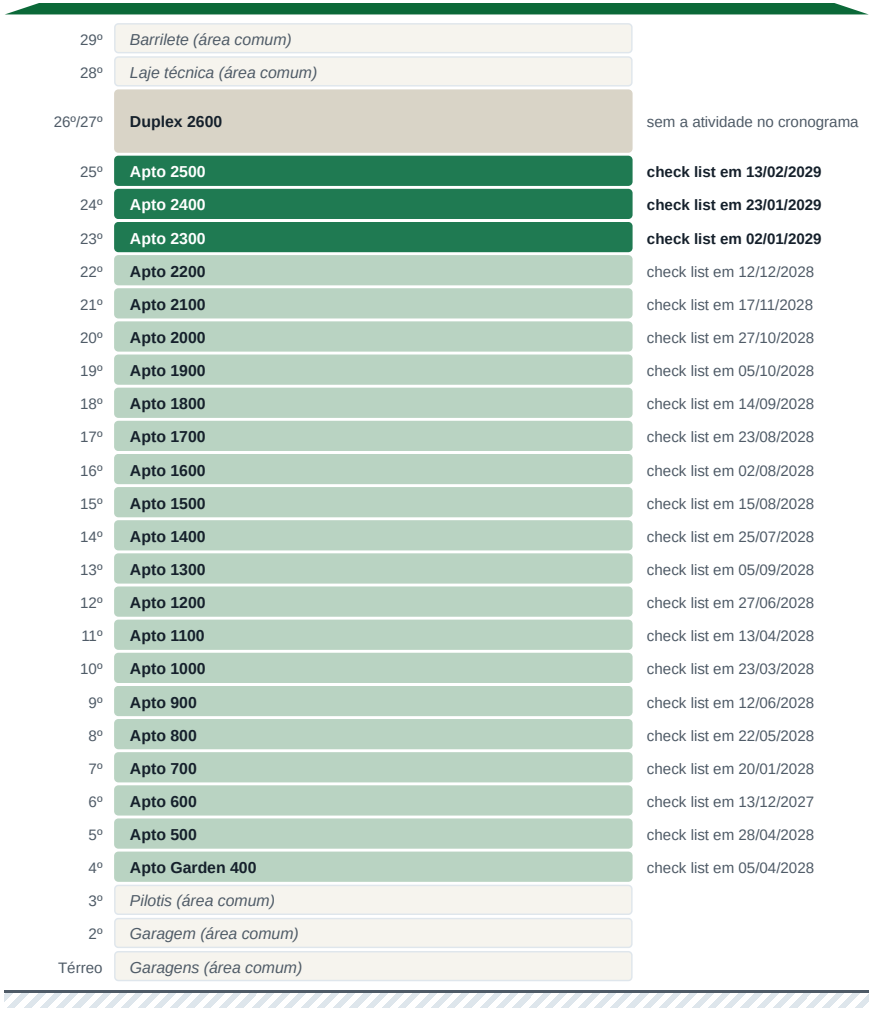


**3** de 23 apartamentos

**com check list concluído em 2029**

+ 19 já concluídos antes de 01/01/2029

- **Apto 2300** · 02/01/2029
- **Apto 2400** · 23/01/2029
- **Apto 2500** · 13/02/2029

Concluído antes de 01/01/2029 · Check list concluído no ano · Em execução na data · A executar


## SITUAÇÃO EM 07/10/2026 (realizado do cronograma)

Pavimentos **26%** Infraestrutura **94%** Fachada **0%**

| | ESTRUTURA | ALVENARIA | IMPERMEABILIZ. | INST. ELETRICAS | INST. HIDROSSANIT. | INST. INCENDIO | INST. ESPECIAIS | ESQUADRIAS | SERRALHERIA | REV. MASSA PISOS | REV. MASSA PAREDES | REV. PEDRAS/BANCADAS | PISO MAD./RODAPÉ | TRAT. PEDRAS | FORRO | LOUCAS SANITARIAS | PINTURA | JARDINEIRAS E PAISAGISMO | LIMPEZA FINAL | FACHADA | Pavimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29º BARRILETE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 28º LAJE TÉCNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 27º DUPLEX SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 26º DUPLEX INFERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 25º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 24º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 23º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 22º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 21º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 20º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 19º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 18º TIPO | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3% |
| 17º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% |
| 16º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2% |
| 15º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% |
| 14º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2% |
| 13º TIPO | 100 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7% |
| 12º TIPO | 100 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% |
| 11º TIPO | 100 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9% |
| 10º TIPO | 100 | 97 | | 9 | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 16% |
| 9º TIPO | 100 | 46 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 8% |
| 8º TIPO | 100 | 35 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 7% |
| 7º TIPO | 100 | 98 | | 10 | | | | 9 | | | 87 | | | | | | | | | | 16% |
| 6º TIPO | 100 | 98 | | 18 | | | | 11 | | | 32 | | | | | | | | | | 16% |
| 5º TIPO | 100 | 66 | 2 | | | | | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | 13% |
| 4º APTO GARDEN | 99 | 68 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 44% |
| 3º PILOTIS | 100 | 98 | 28 | 39 | | | 35 | | | | 44 | | | | | | | 26 | 4 | | 36% |
| 2º GARAGEM | 99 | 100 | | 62 | 15 | | | | | | 96 | | | | | | | | | | 75% |
| **TÉRREO** | 91 | 92 | | 66 | 37 | | | | | 60 | 51 | | | | | | | | | | 64% |
| Infraestrutura | Contenção, terraplenagem e fundações: 94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **% da PL** | **89** | **70** | **13** | **22** | **9** | **0** | **6** | **2** | **0** | **12** | **35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14** | **1** | | **26%** |

## MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2026


Pavimentos **34%** Infraestrutura **96%** Fachada **18%**

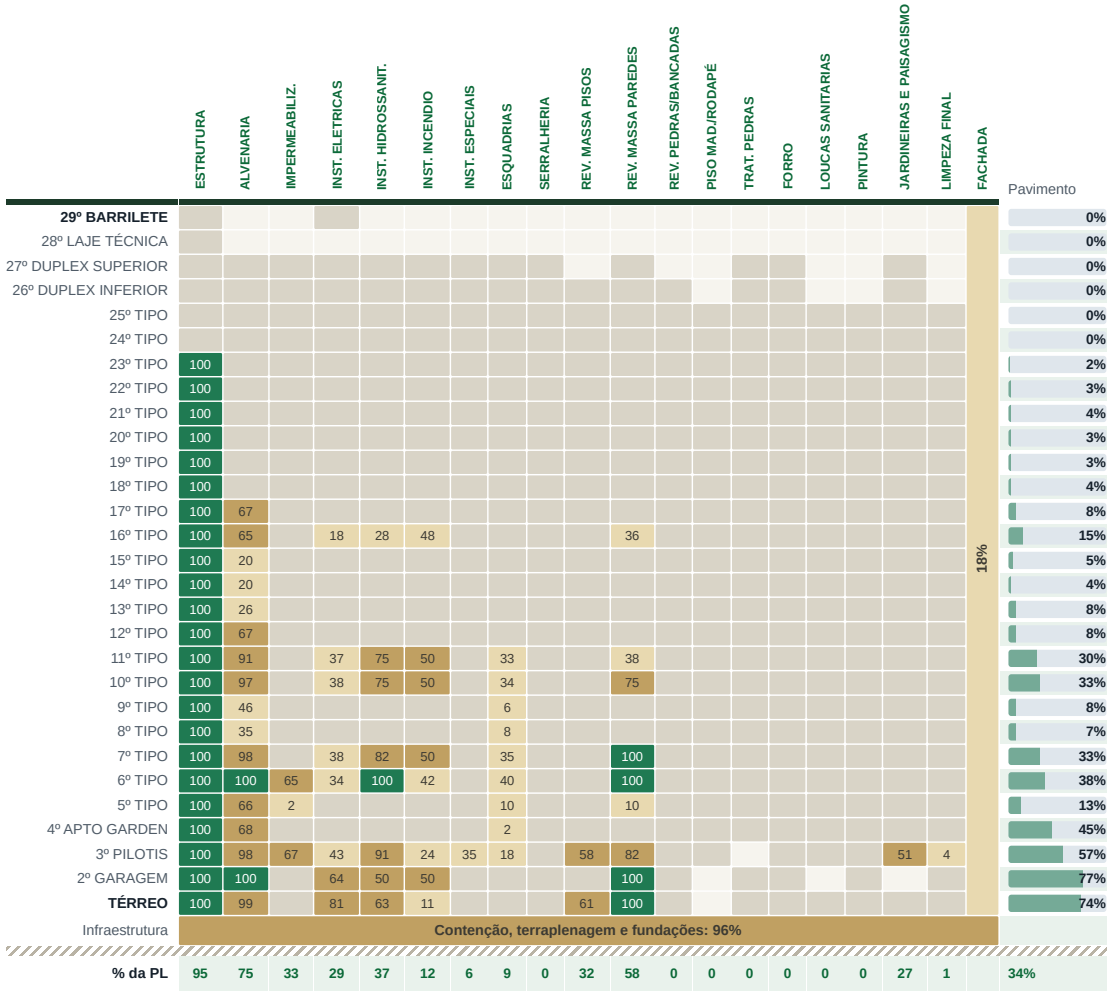

| | ESTRUTURA | ALVENARIA | IMPERMEABILIZ. | INST. ELETRICAS | INST. HIDROSSANIT. | INST. INCENDIO | INST. ESPECIAIS | ESQUADRIAS | SERRALHERIA | REV. MASSA PISOS | REV. MASSA PAREDES | REV. PEDRAS/BANCADAS | PISO MAD./RODAPÉ | TRAT. PEDRAS | FORRO | LOUCAS SANITARIAS | PINTURA | JARDINEIRAS E PAISAGISMO | LIMPEZA FINAL | FACHADA | Pavimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29º BARRILETE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18% | 0% |
| 28º LAJE TÉCNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 27º DUPLEX SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 26º DUPLEX INFERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 25º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 24º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 23º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2% |
| 22º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3% |
| 21º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% |
| 20º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3% |
| 19º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3% |
| 18º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% |
| 17º TIPO | 100 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% |
| 16º TIPO | 100 | 65 | | 18 | 28 | 48 | | | | | 36 | | | | | | | | | | 15% |
| 15º TIPO | 100 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5% |
| 14º TIPO | 100 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% |
| 13º TIPO | 100 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% |
| 12º TIPO | 100 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% |
| 11º TIPO | 100 | 91 | | 37 | 75 | 50 | | 33 | | | 38 | | | | | | | | | | 30% |
| 10º TIPO | 100 | 97 | | 38 | 75 | 50 | | 34 | | | 75 | | | | | | | | | | 33% |
| 9º TIPO | 100 | 46 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 8% |
| 8º TIPO | 100 | 35 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 7% |
| 7º TIPO | 100 | 98 | | 38 | 82 | 50 | | 35 | | | 100 | | | | | | | | | | 33% |
| 6º TIPO | 100 | 100 | 65 | 34 | 100 | 42 | | 40 | | | 100 | | | | | | | | | | 38% |
| 5º TIPO | 100 | 66 | 2 | | | | | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | 13% |
| 4º APTO GARDEN | 100 | 68 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 45% |
| 3º PILOTIS | 100 | 98 | 67 | 43 | 91 | 24 | 35 | 18 | | 58 | 82 | | | | | | | 51 | 4 | | 57% |
| 2º GARAGEM | 100 | 100 | | 64 | 50 | 50 | | | | | 100 | | | | | | | | | | 77% |
| **TÉRREO** | 100 | 99 | | 81 | 63 | 11 | | | | 61 | 100 | | | | | | | | | | 74% |
| Infraestrutura | Contenção, terraplenagem e fundações: 96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **% da PL** | **95** | **75** | **33** | **29** | **37** | **12** | **6** | **9** | **0** | **32** | **58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27** | **1** | | **34%** |

## RETRATO: PREVISÃO PARA 31/12/2027

Pavimentos **76%** Infraestrutura **100%** Fachada **86%**

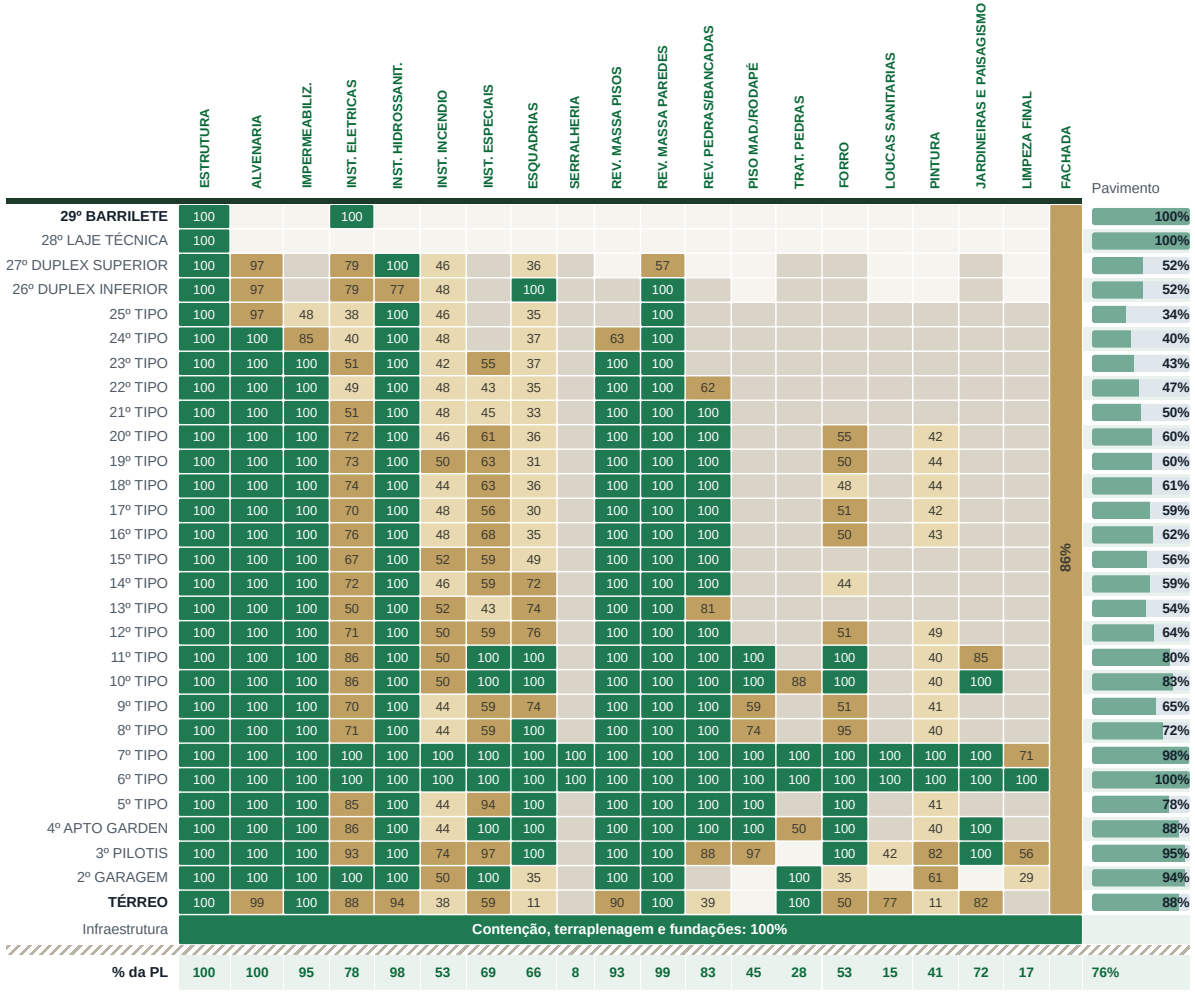

| | ESTRUTURA | ALVENARIA | IMPERMEABILIZ. | INST. ELETRICAS | INST. HIDROSSANIT. | INST. INCENDIO | INST. ESPECIAIS | ESQUADRIAS | SERRALHERIA | REV. MASSA PISOS | REV. MASSA PAREDES | REV. PEDRAS/BANCADAS | PISO MAD./RODAPÉ | TRAT. PEDRAS | FORRO | LOUCAS SANITARIAS | PINTURA | JARDINEIRAS E PAISAGISMO | LIMPEZA FINAL | FACHADA | Pavimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29º BARRILETE** | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| 28º LAJE TÉCNICA | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| 27º DUPLEX SUPERIOR | 100 | 97 | | 79 | 100 | 46 | | 36 | | | 57 | | | | | | | | | | 52% |
| 26º DUPLEX INFERIOR | 100 | 97 | | 79 | 77 | 48 | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | 52% |
| 25º TIPO | 100 | 97 | 48 | 38 | 100 | 46 | | 35 | | | 100 | | | | | | | | | | 34% |
| 24º TIPO | 100 | 100 | 85 | 40 | 100 | 48 | | 37 | | 63 | 100 | | | | | | | | | | 40% |
| 23º TIPO | 100 | 100 | 100 | 51 | 100 | 42 | 55 | 37 | | 100 | 100 | | | | | | | | | | 43% |
| 22º TIPO | 100 | 100 | 100 | 49 | 100 | 48 | 43 | 35 | | 100 | 100 | 62 | | | | | | | | | 47% |
| 21º TIPO | 100 | 100 | 100 | 51 | 100 | 48 | 45 | 33 | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | 50% |
| 20º TIPO | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 46 | 61 | 36 | | 100 | 100 | 100 | | | 55 | | 42 | | | | 60% |
| 19º TIPO | 100 | 100 | 100 | 73 | 100 | 50 | 63 | 31 | | 100 | 100 | 100 | | | 50 | | 44 | | | | 60% |
| 18º TIPO | 100 | 100 | 100 | 74 | 100 | 44 | 63 | 36 | | 100 | 100 | 100 | | | 48 | | 44 | | | | 61% |
| 17º TIPO | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 48 | 56 | 30 | | 100 | 100 | 100 | | | 51 | | 42 | | | | 59% |
| 16º TIPO | 100 | 100 | 100 | 76 | 100 | 48 | 68 | 35 | | 100 | 100 | 100 | | | 50 | | 43 | | | | 62% |
| 15º TIPO | 100 | 100 | 100 | 67 | 100 | 52 | 59 | 49 | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | 56% |
| 14º TIPO | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 46 | 59 | 72 | | 100 | 100 | 100 | | | 44 | | | | | | 59% |
| 13º TIPO | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 52 | 43 | 74 | | 100 | 100 | 81 | | | | | | | | | 54% |
| 12º TIPO | 100 | 100 | 100 | 71 | 100 | 50 | 59 | 76 | | 100 | 100 | 100 | | | 51 | | 49 | | | | 64% |
| 11º TIPO | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 50 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 40 | 85 | | | 80% |
| 10º TIPO | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 50 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | | 40 | 100 | | | 83% |
| 9º TIPO | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 44 | 59 | 74 | | 100 | 100 | 100 | 59 | | 51 | | 41 | | | | 65% |
| 8º TIPO | 100 | 100 | 100 | 71 | 100 | 44 | 59 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 74 | | 95 | | 40 | | | | 72% |
| 7º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | | 98% |
| 6º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 5º TIPO | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 44 | 94 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 41 | | | | 78% |
| 4º APTO GARDEN | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 44 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | | 40 | 100 | | | 88% |
| 3º PILOTIS | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 74 | 97 | 100 | | 100 | 100 | 88 | 97 | | 100 | 42 | 82 | 100 | 56 | | 95% |
| 2º GARAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 35 | | 100 | 100 | | | 100 | 35 | | 61 | | 29 | | 94% |
| **TÉRREO** | 100 | 99 | 100 | 88 | 94 | 38 | 59 | 11 | | 90 | 100 | 39 | | 100 | 50 | 77 | 11 | 82 | | | 88% |
| Infraestrutura | **Contenção, terraplenagem e fundações: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **% da PL** | **100** | **100** | **95** | **78** | **98** | **53** | **69** | **66** | **8** | **93** | **99** | **83** | **45** | **28** | **53** | **15** | **41** | **72** | **17** | | **76%** |

## MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2028

Pavimentos **100%** Infraestrutura **100%** Fachada **100%**

| | ESTRUTURA | ALVENARIA | IMPERMEABILIZ. | INST. ELETRICAS | INST. HIDROSSANIT. | INST. INCENDIO | INST. ESPECIAIS | ESQUADRIAS | SERRALHERIA | REV. MASSA PISOS | REV. MASSA PAREDES | REV. PEDRAS/BANCADAS | PISO MAD./RODAPÉ | TRAT. PEDRAS | FORRO | LOUCAS SANITARIAS | PINTURA | JARDINEIRAS E PAISAGISMO | LIMPEZA FINAL | CHECK LIST | FACHADA | Pavimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29º BARRILETE** | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | **100%** |
| 28º LAJE TÉCNICA | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100%** |
| 27º DUPLEX SUPERIOR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 100 | 100 | | | 100 | | | 59 | 100 | | | 100 | | | | **90%** |
| 26º DUPLEX INFERIOR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | | | **93%** |
| 25º TIPO | 100 | 100 | 100 | 91 | 100 | 65 | 100 | 100 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | 68 | 100 | 46 | | | **89%** |
| 24º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 52 | | | **98%** |
| 23º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | | **100%** |
| 22º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 21º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 20º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 19º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 18º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 17º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 16º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 15º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 14º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 13º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 12º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 11º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 10º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 9º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 8º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 7º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 6º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 5º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 4º APTO GARDEN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 3º PILOTIS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 2º GARAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | **100%** |
| **TÉRREO** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | **100%** |
| Infraestrutura | **Contenção, terraplenagem e fundações: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **% da PL** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **95** | **100** | **100** | **91** | **100** | **100** | **100** | **100** | **99** | **100** | **97** | **99** | **100** | **97** | **94** | | **100%** |

## MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2029

Pavimentos **100%** Infraestrutura **100%** Fachada **100%**

| | ESTRUTURA | ALVENARIA | IMPERMEABILIZ. | INST. ELETRICAS | INST. HIDROSSANIT. | INST. INCENDIO | INST. ESPECIAIS | ESQUADRIAS | SERRALHERIA | REV. MASSA PISOS | REV. MASSA PAREDES | REV. PEDRAS/BANCADAS | PISO MAD./RODAPÉ | TRAT. PEDRAS | FORRO | LOUCAS SANITARIAS | PINTURA | JARDINEIRAS E PAISAGISMO | LIMPEZA FINAL | CHECK LIST | FACHADA | Pavimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29º BARRILETE** | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | **100%** |
| 28º LAJE TÉCNICA | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100%** |
| 27º DUPLEX SUPERIOR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | | | | **100%** |
| 26º DUPLEX INFERIOR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | | | **100%** |
| 25º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 24º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 23º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 22º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 21º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 20º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 19º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 18º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 17º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 16º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 15º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 14º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 13º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 12º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 11º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 10º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 9º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 8º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 7º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 6º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 5º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 4º APTO GARDEN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 3º PILOTIS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **100%** |
| 2º GARAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | **100%** |
| **TÉRREO** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | **100%** |
| Infraestrutura | **Contenção, terraplenagem e fundações: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **% da PL** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | | **100%** |

Pavimentos: nº na coluna N da aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (lote do Prevision). PLs com atividades em pelo menos 3 pavimentos; infraestrutura = contenção, terraplenagem, fundação profunda, fundação superficial; fachada = revestimento diversos fachada (lotes sem pavimento). Previsão: o saldo de cada tarefa segue linear da data da situação (ou do início planejado) até o término planejado. Esquema ilustrativo, sem escala, não substitui o levantamento em campo.
