ED JARDIM · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Setembro/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: padrão (curvas digitadas) · R$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL
R$ 154,7 mi
orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE
R$ 45,9 mi
29,7% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027
R$ 56,0 mi
realizado + previsto

SALDO A REALIZAR
R$ 108,8 mi
após a data de corte

CONFERÊNCIA
✓ Tudo OK
detalhes abaixo


REALIZADO (ATUAL)
Outubro/2026

COMPOSIÇÃO DO ANO


Ano	Anual R$	Acumulado R$	Anual %	Acumulado %	Realizado R$	A realizar R$
2024	R$ 5.778.713,93	R$ 5.778.713,93	3,74%	3,74%	R$ 5.778.713,93	-
2025	R$ 18.489.705,84	R$ 24.268.419,77	11,95%	15,69%	R$ 18.489.705,84	-
2026	R$ 34.288.497,43	R$ 58.556.917,20	22,16%	37,85%	R$ 21.604.582,49	R$ 12.683.914,94
2027	**R$ 56.009.788,87**	**R$ 114.566.706,07**	**36,20%**	**74,05%**	**-**	**R$ 56.009.788,87**
2028	R$ 32.502.136,81	R$ 147.068.842,88	21,01%	95,06%	-	R$ 32.502.136,81
2029	R$ 4.911.386,76	R$ 151.980.229,64	3,17%	98,24%	-	R$ 4.911.386,76
2030	R$ 2.725.430,97	R$ 154.705.660,62	1,76%	100,00%	-	R$ 2.725.430,97
TOTAL	**R$ 154.705.660,62**		**100,00%**		**R$ 45.873.002,26**	**R$ 108.832.658,36**

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

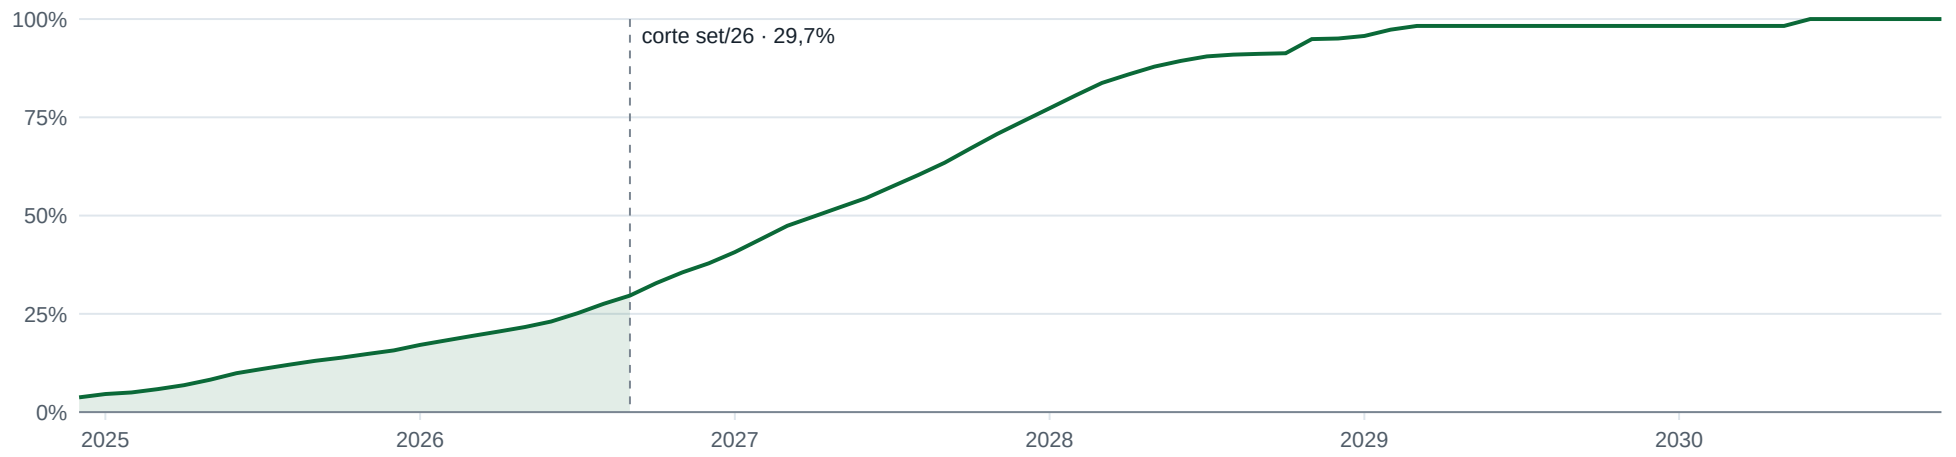

DESEMBOLSO ANUAL (R$ MILHÕES)

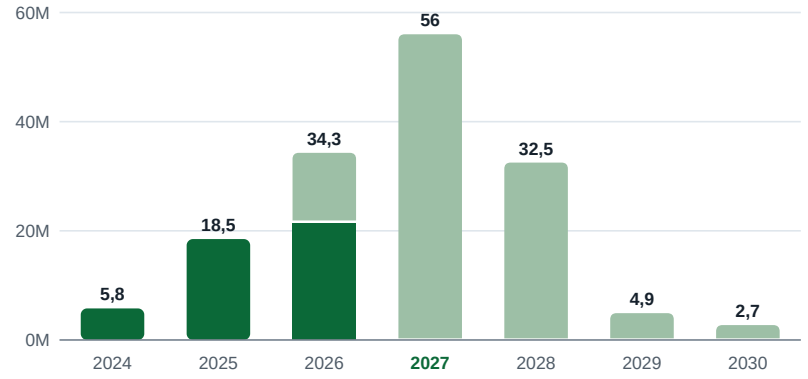

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

Grupo	R$	% do ano	Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)	R$ 7.588.160,21	13,5%	84,2%
Infraestrutura (12 a 16)	R$ 323.092,65	0,6%	99,8%
Estrutura (17)	R$ 3.966.525,43	7,1%	98,5%
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)	R$ 16.374.735,01	29,2%	75,6%
Acabamentos (25 a 37)	R$ 27.757.275,57	49,6%	56,2%
Taxa de administração	R$ 0,00	0,0%	
TOTAL	**R$ 56.009.788,87**	**100,0%**	

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.
