Ed Jardim · Esquemático de avanço por pavimento

Corte ilustrativo (sem escala): cada célula é o avanço da PL no pavimento, pelas atividades do cronograma do Prevision · passe o mouse numa célula para ver o detalhe

Concluído · Em andamento (50% a 99%) · Em andamento (1% a 49%) · A executar · Sem atividade da PL no pavimento


SITUAÇÃO EM 07/10/2026 (realizado do cronograma)

Pavimentos **26%** Infraestrutura **94%** Fachada **0%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE																					0%
28º LAJE TÉCNICA																					0%
27º DUPLEX SUPERIOR																					0%
26º DUPLEX INFERIOR																					0%
25º TIPO																					0%
24º TIPO																					0%
23º TIPO																					0%
22º TIPO																					0%
21º TIPO																					0%
20º TIPO																					0%
19º TIPO																					0%
18º TIPO	94																				3%
17º TIPO	100																				4%
16º TIPO	100																				2%
15º TIPO	100																				4%
14º TIPO	100																				2%
13º TIPO	100	16																			7%
12º TIPO	100	67																			8%
11º TIPO	100	53																			9%
10º TIPO	100	97		9							28										16%
9º TIPO	100	46						6													8%
8º TIPO	100	35						8													7%
7º TIPO	100	98		10				9			87										16%
6º TIPO	100	98		18				11			32										16%
5º TIPO	100	66	2					10			10										13%
4º APTO GARDEN	99	68						2													44%
3º PILOTIS	100	98	28	39			35				44							26	4		36%
2º GARAGEM	99	100		62	15						96										75%
TÉRREO	91	92		66	37					60	51										64%
Infraestrutura	Contenção, terraplenagem e fundações: 94%																				
% da PL	**89**	**70**	**13**	**22**	**9**	**0**	**6**	**2**	**0**	**12**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**1**		**26%**

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2026


Pavimentos **34%** Infraestrutura **96%** Fachada **18%**

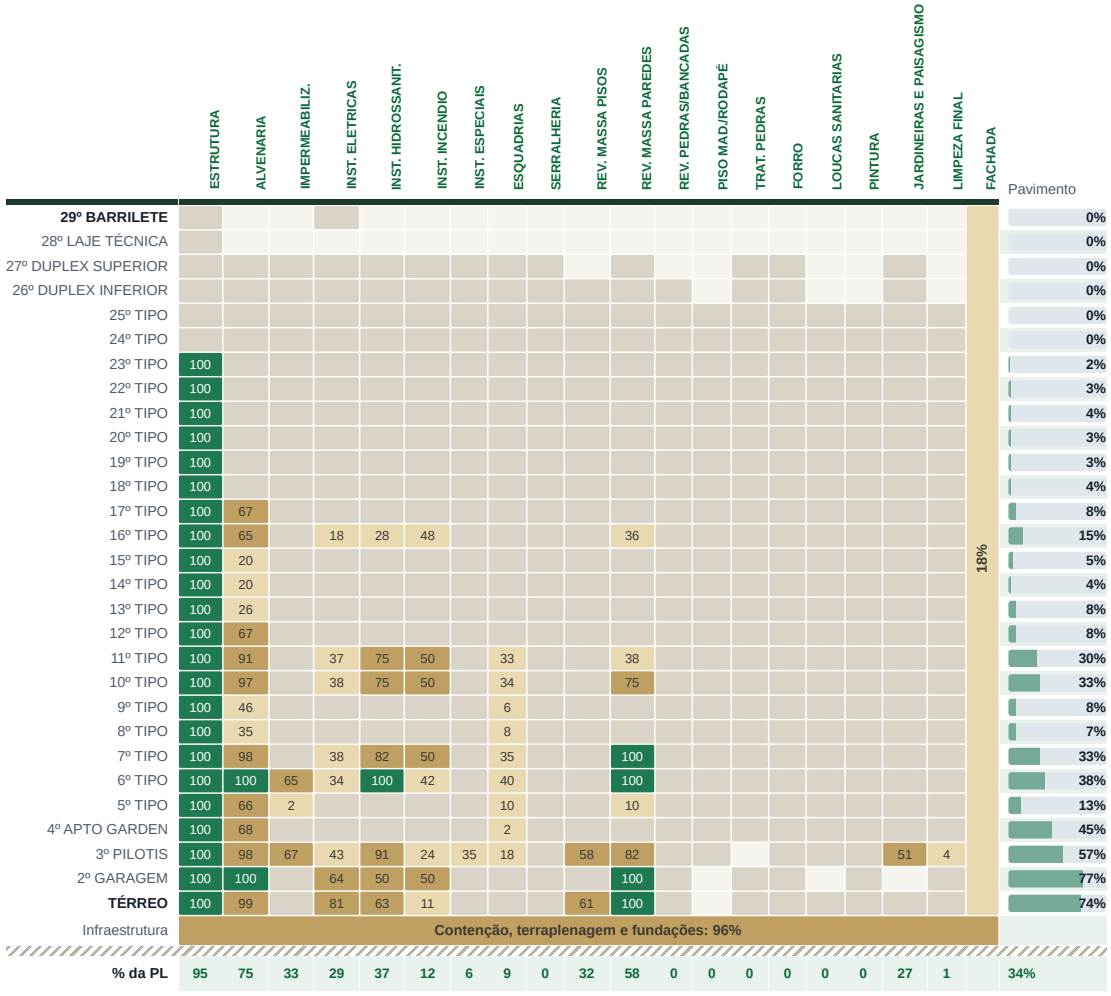

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE																					0%
28º LAJE TÉCNICA																					0%
27º DUPLEX SUPERIOR																					0%
26º DUPLEX INFERIOR																					0%
25º TIPO																					0%
24º TIPO																					0%
23º TIPO	100																				2%
22º TIPO	100																				3%
21º TIPO	100																				4%
20º TIPO	100																				3%
19º TIPO	100																				3%
18º TIPO	100																				4%
17º TIPO	100	67																			8%
16º TIPO	100	65		18	28	48					36										15%
15º TIPO	100	20																			5%
14º TIPO	100	20																			4%
13º TIPO	100	26																			8%
12º TIPO	100	67																			8%
11º TIPO	100	91		37	75	50		33			38										30%
10º TIPO	100	97		38	75	50		34			75										33%
9º TIPO	100	46						6													8%
8º TIPO	100	35						8													7%
7º TIPO	100	98		38	82	50		35			100										33%
6º TIPO	100	100	65	34	100	42		40			100										38%
5º TIPO	100	66	2					10			10										13%
4º APTO GARDEN	100	68						2													45%
3º PILOTIS	100	98	67	43	91	24	35	18		58	82							51	4		57%
2º GARAGEM	100	100		64	50	50					100										77%
TÉRREO	100	99		81	63	11				61	100										74%
Infraestrutura	Contenção, terraplenagem e fundações: 96%																				
% da PL	**95**	**75**	**33**	**29**	**37**	**12**	**6**	**9**	**0**	**32**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27**	**1**	18%	**34%**

RETRATO: PREVISÃO PARA 31/12/2027

Pavimentos **76%** Infraestrutura **100%** Fachada **86%**

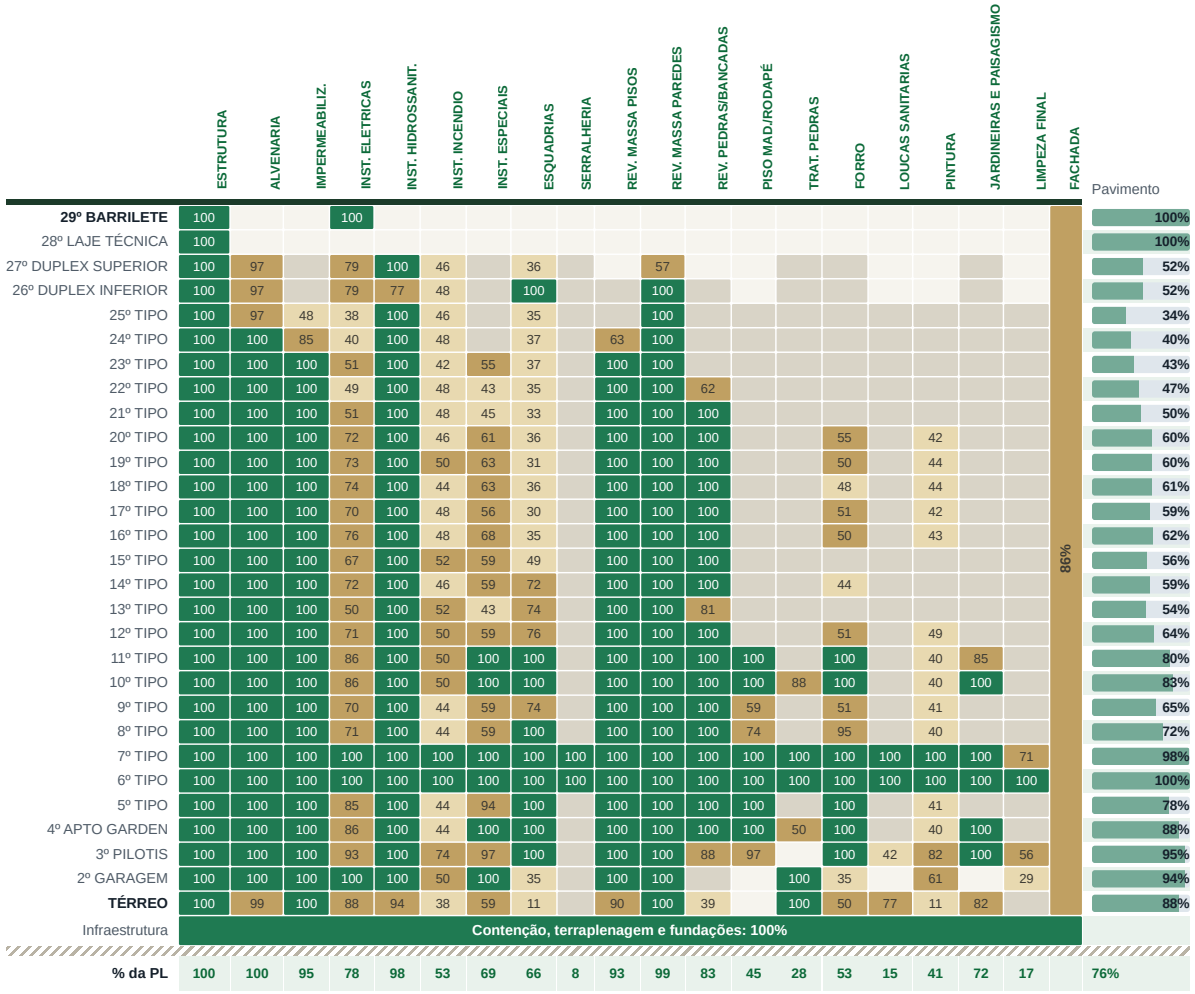

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100																	100%
28º LAJE TÉCNICA	100																				100%
27º DUPLEX SUPERIOR	100	97		79	100	46		36			57										52%
26º DUPLEX INFERIOR	100	97		79	77	48		100			100										52%
25º TIPO	100	97	48	38	100	46		35			100										34%
24º TIPO	100	100	85	40	100	48		37		63	100										40%
23º TIPO	100	100	100	51	100	42	55	37		100	100										43%
22º TIPO	100	100	100	49	100	48	43	35		100	100	62									47%
21º TIPO	100	100	100	51	100	48	45	33		100	100	100									50%
20º TIPO	100	100	100	72	100	46	61	36		100	100	100			55		42				60%
19º TIPO	100	100	100	73	100	50	63	31		100	100	100			50		44				60%
18º TIPO	100	100	100	74	100	44	63	36		100	100	100			48		44				61%
17º TIPO	100	100	100	70	100	48	56	30		100	100	100			51		42				59%
16º TIPO	100	100	100	76	100	48	68	35		100	100	100			50		43				62%
15º TIPO	100	100	100	67	100	52	59	49		100	100	100									56%
14º TIPO	100	100	100	72	100	46	59	72		100	100	100			44						59%
13º TIPO	100	100	100	50	100	52	43	74		100	100	81									54%
12º TIPO	100	100	100	71	100	50	59	76		100	100	100			51		49				64%
11º TIPO	100	100	100	86	100	50	100	100		100	100	100	100		100		40	85			80%
10º TIPO	100	100	100	86	100	50	100	100		100	100	100	100	88	100		40	100			83%
9º TIPO	100	100	100	70	100	44	59	74		100	100	100	59		51		41				65%
8º TIPO	100	100	100	71	100	44	59	100		100	100	100	74		95		40				72%
7º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	71		98%
6º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
5º TIPO	100	100	100	85	100	44	94	100		100	100	100	100		100		41				78%
4º APTO GARDEN	100	100	100	86	100	44	100	100		100	100	100	100	50	100		40	100			88%
3º PILOTIS	100	100	100	93	100	74	97	100		100	100	88	97		100	42	82	100	56		95%
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	50	100	35		100	100			100	35		61		29		94%
TÉRREO	100	99	100	88	94	38	59	11		90	100	39		100	50	77	11	82			88%
Infraestrutura	Contenção, terraplenagem e fundações: 100%																				
% da PL	**100**	**100**	**95**	**78**	**98**	**53**	**69**	**66**	**8**	**93**	**99**	**83**	**45**	**28**	**53**	**15**	**41**	**72**	**17**		**76%**

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2028

Pavimentos **100%** Infraestrutura **100%** Fachada **100%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100																100%	**100%**
28º LAJE TÉCNICA	100																				**100%**
27º DUPLEX SUPERIOR	100	100	100	100	100	46	100	100			100			59	100			100			**90%**
26º DUPLEX INFERIOR	100	100	100	100	100	48	100	100		100	100	100		100	100			100			**93%**
25º TIPO	100	100	100	91	100	65	100	100	39	100	100	100	100	100	100	36	68	100	46		**89%**
24º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	52		**98%**
23º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
22º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
21º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
20º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
19º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
18º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
17º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
16º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
15º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
14º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
13º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
12º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
11º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
10º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
9º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
8º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
7º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
6º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
5º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
4º APTO GARDEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
3º PILOTIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		**100%**
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100		100		100		**100%**
TÉRREO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100		**100%**
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 100%**																				
% da PL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**95**	**100**	**100**	**91**	**100**	**100**	**100**	**100**	**99**	**100**	**97**	**99**	**100**	**97**		**100%**

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2029

Pavimentos **100%** Infraestrutura **100%** Fachada **100%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100																100%	**100%**
28º LAJE TÉCNICA	100																				**100%**
27º DUPLEX SUPERIOR	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100			100	100			100			**100%**
26º DUPLEX INFERIOR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100			100			**100%**
25º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
24º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
23º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
22º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
21º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
20º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
19º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
18º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
17º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
16º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
15º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
14º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
13º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
12º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
11º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
10º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
9º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
8º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
7º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
6º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
5º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
4º APTO GARDEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
3º PILOTIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		**100%**
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100		100		100		**100%**
TÉRREO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100		**100%**
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 100%**																				
% da PL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**100%**

Pavimentos: nº na coluna N da aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (lote do Prevision). PLs com atividades em pelo menos 3 pavimentos; infraestrutura = contenção, terraplenagem, fundação profunda, fundação superficial; fachada = revestimento diversos fachada (lotes sem pavimento). Previsão: o saldo de cada tarefa segue linear da data da situação (ou do início planejado) até o término planejado. Esquema ilustrativo, sem escala, não substitui o levantamento em campo.
