# TORRE CATHARINA · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Setembro/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: Visão Set/26 (curvas digitadas) · R$ nominais, com taxa de adm.

**PROJEÇÃO TOTAL**
**R$ 184,0 mi**
orçamento projetado (IEC)

**REALIZADO ATÉ O CORTE**
**R$ 47,5 mi**
25,8% da projeção

**DESEMBOLSO EM 2027**
**R$ 62,2 mi**
realizado + previsto

**SALDO A REALIZAR**
**R$ 136,5 mi**
após a data de corte

**CONFERÊNCIA**
**✓ Tudo OK**
detalhes abaixo


REALIZADO (ATUAL)
**Outubro/2026**

COMPOSIÇÃO DO ANO


| Ano | Anual R$ | Acumulado R$ | Anual % | Acumulado % | Realizado R$ | A realizar R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 3.987.357,38 | R$ 3.987.357,38 | 2,17% | 2,17% | R$ 3.987.357,38 | - |
| 2025 | R$ 21.526.348,38 | R$ 25.513.705,76 | 11,70% | 13,87% | R$ 21.526.348,38 | - |
| 2026 | R$ 35.058.483,13 | R$ 60.572.188,89 | 19,06% | 32,93% | R$ 21.958.774,84 | R$ 13.099.708,29 |
| **2027** | **R$ 62.179.560,93** | **R$ 122.751.749,83** | **33,80%** | **66,73%** | **-** | **R$ 62.179.560,93** |
| 2028 | R$ 48.867.949,19 | R$ 171.619.699,02 | 26,56% | 93,29% | - | R$ 48.867.949,19 |
| 2029 | R$ 7.870.523,99 | R$ 179.490.223,00 | 4,28% | 97,57% | - | R$ 7.870.523,99 |
| 2030 | R$ 4.468.025,39 | R$ 183.958.248,39 | 2,43% | 100,00% | - | R$ 4.468.025,39 |
| **TOTAL** | **R$ 183.958.248,39** | | **100,00%** | | **R$ 47.472.480,60** | **R$ 136.485.767,79** |

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

## CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

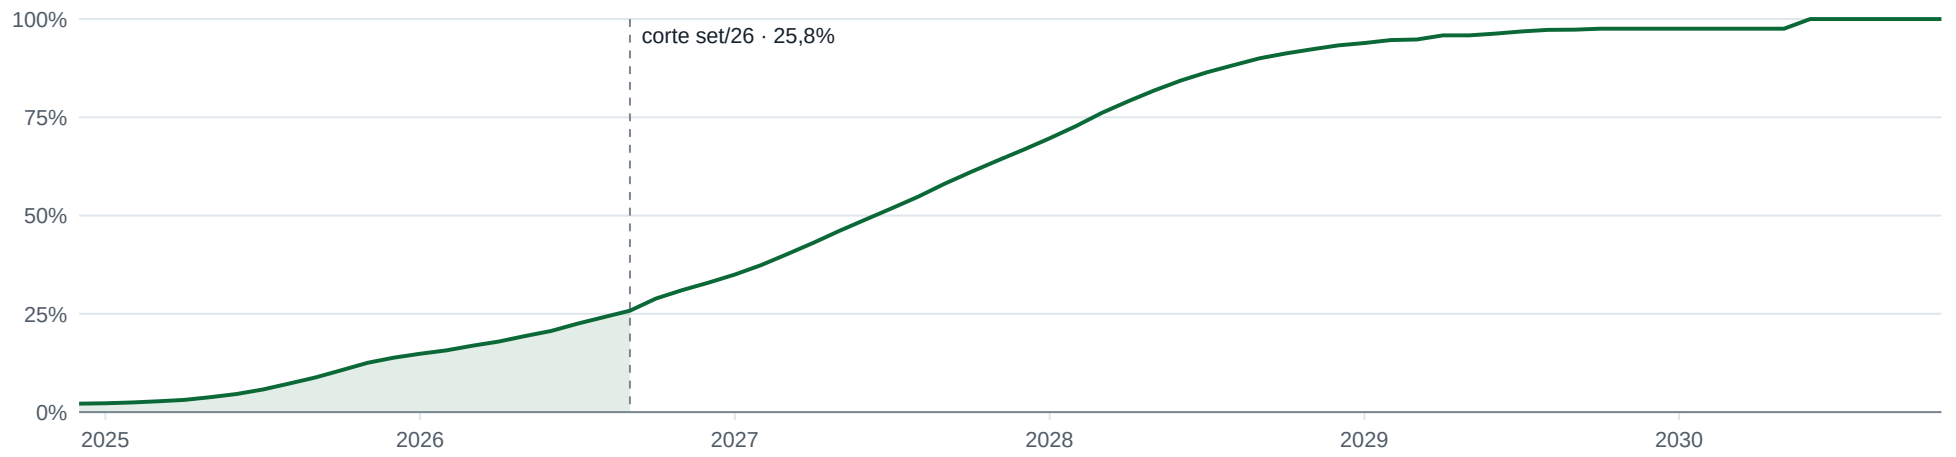


## DESEMBOLSO ANUAL (R$ MILHÕES)

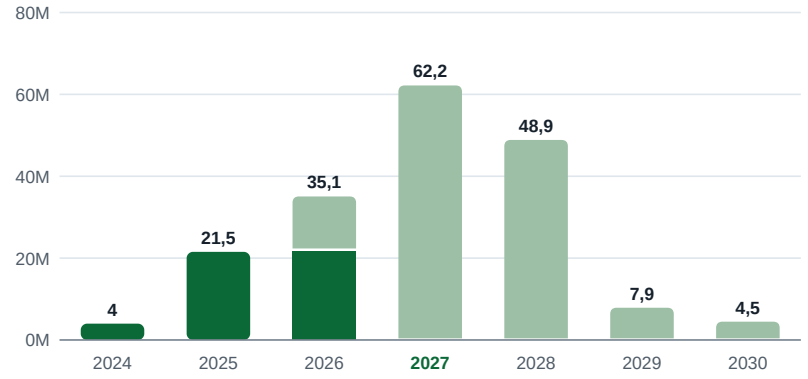


## DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

| Grupo | R$ | % do ano | Avanço financeiro |
|---|---|---|---|
| Indiretos (01 a 11) | R$ 8.973.264,12 | 14,4% | 67,0% |
| Infraestrutura (12 a 16) | R$ 245.422,16 | 0,4% | 99,9% |
| Estrutura (17) | R$ 6.818.965,87 | 11,0% | 99,2% |
| Vedações, instalações e elevadores (18 a 24) | R$ 21.513.998,94 | 34,6% | 63,8% |
| Acabamentos (25 a 37) | R$ 19.398.067,98 | 31,2% | 46,5% |
| Taxa de administração | R$ 5.229.841,86 | 8,4% | |
| **TOTAL** | **R$ 62.179.560,93** | **100,0%** | |

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

## PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.
