
Torre Catharina · Curva física por cenário

Avanço físico acumulado dos itens diretos (26 PLs), ponderado pela projeção de cada PL · Corte: set/26 · Realizado no corte: 23,28%

Curva S

Visão geral › passe o mouse no gráfico para ver o detalhamento do mês

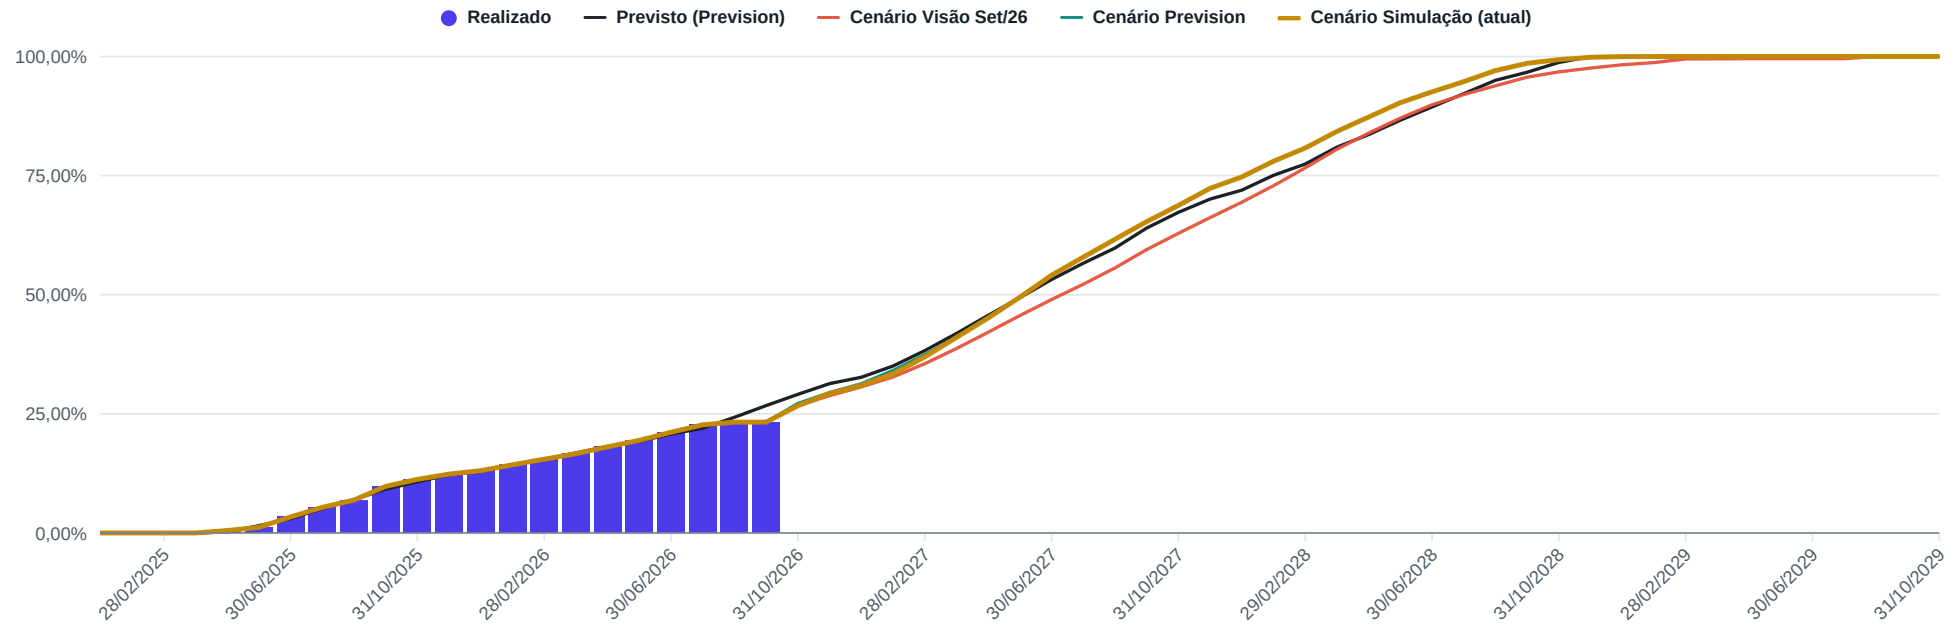

AVANÇO FÍSICO ACUMULADO NO FIM DE CADA ANO

Data	Realizado	Previsto (Prevision)	Visão Set/26	Prevision	Simulação
31/12/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
31/12/2025	13,1%	12,9%	13,1%	13,1%	13,1%
31/12/2026	—	32,7%	30,6%	31,3%	31,0%
31/12/2027	**—**	**71,9%**	**69,4%**	**74,7%**	**74,7%**
31/12/2028	—	100,0%	98,3%	100,0%	100,0%
31/12/2029	—	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Conclusão (100%)		nov/28	ago/29	dez/28	dez/28

POR PL EM 31/12/2027

PL	No corte	Prevision	Visão Set/26	Prevision	Simulação
SERVIÇOS INICIAIS	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
CONTENÇÃO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TERRAPLENAGEM	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
FUNDAÇÃO PROFUNDA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	98,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	53,4%	100,0%	99,2%	99,2%	99,2%
ALVENARIA	6,3%	97,0%	82,1%	96,8%	96,8%
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,0%	80,0%	56,8%	80,0%	80,0%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,0%	66,5%	56,2%	66,7%	66,7%
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,4%	91,3%	67,3%	91,4%	91,4%
INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	0,0%	70,6%	100,0%	70,6%	70,6%
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,0%	74,4%	39,8%	74,1%	74,1%
ELEVADORES	0,0%	45,0%	65,2%	65,2%	65,2%
ESQUADRIAS	0,0%	17,9%	37,7%	37,7%	37,7%
SERRALHERIA	0,0%	13,5%	80,4%	13,5%	13,5%
MARCENARIA	0,0%	22,8%	0,0%	22,8%	22,8%
REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	0,2%	95,3%	100,0%	95,2%	95,2%
REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	5,8%	99,3%	88,9%	99,2%	99,2%
REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	0,0%	65,9%	70,4%	65,9%	65,9%
PAVIMENTAÇÃO	0,0%	100,0%	50,0%	100,0%	100,0%
REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA	3,0%	49,4%	49,1%	48,5%	48,5%
FORRO	0,0%	70,3%	46,2%	70,3%	70,3%
LOUÇAS SANITÁRIAS	0,0%	1,3%	18,1%	18,1%	18,1%
PINTURA	11,0%	44,4%	38,8%	41,2%	41,2%
PAISAGISMO	0,0%	7,5%	0,0%	7,5%	7,5%
LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,0%	12,2%	0,0%	12,2%	12,2%

Como a curva é montada. **Realizado** e **Previsto (Prevision)**: % acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision (aba CP RESUMO) de cada PL. **Cenários**: até o corte, o realizado; depois, o físico de cada PL avança na mesma proporção do desembolso que falta no cenário (curva financeira da aba da PL). PL sem desembolso futuro segue o previsto do Prevision. A obra é a média das PLs diretas ponderada pela projeção (R$ 124,6 mi). O Prevision pondera pelo custo do próprio cronograma, por isso o % dele pode ser um pouco diferente.
