BOTÂNICO · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Agosto/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: Prevision · R$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL
R$ 160,4 mi
orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE
R$ 21,3 mi
13,3% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027
R$ 56,1 mi
realizado + previsto


SALDO A REALIZAR
R$ 139,1 mi
após a data de corte

CONFERÊNCIA
✓ Tudo OK
detalhes abaixo


	REALIZADO (ATUAL) Setembro/2026				COMPOSIÇÃO DO ANO	
Ano	**Anual R$**	**Acumulado R$**	**Anual %**	**Acumulado %**	**Realizado R$**	**A realizar R$**
2024	R$ 1.055.724,07	R$ 1.055.724,07	0,66%	0,66%	R$ 1.055.724,07	-
2025	R$ 7.679.641,61	R$ 8.735.365,68	4,79%	5,45%	R$ 7.679.641,61	-
2026	R$ 25.628.339,45	R$ 34.363.705,13	15,98%	21,42%	R$ 12.548.975,13	R$ 13.079.364,32
2027	**R$ 56.060.330,96**	**R$ 90.424.036,09**	**34,95%**	**56,37%**	**-**	**R$ 56.060.330,96**
2028	R$ 60.961.670,69	R$ 151.385.706,78	38,00%	94,37%	-	R$ 60.961.670,69
2029	R$ 9.035.272,62	R$ 160.420.979,40	5,63%	100,00%	-	R$ 9.035.272,62
2030	-	R$ 160.420.979,40	0,00%	100,00%	-	-
TOTAL	**R$ 160.420.979,40**		**100,00%**		**R$ 21.284.340,81**	**R$ 139.136.638,59**

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

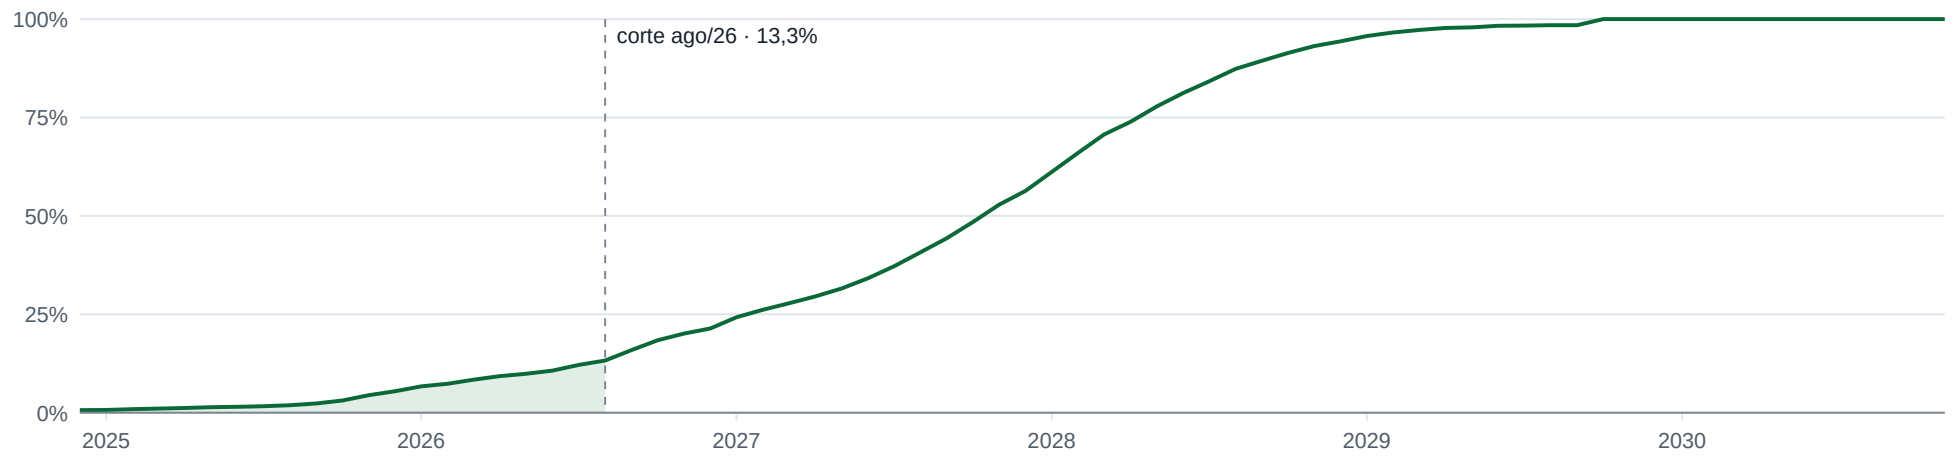

DESEMBOLSO ANUAL (R$ MILHÕES)

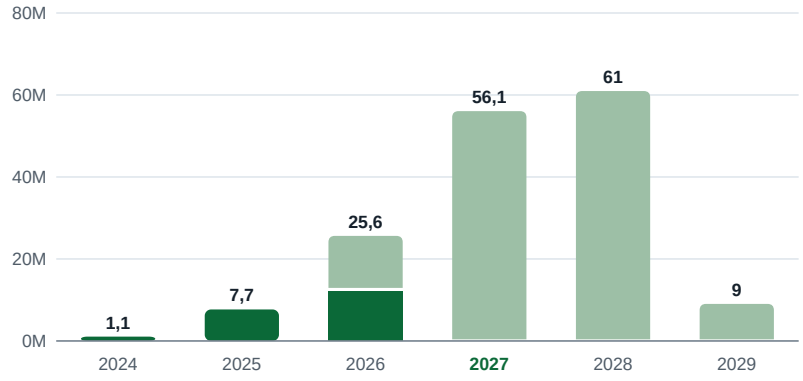

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

Grupo	R$	% do ano	Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)	R$ 9.868.861,03	17,6%	57,8%
Infraestrutura (12 a 16)	R$ 1.426.609,28	2,5%	100,0%
Estrutura (17)	R$ 16.405.808,44	29,3%	97,4%
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)	R$ 17.091.438,18	30,5%	46,9%
Acabamentos (25 a 37)	R$ 11.267.614,04	20,1%	24,8%
Taxa de administração	R$ 0,00	0,0%	
TOTAL	**R$ 56.060.330,96**	**100,0%**	

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.
