# BOTÂNICO · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Agosto/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: padrão (curvas digitadas) · R$ nominais, com taxa de adm.

**PROJEÇÃO TOTAL**
**R$ 160,4 mi**
orçamento projetado (IEC)

**REALIZADO ATÉ O CORTE**
**R$ 21,3 mi**
13,3% da projeção

**DESEMBOLSO EM 2027**
**R$ 47,6 mi**
realizado + previsto

**SALDO A REALIZAR**
**R$ 139,1 mi**
após a data de corte

**CONFERÊNCIA**
**✓ Tudo OK**
detalhes abaixo


REALIZADO (ATUAL)
**Setembro/2026**

COMPOSIÇÃO DO ANO


| Ano | Anual R$ | Acumulado R$ | Anual % | Acumulado % | Realizado R$ | A realizar R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1.055.724,07 | R$ 1.055.724,07 | 0,66% | 0,66% | R$ 1.055.724,07 | - |
| 2025 | R$ 7.679.641,61 | R$ 8.735.365,68 | 4,79% | 5,45% | R$ 7.679.641,61 | - |
| 2026 | R$ 25.567.560,42 | R$ 34.302.926,10 | 15,94% | 21,38% | R$ 12.548.975,13 | R$ 13.018.585,28 |
| **2027** | **R$ 47.604.449,83** | **R$ 81.907.375,93** | **29,67%** | **51,06%** | **-** | **R$ 47.604.449,83** |
| 2028 | R$ 66.701.794,01 | R$ 148.609.169,93 | 41,58% | 92,64% | - | R$ 66.701.794,01 |
| 2029 | R$ 11.811.809,47 | R$ 160.420.979,40 | 7,36% | 100,00% | - | R$ 11.811.809,47 |
| 2030 | - | R$ 160.420.979,40 | 0,00% | 100,00% | - | - |
| **TOTAL** | **R$ 160.420.979,40** | | **100,00%** | | **R$ 21.284.340,81** | **R$ 139.136.638,59** |

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

## CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

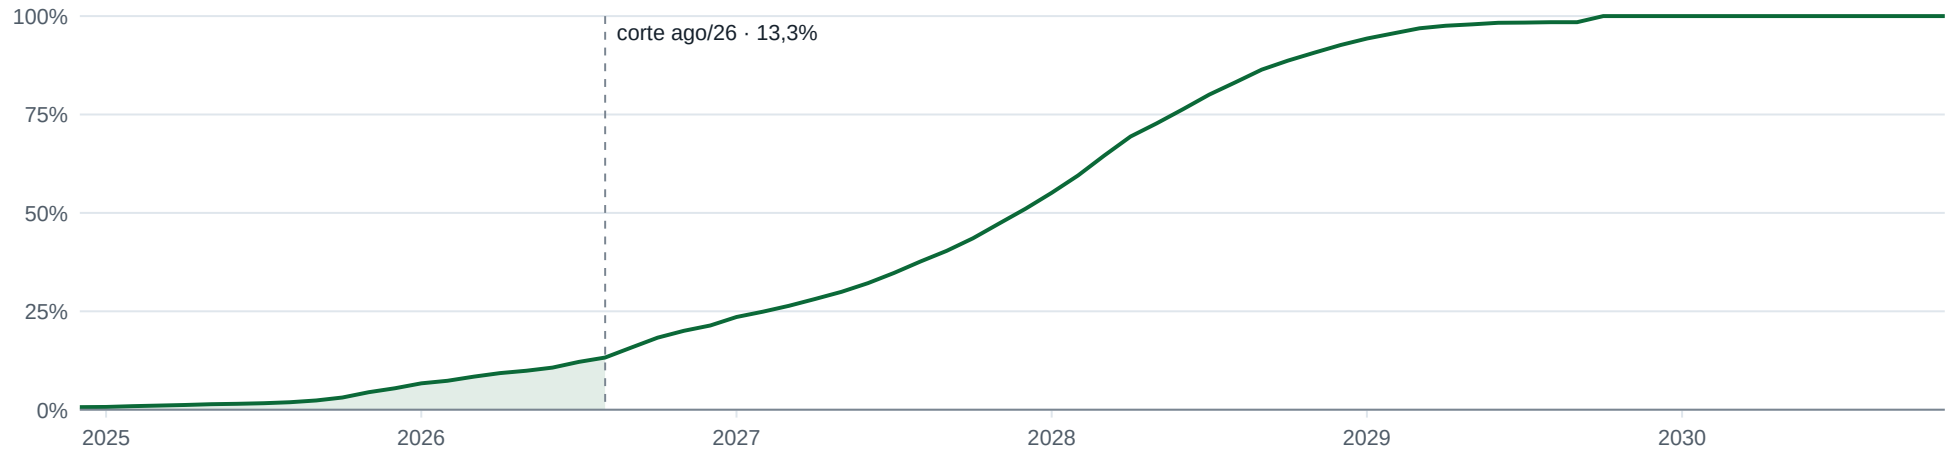


## DESEMBOLSO ANUAL (R$ MILHÕES)

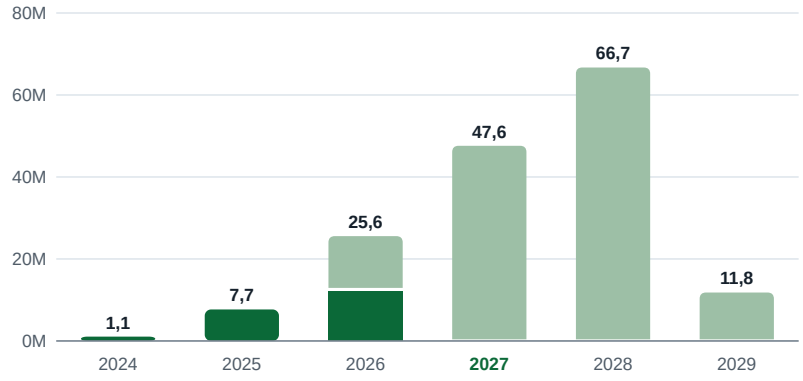


## DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

| Grupo | R$ | % do ano | Avanço financeiro |
|---|---|---|---|
| Indiretos (01 a 11) | R$ 9.868.861,03 | 20,7% | 57,8% |
| Infraestrutura (12 a 16) | R$ 1.296.311,29 | 2,7% | 98,2% |
| Estrutura (17) | R$ 16.405.808,44 | 34,5% | 97,4% |
| Vedações, instalações e elevadores (18 a 24) | R$ 11.338.654,26 | 23,8% | 32,0% |
| Acabamentos (25 a 37) | R$ 8.694.814,82 | 18,3% | 18,9% |
| Taxa de administração | R$ 0,00 | 0,0% | |
| **TOTAL** | **R$ 47.604.449,83** | **100,0%** | |

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

## PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.
