TORRE CATHARINA · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Setembro/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: Prevision · R$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL
R$ 184,0 mi
orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE
R$ 47,5 mi
25,8% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027
R$ 67,8 mi
realizado + previsto

SALDO A REALIZAR
R$ 136,5 mi
após a data de corte

CONFERÊNCIA
✓ Tudo OK
detalhes abaixo


REALIZADO (ATUAL)
Outubro/2026

COMPOSIÇÃO DO ANO


Ano	Anual R$	Acumulado R$	Anual %	Acumulado %	Realizado R$	A realizar R$
2024	R$ 3.987.357,38	R$ 3.987.357,38	2,17%	2,17%	R$ 3.987.357,38	-
2025	R$ 21.526.348,38	R$ 25.513.705,76	11,70%	13,87%	R$ 21.526.348,38	-
2026	R$ 35.943.947,23	R$ 61.457.652,99	19,54%	33,41%	R$ 21.958.774,84	R$ 13.985.172,39
2027	**R$ 67.828.338,72**	**R$ 129.285.991,71**	**36,87%**	**70,28%**	**-**	**R$ 67.828.338,72**
2028	R$ 44.454.848,78	R$ 173.740.840,49	24,17%	94,45%	-	R$ 44.454.848,78
2029	R$ 5.749.382,51	R$ 179.490.223,00	3,13%	97,57%	-	R$ 5.749.382,51
2030	R$ 4.468.025,39	R$ 183.958.248,39	2,43%	100,00%	-	R$ 4.468.025,39
TOTAL	**R$ 183.958.248,39**		**100,00%**		**R$ 47.472.480,60**	**R$ 136.485.767,79**

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

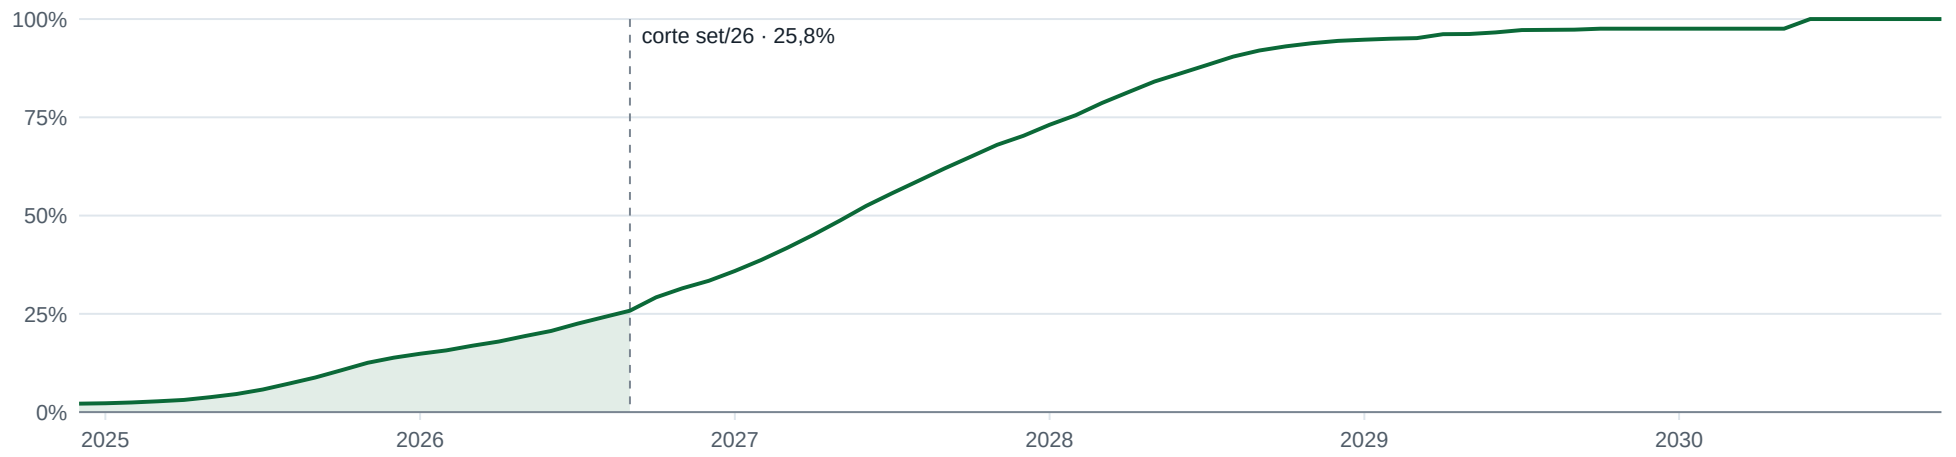

DESEMBOLSO ANUAL (R$ MILHÕES)

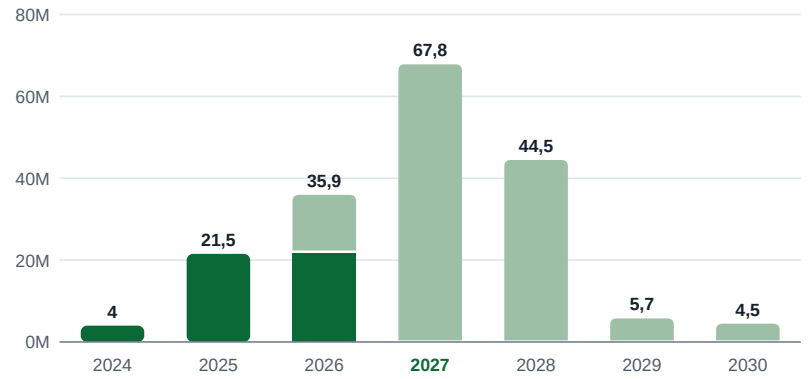

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

Grupo	R$	% do ano	Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)	R$ 8.973.264,12	13,2%	67,0%
Infraestrutura (12 a 16)	R$ 245.422,16	0,4%	99,9%
Estrutura (17)	R$ 6.818.965,87	10,1%	99,2%
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)	R$ 26.743.305,91	39,4%	78,6%
Acabamentos (25 a 37)	R$ 19.817.538,80	29,2%	48,0%
Taxa de administração	R$ 5.229.841,86	7,7%	
TOTAL	**R$ 67.828.338,72**	**100,0%**	

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.
