Ed Jardim · Esquemático de avanço por pavimento

Corte ilustrativo (sem escala): cada célula é o avanço da PL no pavimento, pelas atividades do cronograma do Prevision · passe o mouse numa célula para ver o detalhe

Concluído · Em andamento (50% a 99%) · Em andamento (1% a 49%) · A executar · Sem atividade da PL no pavimento


SITUAÇÃO EM 19/10/2026 (realizado do cronograma)

Pavimentos **29%** Infraestrutura **94%** Fachada **1%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE																					0%
28º LAJE TÉCNICA																					0%
27º DUPLEX SUPERIOR																					0%
26º DUPLEX INFERIOR																					0%
25º TIPO																					0%
24º TIPO																					0%
23º TIPO																					0%
22º TIPO																					0%
21º TIPO																					0%
20º TIPO																					0%
19º TIPO	32																				1%
18º TIPO	100																				4%
17º TIPO	100																				4%
16º TIPO	100																				3%
15º TIPO	100																				5%
14º TIPO	100																				2%
13º TIPO	100	17																			8%
12º TIPO	100	69																			9%
11º TIPO	100	74									40										12%
10º TIPO	100	97		11							63										20%
9º TIPO	100	46						3													9%
8º TIPO	100	36						3													8%
7º TIPO	100	98		12				6			99										18%
6º TIPO	100	98		22				8			32										18%
5º TIPO	100	99	2					10			32										19%
4º APTO GARDEN	99	66						7													45%
3º PILOTIS	100	98	45	35			35				84							26	4		44%
2º GARAGEM	99	100		62	15					96											75%
TÉRREO	100	94		62	36					60	49										64%
Infraestrutura	Contenção, terraplenagem e fundações: 94%																				
% da PL	**90**	**72**	**15**	**23**	**9**	**0**	**7**	**1**	**0**	**12**	**53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**1**		**29%**

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2026


Pavimentos **36%** Infraestrutura **96%** Fachada **28%**

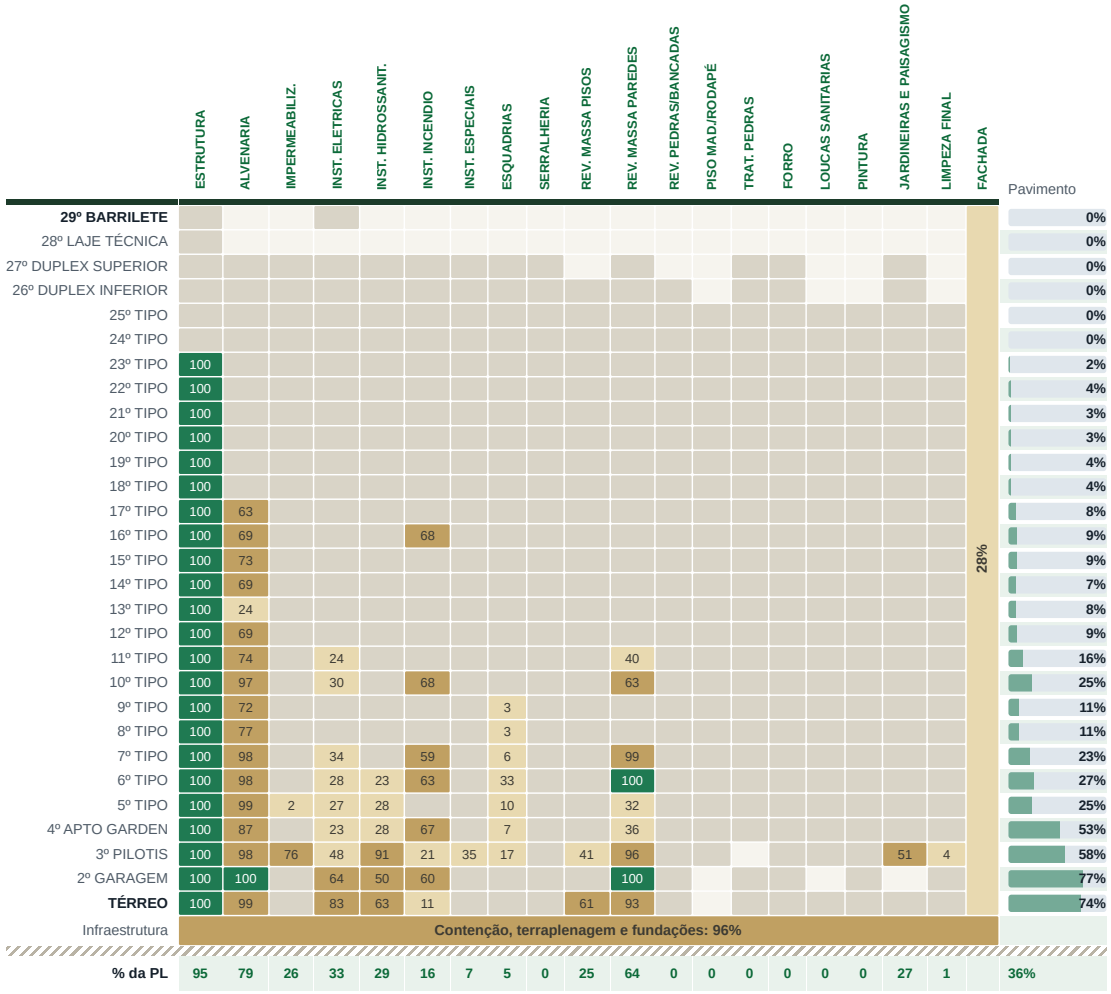

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE																					0%
28º LAJE TÉCNICA																					0%
27º DUPLEX SUPERIOR																					0%
26º DUPLEX INFERIOR																					0%
25º TIPO																					0%
24º TIPO																					0%
23º TIPO	100																				2%
22º TIPO	100																				4%
21º TIPO	100																				3%
20º TIPO	100																				3%
19º TIPO	100																				4%
18º TIPO	100																				4%
17º TIPO	100	63																			8%
16º TIPO	100	69				68															9%
15º TIPO	100	73																			9%
14º TIPO	100	69																			7%
13º TIPO	100	24																			8%
12º TIPO	100	69																			9%
11º TIPO	100	74		24							40										16%
10º TIPO	100	97		30		68					63										25%
9º TIPO	100	72						3													11%
8º TIPO	100	77						3													11%
7º TIPO	100	98		34		59		6			99										23%
6º TIPO	100	98		28	23	63		33			100										27%
5º TIPO	100	99	2	27	28			10			32										25%
4º APTO GARDEN	100	87		23	28	67		7			36										53%
3º PILOTIS	100	98	76	48	91	21	35	17		41	96							51	4		58%
2º GARAGEM	100	100		64	50	60					100										77%
TÉRREO	100	99		83	63	11				61	93										74%
Infraestrutura	Contenção, terraplenagem e fundações: 96%																				
% da PL	**95**	**79**	**26**	**33**	**29**	**16**	**7**	**5**	**0**	**25**	**64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27**	**1**		**36%**

RETRATO: PREVISÃO PARA 31/12/2027

Pavimentos **70%** Infraestrutura **100%** Fachada **89%**

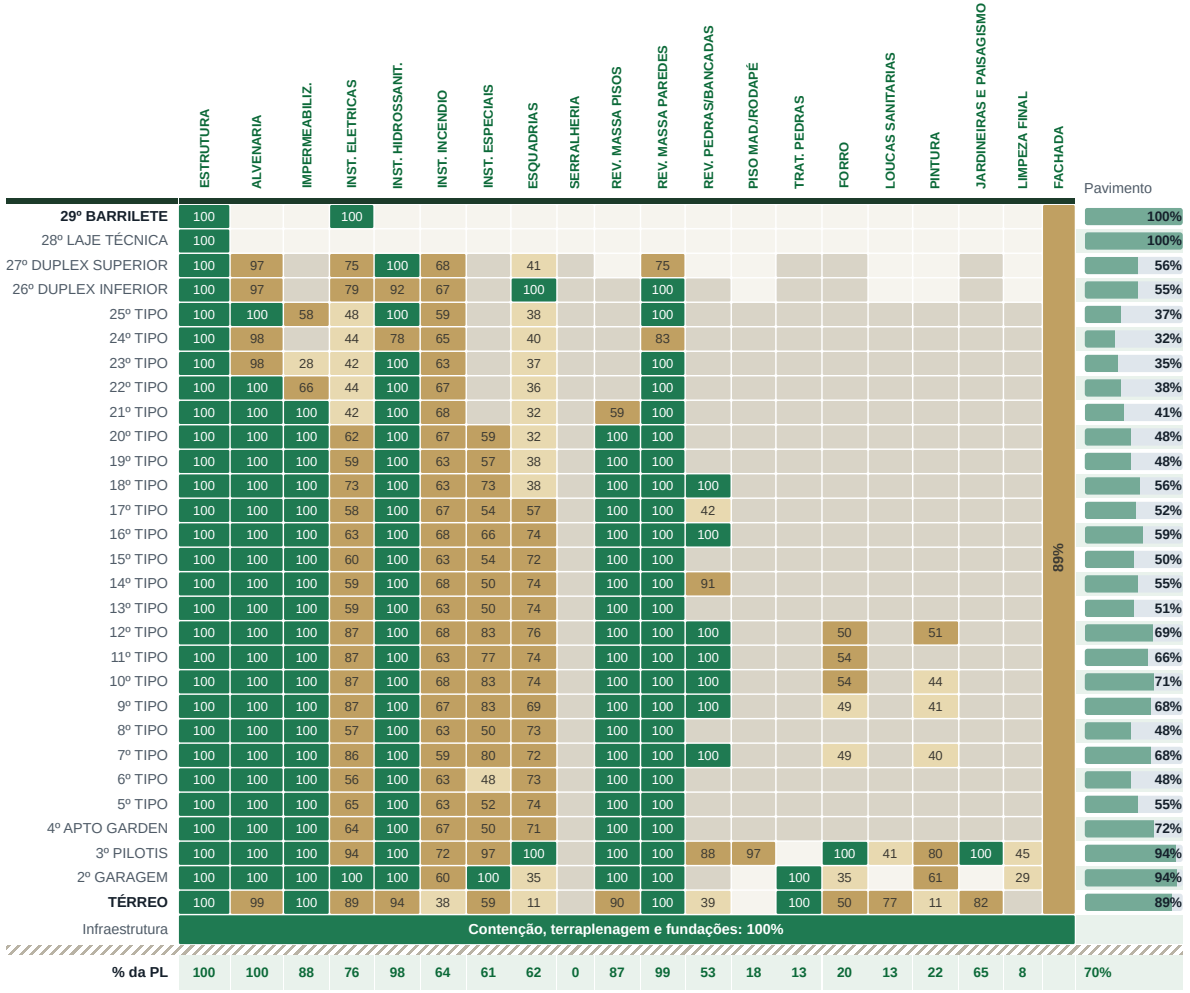

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100																	100%
28º LAJE TÉCNICA	100																				100%
27º DUPLEX SUPERIOR	100	97		75	100	68		41			75										56%
26º DUPLEX INFERIOR	100	97		79	92	67		100			100										55%
25º TIPO	100	100	58	48	100	59		38			100										37%
24º TIPO	100	98		44	78	65		40			83										32%
23º TIPO	100	98	28	42	100	63		37			100										35%
22º TIPO	100	100	66	44	100	67		36			100										38%
21º TIPO	100	100	100	42	100	68		32		59	100										41%
20º TIPO	100	100	100	62	100	67	59	32		100	100										48%
19º TIPO	100	100	100	59	100	63	57	38		100	100										48%
18º TIPO	100	100	100	73	100	63	73	38		100	100	100									56%
17º TIPO	100	100	100	58	100	67	54	57		100	100	42									52%
16º TIPO	100	100	100	63	100	68	66	74		100	100	100									59%
15º TIPO	100	100	100	60	100	63	54	72		100	100										50%
14º TIPO	100	100	100	59	100	68	50	74		100	100	91									55%
13º TIPO	100	100	100	59	100	63	50	74		100	100										51%
12º TIPO	100	100	100	87	100	68	83	76		100	100	100			50		51				69%
11º TIPO	100	100	100	87	100	63	77	74		100	100	100			54						66%
10º TIPO	100	100	100	87	100	68	83	74		100	100	100			54		44				71%
9º TIPO	100	100	100	87	100	67	83	69		100	100	100			49		41				68%
8º TIPO	100	100	100	57	100	63	50	73		100	100										48%
7º TIPO	100	100	100	86	100	59	80	72		100	100	100			49		40				68%
6º TIPO	100	100	100	56	100	63	48	73		100	100										48%
5º TIPO	100	100	100	65	100	63	52	74		100	100										55%
4º APTO GARDEN	100	100	100	64	100	67	50	71		100	100										72%
3º PILOTIS	100	100	100	94	100	72	97	100		100	100	88	97		100	41	80	100	45		94%
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	60	100	35		100	100			100	35		61		29		94%
TÉRREO	100	99	100	89	94	38	59	11		90	100	39		100	50	77	11	82			89%
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 100%**																				
% da PL	**100**	**100**	**88**	**76**	**98**	**64**	**61**	**62**	**0**	**87**	**99**	**53**	**18**	**13**	**20**	**13**	**22**	**65**	**8**		**70%**

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2028

Pavimentos **97%** Infraestrutura **100%** Fachada **100%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	CHECK LIST	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100																	100%	**100%**
28º LAJE TÉCNICA	100																					**100%**
27º DUPLEX SUPERIOR	100	100	100	100	100	68	100	100			100				100			41				**85%**
26º DUPLEX INFERIOR	100	100	100	100	100	67	100	100		100	100	100		32	100			100				**90%**
25º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
24º TIPO	100	100	100	85	100	65	77	100		100	100	100	80		100		43					**78%**
23º TIPO	100	100	100	92	100	63	100	100		100	100	100	100		100		40	100				**83%**
22º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	81			**99%**
21º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	100	52			**95%**
20º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
19º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
18º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
17º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
16º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
15º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
14º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	81			**99%**
13º TIPO	100	100	100	93	100	63	100	100		100	100	100	100	77	100		41	100				**86%**
12º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
11º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
10º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
9º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
8º TIPO	100	100	100	92	100	63	100	100		100	100	100	100	77	100		42	100				**85%**
7º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
6º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	78	100	52			**95%**
5º TIPO	100	100	100	94	100	63	100	100		100	100	100	100	100	100		53	100	50			**90%**
4º APTO GARDEN	100	100	100	93	100	67	100	100		100	100	100	100	100	100		53	100	50			**94%**
3º PILOTIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100		**100%**
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100		100		100			**100%**
TÉRREO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100			**100%**
Infraestrutura	Contenção, terraplenagem e fundações: 100%																					
% da PL	**100**	**100**	**100**	**99**	**100**	**91**	**99**	**100**	**73**	**100**	**100**	**100**	**99**	**84**	**100**	**80**	**86**	**97**	**78**	**68**		**97%**

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2029

Pavimentos **100%** Infraestrutura **100%** Fachada **100%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	CHECK LIST	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100																	100%	**100%**
28º LAJE TÉCNICA	100																					**100%**
27º DUPLEX SUPERIOR	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100			100	100			100				**100%**
26º DUPLEX INFERIOR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100			100				**100%**
25º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
24º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
23º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
22º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
21º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
20º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
19º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
18º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
17º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
16º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
15º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
14º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
13º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
12º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
11º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
10º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
9º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
8º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
7º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
6º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
5º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
4º APTO GARDEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**100%**
3º PILOTIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100		**100%**
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100		100		100			**100%**
TÉRREO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100			**100%**
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 100%**																					
% da PL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**100%**

Pavimentos: nº na coluna N da aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (lote do Prevision). PLs com atividades em pelo menos 3 pavimentos; infraestrutura = contenção, terraplenagem, fundação profunda, fundação superficial; fachada = revestimento diversos fachada (lotes sem pavimento). Previsão: o saldo de cada tarefa segue linear da data da situação (ou do início planejado) até o término planejado. Esquema ilustrativo, sem escala, não substitui o levantamento em campo.
