
# Ed. Jardim


Fachada · pavimentos 4º ao 28º · elevação por período de execução

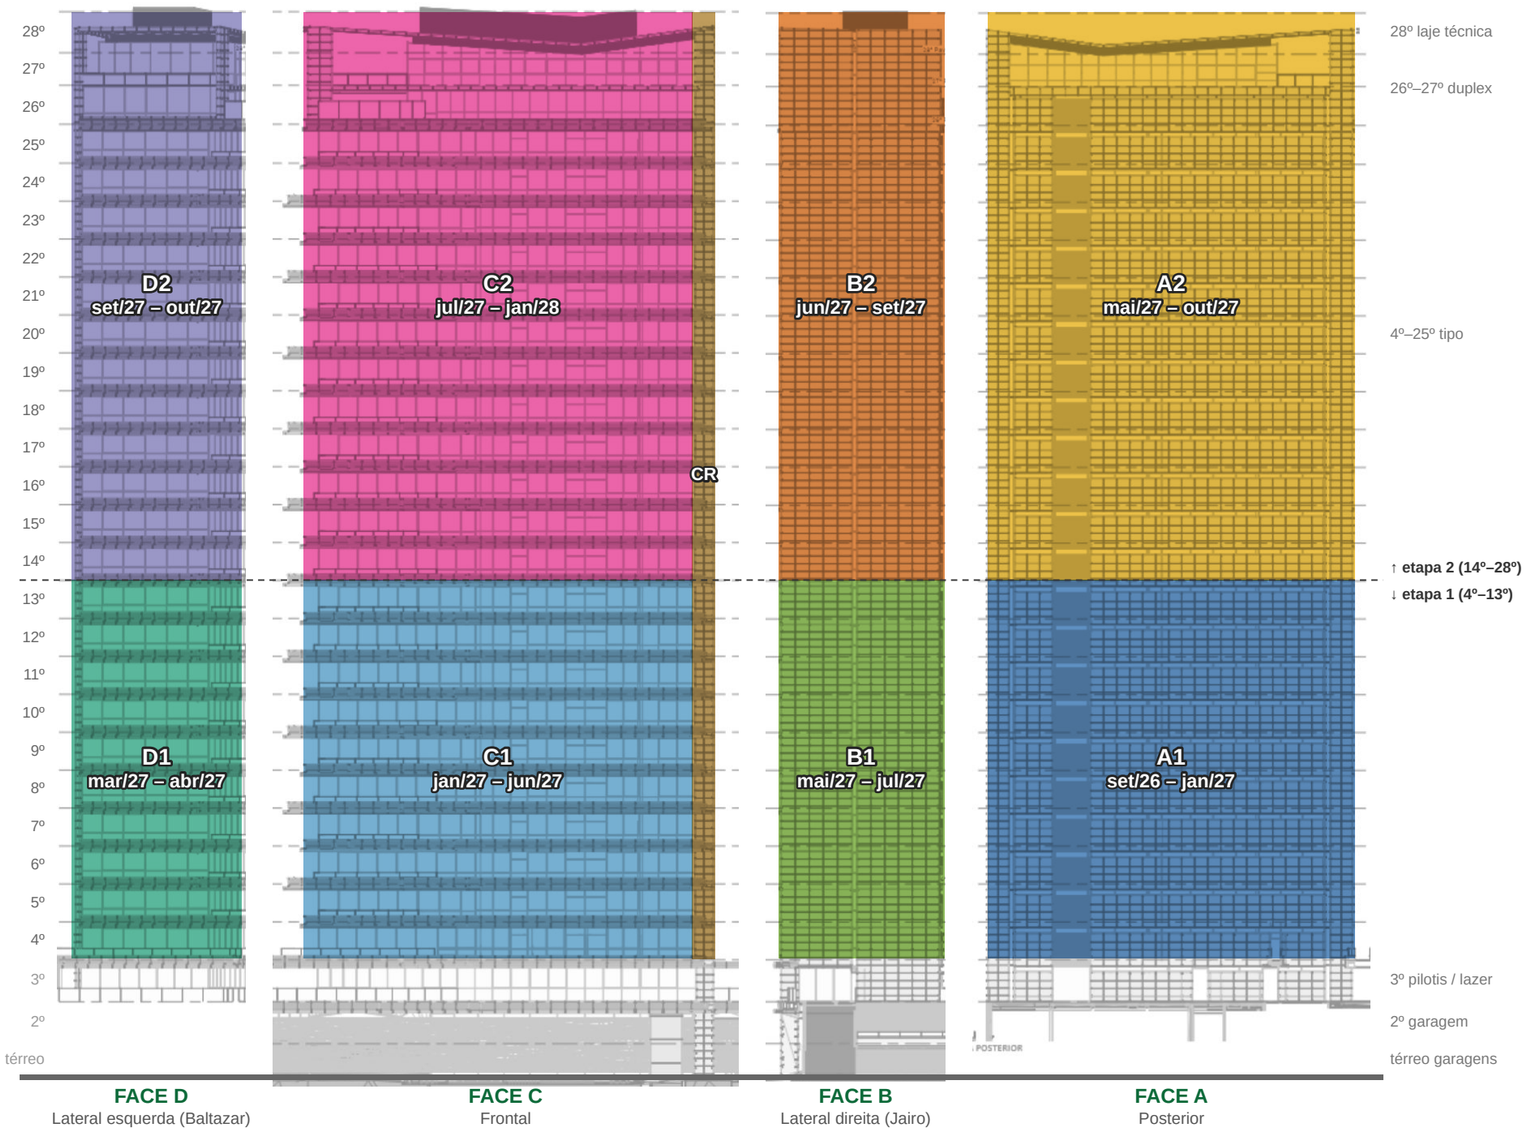


Embasamento (até o 3º pavimento) fora deste cronograma; limpeza final em todas as faces

**PLANTA BAIXA · PAVIMENTO TIPO**

contorno do Estudo de Fachada (R12) · sem escala

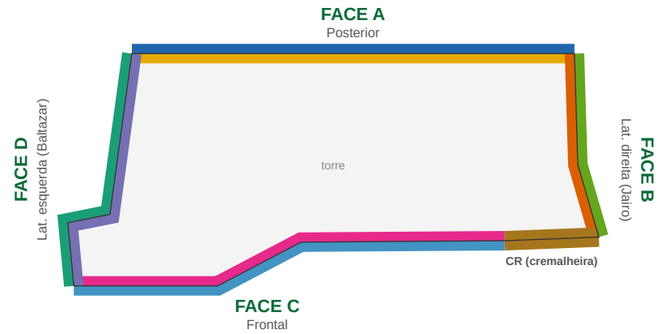


faixa externa = etapa 1 (4º ao 13º)
faixa interna = etapa 2 (14º ao 28º)

Elevação: faces na ordem D → C → B → A, contornando a torre a partir da lateral esquerda.

## PERÍODOS DE EXECUÇÃO

**24/09/26 → 06/01/27**
Face A · Posterior · 4º ao 13º · 5% realizado

**14/01/27 → 02/06/27**
Face C · Frontal · 4º ao 13º

**18/03/27 → 22/04/27**
Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 4º ao 13º

**07/05/27 → 05/07/27**
Face B · Lateral direita (Jairo) · 4º ao 13º

**24/05/27 → 08/10/27**
Face A · Posterior · 14º ao 28º

**11/06/27 → 09/09/27**
Face B · Lateral direita (Jairo) · 14º ao 28º

**23/07/27 → 06/01/28**
Face C · Frontal · 14º ao 28º

**17/09/27 → 07/10/27**
Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 14º ao 28º

**20/10/27 → 17/03/28**
Cremalheira (faixa da fachada frontal, 4º ao 28º)

**20/03/28 → 23/05/28**
Limpeza da fachada (todas as faces)

Datas de cada face e etapa na folha 2.

# Ed. Jardim

Fachada · pavimentos 4º ao 28º · datas de execução por trecho e linha do tempo

## DATAS DE EXECUÇÃO

**24/09/26 → 06/01/27**
Face A · Posterior · 4º ao 13º · 5% realizado
Posterior · 4º ao 13º — 24/09/26 a 06/01/27

**14/01/27 → 02/06/27**
Face C · Frontal · 4º ao 13º
Frontal · 4º ao 13º — 14/01/27 a 02/06/27

**18/03/27 → 22/04/27**
Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 4º ao 13º
Lateral esquerda (Baltazar) · 4º ao 13º — 18/03/27 a 22/04/27

**07/05/27 → 05/07/27**
Face B · Lateral direita (Jairo) · 4º ao 13º
Lateral direita (Jairo) · 4º ao 13º — 07/05/27 a 05/07/27

**24/05/27 → 08/10/27**
Face A · Posterior · 14º ao 28º
Posterior · 14º ao 28º — 24/05/27 a 08/10/27

**11/06/27 → 09/09/27**
Face B · Lateral direita (Jairo) · 14º ao 28º
Lateral direita (Jairo) · 14º ao 28º — 11/06/27 a 09/09/27


**23/07/27 → 06/01/28**
Face C · Frontal · 14º ao 28º
Frontal · 14º ao 28º — 23/07/27 a 06/01/28

**17/09/27 → 07/10/27**
Face D · Lateral esquerda (Baltazar) · 14º ao 28º
Lateral esquerda (Baltazar) · 14º ao 28º — 17/09/27 a 07/10/27

**20/10/27 → 17/03/28**
Cremalheira (faixa da fachada frontal, 4º ao 28º)
Faixa da cremalheira — 20/10/27 a 17/03/28

**20/03/28 → 23/05/28**
Limpeza da fachada (todas as faces)
Limpeza final — 20/03/28 a 23/05/28

## LINHA DO TEMPO (SEMANAS)

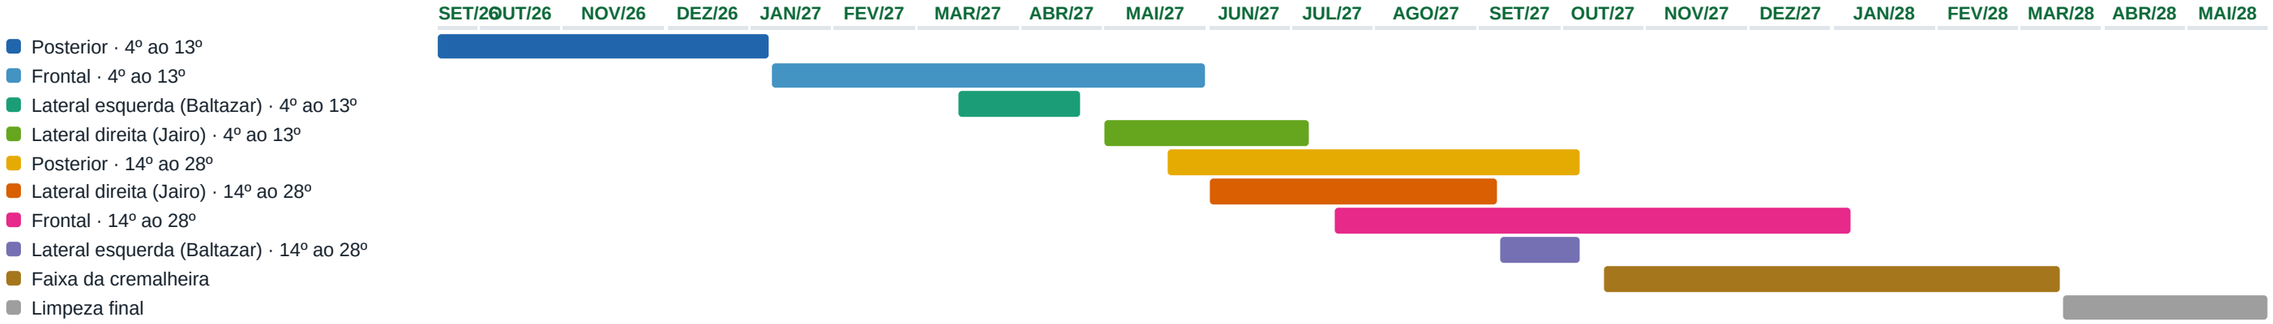


Datas pelo cronograma de atividades do Prevision (lote FACHADA, cenário Prevision Atual de 19/10/2026): cada face em duas etapas (4º ao 13º e 14º ao 28º) e a faixa da cremalheira, uma cor por face e etapa. Desenho: elevações do projeto (imagens do Estudo de fachada R12), na ordem D, C, B, A. Planta baixa: contorno do pavimento tipo da Planta de distribuição do Estudo de Fachada (R12); a cremalheira fica no trecho direito da frontal (balancim 20 do estudo).
