

TORRE CATHARINA · FLUXO DE CAIXA DA OBRA

Data de corte: Setembro/2026 · Ano do retrato: 2027 · Cenário: Prevision · R\$ nominais, com taxa de adm.

PROJEÇÃO TOTAL

R\$ 184,0 mi

orçamento projetado (IEC)

REALIZADO ATÉ O CORTE

R\$ 47,5 mi

25,8% da projeção

DESEMBOLSO EM 2027

R\$ 67,9 mi

realizado + previsto

SALDO A REALIZAR

R\$ 136,5 mi

após a data de corte

CONFERÊNCIA


✓ Tudo OK

detalhes abaixo


REALIZADO (ATUAL) Outubro/2026					COMPOSIÇÃO DO ANO	
Ano	Anual R\$	Acumulado R\$	Anual %	Acumulado %	Realizado R\$	A realizar R\$
2024	R\$ 3.987.357,38	R\$ 3.987.357,38	2,17%	2,17%	R\$ 3.987.357,38	-
2025	R\$ 21.526.348,38	R\$ 25.513.705,76	11,70%	13,87%	R\$ 21.526.348,38	-
2026	R\$ 35.932.183,57	R\$ 61.445.889,33	19,53%	33,40%	R\$ 21.958.774,84	R\$ 13.973.408,73
2027	R\$ 67.911.806,78	R\$ 129.357.696,11	36,92%	70,32%	-	R\$ 67.911.806,78
2028	R\$ 44.336.428,38	R\$ 173.694.124,49	24,10%	94,42%	-	R\$ 44.336.428,38
2029	R\$ 5.591.754,01	R\$ 179.285.878,50	3,04%	97,46%	-	R\$ 5.591.754,01
2030	R\$ 4.672.369,89	R\$ 183.958.248,39	2,54%	100,00%	-	R\$ 4.672.369,89
TOTAL	R\$ 183.958.248,39		100,00%		R\$ 47.472.480,60	R\$ 136.485.767,79

Linha destacada = ano do retrato. Realizado = até a data de corte; a realizar = previsto depois dela.

CURVA S — % ACUMULADO DA PROJEÇÃO

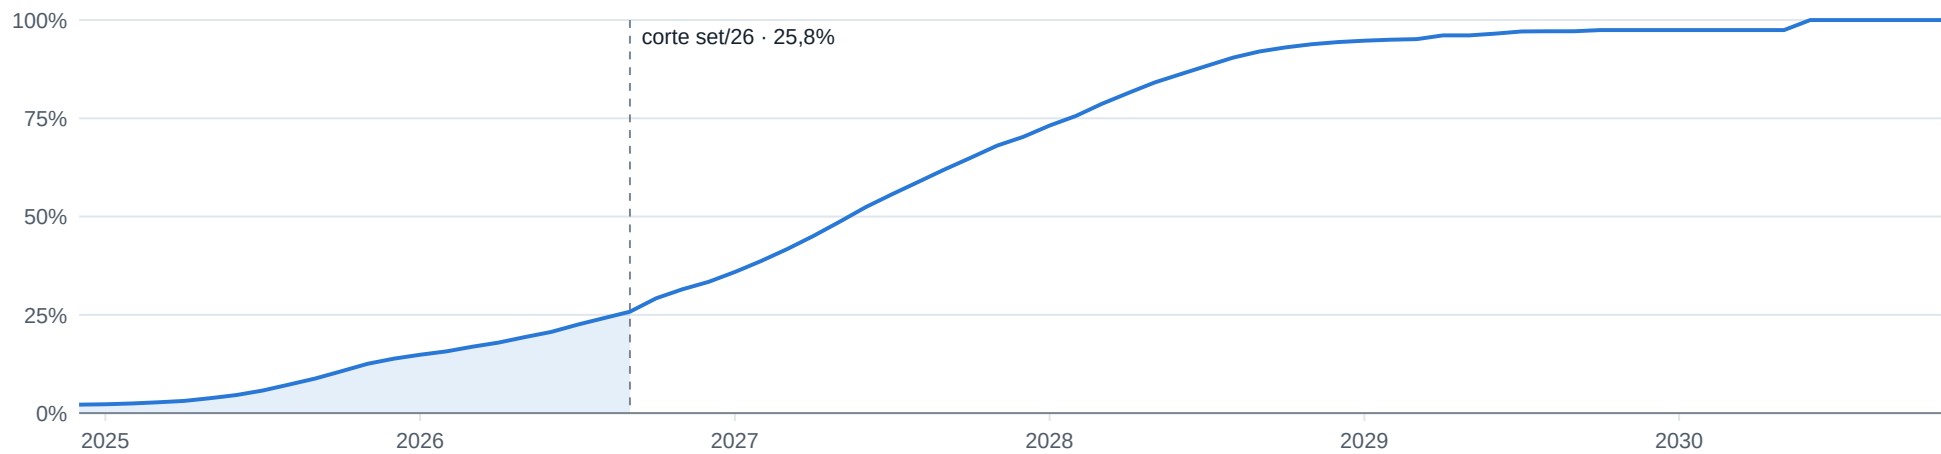

DESEMBOLSO ANUAL (R\$ MILHÕES)

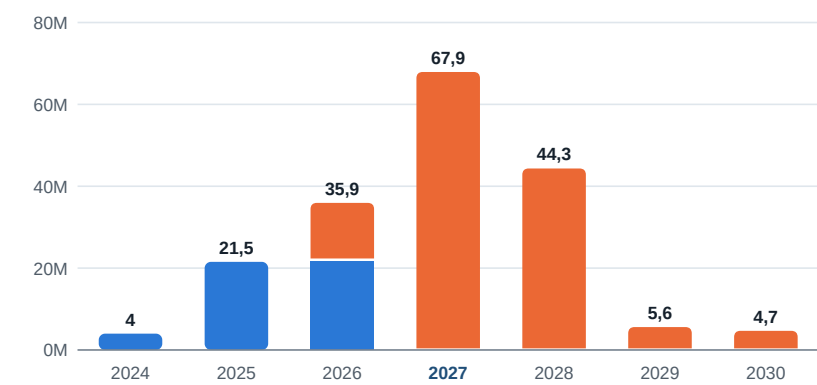

DESEMBOLSO EM 2027 POR GRUPO

Grupo	R\$	% do ano	Avanço financeiro
Indiretos (01 a 11)	R\$ 8.577.555,24	12,6%	67,6%
Infraestrutura (12 a 16)	R\$ 386.027,75	0,6%	99,9%
Estrutura (17)	R\$ 6.818.896,50	10,0%	99,2%
Vedações, instalações e elevadores (18 a 24)	R\$ 26.854.305,01	39,5%	78,6%
Acabamentos (25 a 37)	R\$ 19.854.411,18	29,2%	48,0%
Taxa de administração	R\$ 5.420.611,10	8,0%	
TOTAL	R\$ 67.911.806,78	100,0%	

Avanço financeiro = acumulado até dezembro do ano ÷ projeção.

PENDÊNCIAS DA CONFERÊNCIA

Nenhuma pendência.

Resolva na aba indicada (coluna H) ou em VALOR POR PL. Depois, gere a visualização novamente.
